2025 베트남 온라인 수출플랫폼 모델 전수 ODA 사업

정성적 제안서

KOSME 중소벤처기업진흥공단 QuinTet ASTRA TECHNOLOGY CO.,LTD

조견표

항목	세부항목	평가요소	평가					계량/비계량	쪽수
			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡		
경영상태 (10점)	경영상태 (10)	- 신용평가기관에 의한 신용도 〈별표1〉 참조	〈별표 1〉 참조					정량	19
기업역량 (10점)	기업현황 (10)	- 본 사업을 추진하기 위한 조직체계 및 전담수행인력 현황	10	9	8	7	6	정성	17~27
사업 수행계획 (20점)	사업 이해도 (10)	- ODA 사업용역 요구사항에 대한 이해도 - 제안요청서와의 일치성	10	9	8	7	6	정성	4~16 78~83
	사업 수행 일정계획 (10)	- 종합 추진일정의 합리성 - 단계별 자원 배분의 합리성	10	9	8	7	6	정성	72~76 77~91
사업 수행경력 (15점)	사업 수행경력 (15점)	- ODA 구축사업 수행경력 - ODA 교육, 세미나 수행 이력	15	13.5	12	10.5	9	정성	13 71
기술· 지식능력 (25점)	ODA관리 (PMC) 및 수행(PC)능력 (15)	- 추진 계획의 적절성 - 구축/운영 및 관리 방안의 적정성 - 목표 달성방법의 효과성, 적정성	15	13.5	12	10.5	9	정성	28~70 72 78~90
	ODA 교육 등 행사 수행능력(10)	- ODA 분야 교육 및 세미나 등 수행 및 관리 방법의 적정성	10	9	8	7	6	정성	71
사후관리 (10점)	사후관리(10)	- 만족도 조사 등 성과 보고 및 결과보고의 적정성	10	9	8	7	6	정성	62,68 86~90
인적역량 (10점)	핵심인력의 사업추진 역량	- PM(또는 핵심투입인력) 동 용역을 성공적으로 수행할 수 있도록 해당 분야 전문성·사업추진 역량	10	9	8	7	6	정성	21~27

Contents

Ⅰ. 제안개요

가. 사업의 이해 ····· 04
나. 추진전략 ····· 13

Ⅱ. 제안업체 일반

가. 제안사 현황 ····· 17
나. 조직 및 인원 ····· 20

Ⅲ. 제안내용

가. 베트남 이마켓플레이스 구축 ····· 28
나. 수출플랫폼 안정화 및 활성화 ····· 50
다. 역량강화 ····· 59

Ⅳ. 사업관리 부문

가. 일반 사업관리 ····· 72
나. 보고 및 검토 계획 ····· 89

Ⅴ. 기타

가. 협업방안 ····· 91

가. 사업의 이해

1 사업의 배경 및 목적

1) 사업 배경

(1) 디지털 경제 확대 및 베트남의 공공 온라인수출플랫폼 수요 증가

i) 베트남 정부는 2020년 「국가 디지털 전환 프로그램(Decision 749/QD-TTg)」과 2021년 「전자상거래 발전 마스터플랜(2021~2025)(Decision 645/QD-TTg)」을 발표하고, 디지털 경제를 GDP의 20%까지 확대하고, 전자상거래를 통한 국내외 수출 확대를 핵심 목표로 설정함.

ii) 이에 따라 베트남 산업무역부는 국가디지털전환위원회의 일원으로서 전자상거래 촉진 정책을 수립하고 있으며, 특히 전자상거래 플랫폼을 통한 중소기업 수출지원 및 법·제도 정비를 추진 중임.

정부 및 관련 기관	담당과제	협업과제	역할
(베) 산업무역부	전자상거래 촉진, 플랫폼 육성, 국제협력 담당	전자계약 및 거래규정 정비 협업	전자상거래 정책 총괄
(베) 정보통신부	디지털 인프라 구축, 보안 정책	전자상거래 시스템 연계 지원	디지털 생태계 기반 마련
(베) 기획투자부	국제협력 및 ODA 조율	중소기업 디지털 전환 투자 유치	대외 협력 및 예산 확보
(베) 세무총국	전자상거래 세금 징수 및 과세체계 정비	세무보고 의무화 연계	온라인 거래 과세 추진
(베) 중앙은행	디지털 결제 및 통화정책 대응	외화 결제 관리체계 정비	결제 인프라 법제화
(베) 전자상거래협회, 산업협회 등	기업 교육, 플랫폼 연계 지원	국내외 플랫폼 협력 주관	중소기업 지원

iii) 베트남 전자상거래를 통한 수출은 대부분 대기업 및 외자기업 중심으로 운영되고 있으며, 중소기업은 기술 역량 및 유통 인프라 부족으로 진출에 한계가 있음.

iv) 글로벌 플랫폼과의 협업으로 한시적인 온라인 수출지원이 이루어지고 있으나, 베트남 중소기업을 위한 전략적 공공 온라인 수출플랫폼 필요

(2) 국제개발협력(ODA) 및 디지털 경제 분야 연계

i) (국익연계) 한국 정부는 디지털 전환, 공급망 협력, 스타트업 연계 등을 중심으로 한-베트남 ODA를 강화하고 있으며, 온라인 수출플랫폼 구축은 국익 기반 경제외교의 일환임.

ii) (상생성장) 중소기업의 해외진출 기반 구축을 통해 수원국과 공여국의 공동 번영을 도모하고, 일자리 창출, 수출경로 다변화 등 다층적 파급효과를 기대함.

iii) (한국형 콘텐츠) 원조를 받은 경험과 한강의 기적으로 불리는 경제 성장 성과 등을 토대로 선진국과 차별화된 한국형 콘텐츠 개발·지원

(3) 정상회담 및 국정과제 연계

i) 2023년 및 2024년 한-베트남 정상회담을 통해 양국은 '포괄적 전략적 동반자 관계'로 격상, 디지털 분야 협력을 주요 의제로 설정

· 한국의 EDCF 40억 불 제공 및 디지털 통상분야 ODA 확대 협의

· 정상회담에서 논의된 디지털 전환, 스타트업 협력, 공급망 안정화 등의 분야에서 실질적 협력을 추진할 수 있는 프로젝트 개발 필요성 대두

ii) 국정과제 및 신남방정책과의 연계성

· 당 사업은 국정과제 40(중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축), 99(국익을 증진하는 경제외교 및 개발 협력 강화), 100(보호무역주의 대응 및 전략적 경제 협력 강화)에 해당

· 베트남은 신남방정책의 핵심 파트너로서 신남방정책 비전인 상생번영(Prosperity) 공동체의 실행과제 "⑨ 중소기업 등 시장진출 지원, ⑪ 국가별 맞춤형 협력모델 개발"과 직접 연계

iii) 베트남의 전략적 중요성

· 베트남은 ASEAN, RCEP 등의 다자간 통상협상 당사국으로, 선진국으로의 우회 수출과 아시아 진출의 전진기지로서 글로벌 생산·수출 거점으로 활용도가 높음.

· 한-베트남 양국 간 교역 규모가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 전자상거래 분야에서의 협력 잠재력이 큼.

iv) 기술 이전 및 역량 강화

· 한국의 선진 온라인 수출플랫폼 모델을 베트남에 전수함으로써, 베트남의 디지털 경제 발전에 이바지하고 양국 간 기술 협력을 강화할 수 있음.

· 베트남 정부 관계자와 중소기업을 대상으로 한 역량 강화 프로그램을 통해, 장기적인 경제 협력 기반을 마련할 수 있음.

v) 이러한 배경을 바탕으로, 본 사업은 한-베트남 간 경제 협력을 강화하고, 베트남의 디지털 경제 발전을 지원하며, 양국 중소기업의 글로벌 시장 진출을 촉진하는 것을 목적 설정. 또한, 이를 통해 한국의 ODA 정책 방향에 부합하는 성과를 창출하고, 양국의 상생 발전에 이바지하고자 함.

2) 사업목적

(1) "베트남 대상 온라인 수출플랫폼 모델 전수사업(`23-`25)"계획에 따라 베트남 온라인 수출플랫폼 구축과 필요 기자재를 공급·구성하고 수원기관 공무원 및 중소기업 디지털 수출 역량을 강화하고자 함.

(2) GobizKOREA 플랫폼 운영 경험을 베트남에 전수하여, 베트남 중소기업의 수출기업화 및 디지털 전환을 실현함.

(3) 한국 중소기업의 베트남 온라인 전자상거래 시장진출을 위한 신규 채널을 구축하고, 향후 양국 플랫폼 간 상호 연계 협력을 통한 글로벌 진출 기반을 마련하고자 함.

2 수원국 현황

1) 베트남 전자상거래 관련 법제 현황

(1) 전자상거래 제도 정비 및 법률 제정 추진

i) 베트남 정부는 디지털 경제 성장을 위해 2025년까지 전자상거래 플랫폼에 대한 법제화를 추진 중이며, 최초의 '전자상거래 기본법' 제정이 진행 중임

ii) 법안 초안에는 온라인 판매자 신원 인증, 플랫폼의 거래 감시 및 위법 대응 의무, 소비자 보호 관련 의무 조항이 포함되어 있음

iii) '사이버 공간 정보관리령(Decree 147/2023/ND-CP)'은 SNS 기반 전자상거래(라이브커머스 등)에 대한 실명제 및 거래제한 규정을 포함하며, 외국 플랫폼에도 적용됨

(2) 전자상거래 투자사업 요건 완화

i) 산업무역부가 시행령 개정 시행령(Decree 08/2018/ND-CP, 2020.01.15)에 따라

전자상거래 사업 요건 일부 변경

(철폐) 상품 판매를 위한 전자상거래 웹사이트 및 전자상거래 서비스 제공 웹사이트 구축 요건 (완화) 전자상거래 웹사이트의 신뢰도 평가, 개인정보보호 정책 평가, 전자계약 인증 사업 등 전자상거래 관련 사업 요건

(3) 전자상거래 세제 강화

i) 2024년부터 디지털 플랫폼은 판매자에 대한 부가세 및 소득세 원천징수 의무를 부여받음

ii) 모든 거래는 전자세금계산서를 발행하고, 연말에는 플랫폼이 판매자별 납세 명세를 국세청에 보고해야 함

2) 베트남 전자상거래

(1) 베트남 전자상거래 현황

i) Google, Temasek, Bain & Company의 2024년 보고서에 따르면, 베트남 전자상거래 시장은 2023년 약 250억 달러에서 2024년 300억 달러로 성장함

〈아세안 국가들의 전자상거래 성장률〉

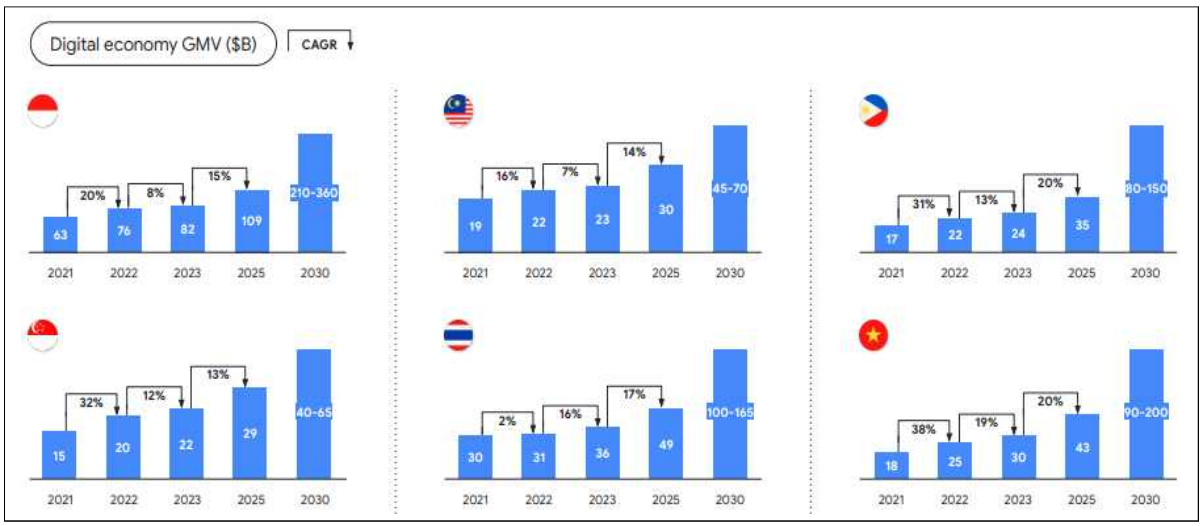

ii) 연평균 성장률(CAGR)은 약 20% 수준이며, 2030년까지 최대 630억 달러 규모에 이를 것으로 예상됨

iii) 디지털 경제의 GDP 비중은 2023년 12% 수준으로, 베트남은 ASEAN 상위권을 유지하고 있음

iv) 전체 소매 판매 중 전자상거래 비중은 약 10%로 지속 확대 중이며, 국민의 60% 이상이 온라인 구매에 참여

(2) 베트남 기업의 전자상거래 사용 수단 변화

i) 베트남 전자상거래협회(VECOM)의 조사에 따르면 베트남 기업은 기존 이메일·웹사이트 중심의 수주 방식에서 SNS, 라이브커머스, 전자상거래 플랫폼 중심으로 이동

ii) 2023년 TikTok Shop의 시장 점유율은 약 24%로 급성장하였으며, Shopee, Lazada, Tiki 등과 함께 플랫폼 주도 시장구조를 형성

iii) 특히 동영상 기반 쇼핑, 인플루언서 마케팅이 주된 유통 방식으로 자리 잡으며, 크로스보더 전자상거래도 함께 활성화되고 있음

〈베트남 온라인 수출기업의 판매 수단 변화〉

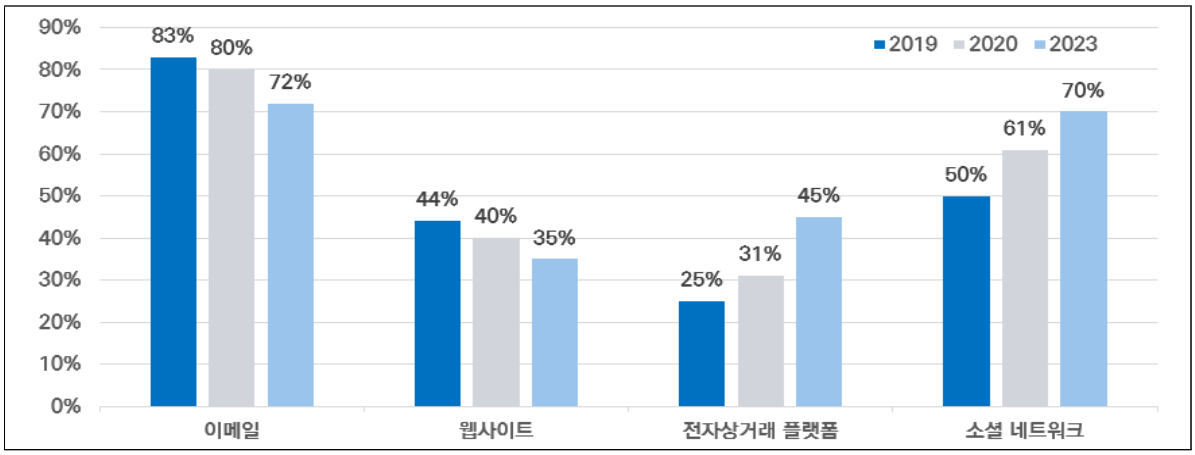

3 제안의 범위

1) 공공 이마켓플레이스 구축(2단계)

온라인 상품 등록부터 수출 결제, 물류, 통관, 정산까지의 수출 프로세스 전체를 베트남 기업이 디지털 방식으로 수행할 수 있도록, 기존 플랫폼을 고도화하여 실거래 중심의 실용적 기능을 구현

(1) 외화 결제 및 정산 기능 고도화

i) 결제자료 관리

· 결제 상태(대기/완료/취소)에 따라 결제 내역 등록 및 이력 관리

· 인보이스 등 증빙 자료 연동 및 서식 기반 문서 관리

ii) 외화 결제수단 연동

· T/T, PayPal, 신용카드(Napas 등) 연동 기능 구현

· 실패/취소 시 상태 값 변경 및 이력 추적 기능

iii) 외화 보고서 자동 생성

· 보고 항목별 정리(결제수단, 금액, 거래일 등) 및 PDF, CSV 형식의 보고서 출력

(2) 국제 물류 및 수출통관 연계

i) 글로벌 물류 연동(DHL 등)

· 운임 조회, 송장 등록, 배송 추적 등의 API 연동

ii) 수출입 신고 정보 관리

· 제조사/판매사 신고정보 등록 및 자동화 처리

· 디지털 신고문서 통합 관리 및 통관 연계 데이터 생성

(3) 데이터 개방형 연계 API 구축

i) OPEN API 제공

· 판매/주문/쇼핑몰 자료에 대한 등록, 수정, 삭제 API 제공

· 외부 플랫폼 연동을 위한 API 문서 제공 및 인증 체계 구현

ii) 통계 API 제공

· 상품별/셀러별/쇼핑몰별 통계 조회 기능

· 조건별 필터 및 시각화 기능 포함

(4) 관리자용 통계 및 상담 이력 관리

i) 관리자 상담 이력

· 셀러/바이어 상담 내용 기록 및 통합 관리 기능 제공

· 이력별 등록/수정/삭제 기능

ii) 관리자 전용 통계

· 회원, 인콰이어리, 바잉오퍼 등 기간/지역/품목별 통계

· Excel/CSV 추출 기능 포함

2) 바이어-셀러 매칭 시스템

인바운드 및 아웃바운드 수요를 기반으로 플랫폼이 셀러와 바이어 간 수출 매칭을 수행하는 시스템으로, 수요관리, 마케팅, 상담, 사후관리 등 전 주기를 통합 지원

(1) 인바운드 매칭 관리

i) 수요 등록 및 분류

· 이메일/전시회 등 외부 수요 수동 등록 및 분류

· 접수/검토/매칭 완료 상태 기반 워크플로우 구성

ii) 셀러 매칭

· 제품 조건 기반 셀러 추천 및 매칭 메일 발송

· 열람 및 회신 이력 자동 기록

iii) 사후관리

· 거래 미성사 사유 등록 및 통계 수집 기능 포함

(2) 아웃바운드 마케팅 및 사후관리

i) 마케팅 대상 관리

· 셀러별 제품, 상담 이력 기반 마케팅 대상 추출

· 바이어 그룹, 등급 분류 기능

ii) 마케팅 발송 및 회신

· Circular Letter 작성/발송 및 회신 여부 확인 기능

· 재발송, 피드백 분석 및 매칭 연결

3) 캠페인 및 DB 관리

i) 캠페인 그룹 구성 및 운영 이력 조회

ii) 바이어/셀러 정보 등록, 수정, 분류 관리

(4) 매칭 현황 및 통계관리

i) 인바운드/아웃바운드 서비스별 실적 및 성사율 시각화

ii) 담당자별/국가별/산업군별 매칭 추이 확인

(5) 사용자 권한 및 시스템 설정

i) 기능별 메뉴 접근 제어, 사용자 업무 위임 기능 포함

ii) 공통코드, 카테고리, 게시판, 메모 등 부가기능 운영

3) 온라인 전시 시스템

전시 콘텐츠 등록, 영상 기반 온라인 전시, 커뮤니케이션 및 상담, 오프라인 전시 연계 등 다양한 형태의 전시 환경을 통합 관리할 수 있도록 구현

(1) 온라인 전시관 등록 및 기본 관리
i) 전시관 기본정보 등록/수정, 전시 상태 설정
ii) 전시 기간 설정 및 자동 전시 시작/종료 기능 제공
iii) 전시관별 배너 및 롤링 배너 구성

(2) 콘텐츠 기반 전시 제품 관리
i) 가상 전시관의 카테고리별 전시 제품 분류
ii) 오프라인 전시회 기반 제품 등록 및 연계 기능 포함

(3) Special 온라인 전시관 관리
i) 북마크 기반 영상 콘텐츠에 참여기업 정보 연결
ii) 실물 전시 미참여 기업의 대체 홍보 채널로 활용

(4) 영상 콘텐츠 및 트랜스코딩 관리
i) 영상 메타정보 자동 추출, 트랜스코딩 상태 모니터링
ii) 미노출 콘텐츠 관리, 저장소 효율화

(5) 커뮤니케이션 및 미팅 지원
i) 메시지 송수신, 화상 미팅 신청 및 일정 조율
ii) 상담 이력 기록 및 알림 연계 기능 제공

(6) 게시판 및 즐겨찾기 기능
i) 게시판 등록/수정/삭제, 첨부파일 기능
ii) 바이어 즐겨찾기 제품 목록 확인 및 타겟 마케팅 연계

(7) 오프라인 전시회 및 세미나 연계
i) 참가 신청, 행사정보 제공, 지원 정보(비자, 호텔 등) 관리
ii) 세미나 신청, 영상 콘텐츠, 평가 및 자료 공유 기능

4) 베트남 온라인 수출플랫폼 안정화 및 활성화

운영 및 매칭 전담조직의 체계적 운영을 통해 플랫폼의 마케팅, 콘텐츠 품질, 사용자지원 등을 강화하고, 기술적 기반을 책임지는 IT센터 조직을 함께 구축함으로써, 베트남 온라인 수출플랫폼의 지속 가능한 안정성과 활용도를 동시에 제고

(1) 베트남 온라인 수출플랫폼 운영센터 운영
i) 운영팀 구성 및 역할
· 운영팀은 5인(운영팀장, 개발자, 기획자, 디자이너, 사이트 운영 및 CS)으로 구성
· 기술 운영, 사용자지원, 기능 개선, 콘텐츠 기획 및 관리, 디지털 마케팅 업무를 수행
· KPI 기반 성과 점검, 운영 리스크 대응, 사용자 문의 응대 및 기능 개선 연계 등 포함
ii) 매칭팀 구성 및 역할
· 매칭팀은 3인(팀장 포함)으로 구성되어 셀러-바이어 간 매칭 및 사후관리를 담당
· 인바운드/아웃바운드 수요 분석, 매칭 이력관리, 맞춤형 제안 등 거래 전환을 위한 전담

지원 수행

iii) 현지 운영 기반 구축 및 운영체계

· 베트남 현지 사무실 임차 및 인프라 확보(PC, 통신, 복합기, 사무용품 등)
· 수원기관 추천 인력 2인을 운영팀에 포함, 수원기관과 공동운영 체계 구축
· 매칭팀은 사업 착수 후 수원기관이 추천한 인력 포함 구성
· 월 단위 운영실적 보고 및 운영 교육, 운영 매뉴얼 공유 등 추진

(2) 베트남 온라인 수출플랫폼 활성화

i) 온라인 마케팅 및 홍보 전략

· 영상 및 브로셔 제작: 플랫폼 소개, 활용법 안내, 성공사례 기반 메인 영상 및 숏폼 콘텐츠 제작
· Google Ads 및 SNS 광고(CPC/CPV, 페이스북, 유튜브 등) 운영
· 산업군별 타겟 키워드 기반 광고 전략 수립 및 성과 분석
· 베트남 내 수출 유망기업 및 바이어 대상 타겟 마케팅 실행

ii) 제품 등록 대행 및 상세 콘텐츠 작성 지원

· 플랫폼 내 제품 등록을 어려워하는 중소기업 대상 등록 대행 서비스 제공(월 80건 이상)
· 이미지 편집, 다국어 콘텐츠 작성(영-베), 제품 사양 입력, 카테고리 최적화 등 포함
· 상품정보 표준화 및 SEO 기반 콘텐츠 강화로 바이어 접근성과 거래 전환율 향상

(3) IT센터 운영 및 시스템 안정화

i) 기술팀 구성 및 운영

· 팀장 포함 5인(기술팀장, 아키텍트, 네트워크/보안 담당 등)으로 구성
· 시스템아키텍처 설계, 프레임워크 표준화, 장애 대응, CI/CD 구축 등 수행
· 베트남 현지 개발환경을 고려한 인프라 최적화 및 보안 설계 수행

ii) 보안팀 운영 및 데이터 보호

· 팀장 포함 3인 구성
· 보안사고 대응, 침입 탐지, 개인정보 접근 제어, 보안 교육 등 수행
· 베트남 현지 법규 및 사이버보안법 준수 체계 마련

5) 지방순회세미나 확대 운영 및 초청연수 내실화

지방순회세미나(7회) 및 한-베 상호 간 역량강화를 위한 세미나 개최(1회), 베트남 MOIT 소속 공무원 대상 초청 연수 및 초청 워크숍 운영

(1) 지방세미나 운영

i) 지역 선정 및 협의

· iDEA와 협의하여 중복 없는 개최지역 선정

ii) 행사 준비 및 진행

· 베트남 기업 50개 이상 참석 필수, 행사장 선정 및 계약
· 한-베 통역 인원 2명 이상 지원
· 베트남 지방상공회의소와 협의하여 행사장 및 프로그램 검토

iii) 연사 섭외 및 강의

· 베트남 전자상거래 관련 공무원 및 유관기관 연사 섭외
· 온라인 수출플랫폼 소개 및 활용 관련 강의 준비
· 각 세미나는 3개 이상의 세션으로 구성

ⅳ) 결과보고
· 결과보고서 및 만족도 조사 제출

(2) 정부세미나 운영
ⅰ) 행사 준비 및 진행
· 한-베 정부 주요 인사 및 유관기관 담당자 참석
· 개통된 시스템에 대한 세션 포함
· 행사장 선정 및 계약, 동시통역 및 보조 통역자 2명 이상 지원
ⅱ) 참석자 섭외
· 베트남 산업무역부 전자상거래 관련 공무원 및 유관기관 참석 섭외

(3) 초청연수 운영
ⅰ) 연수 대상자 선정
· 사업 착수 15일 이내 베트남 MOIT와 협의하여 선정
ⅱ) 비용 및 지원
· 항공, 숙박, 교통, 교육 장소, 식사, 다과 등의 제반 비용 일체 부담
· 한-베 통역 인력 2인 이상, 행사 지원 인력 4인 이상 지원
ⅲ) 연수 프로그램
· 전자상거래 관련 특송사 물류센터 방문, 관련 기관 방문, 파워셀러 간담회
· 전자상거래 관련 강사 초빙 교육 3회 이상
ⅳ) 결과보고
· 결과보고서 및 만족도 조사 제출

(4) 초청워크숍 운영
ⅰ) 워크숍 참석 대상자 선정
· 사업 착수 15일 이내 베트남 MOIT와 협의하여 선정
ⅱ) 비용 및 지원
· 항공, 숙박, 교통, 교육 장소, 식사, 다과 등의 제반 비용 일체 부담
· 한-베 통역 인력 1인 이상, 행사 지원 인력 2인 이상 지원
ⅲ) 워크숍 프로그램
· 사업추진 현황 공유
· 베트남 온라인 수출플랫폼 활성화 논의
ⅳ) 결과보고
· 결과보고서 및 만족도 조사 제출

4 제안의 전제조건

1) 발주기관과의 적극적 협력

(1) 역량강화 협조
ⅰ) (세미나 및 초청연수 협조) 정부 및 유관기관 세미나와 초청연수 프로그램을 통해 시스템 관련 지식과 경험을 공유하는 데 적극 협조 필요
ⅱ) (워크숍 협조) 수원국 참여자들의 워크숍 프로그램이 APEC 부대행사와 연계되어 운영될 수 있도록, 발주기관과의 일정 조율 및 프로그램 통합 운영이 필요
ⅲ) (연사 섭외 및 지원) 관련 전문가의 연사 섭외 및 지원

iv) (성과 평가) 역량강화 프로그램의 성과를 평가하고, 이를 토대로 시스템 운영 및 관리 방안을 개선

2) 신속한 감리업체 선정 및 수행

(1) 감리업체 선정 (7월)

i) (선정 기준 마련) 업체의 경험, 역량, 이전 프로젝트 성과 등 감리업체 선정을 위한 명확한 기준을 마련

ii) (공정한 선정 절차) 입찰 공고, 평가, 최종 선정 과정 등을 명확히 정의하여 투명하고 공정한 절차를 통해 적합한 감리업체를 선정

(2) 감리사 의견 조율 (8월)

i) (의견 수렴) 선정된 감리업체의 감리사와 프로젝트 주요 이해관계자 간의 의견을 수렴

ii) (조율 과정) 감리사의 의견을 반영하여 프로젝트 계획, 일정, 주요 이슈 등에 대해 조율

iii) (합의 도출) 조율 과정을 통해 상호 합의된 감리 계획을 수립

(3) 설계 감리 (9월)

i) (설계 검토) 감리사는 시스템 설계 단계에서 설계 도면, 기술 사양, 보안 방안 등을 검토

ii) (문제점 도출 및 개선) 설계 단계에서 도출된 문제점을 분석하고, 개선 방안을 제시합

iii) (보고서 제출) 감리 결과에 대한 상세 보고서를 작성하여 제출하며 설계의 적정성을 평가하고, 이후 단계에 반영됩니다.

(4) 종료 감리 (11월)

i) (최종 검토) 프로젝트 종료 시점에서 전체 시스템의 완성도를 최종 검토

ii) (성능 및 보안 점검) 시스템의 성능 및 보안 측면에서 최종 점검을 실시하여 문제점을 도출

iii) (종료 보고서 제출) 종료 감리 결과를 토대로 최종 보고서를 작성하여 제출

5 제안의 특징

1) 선행사업 대비 확대된 과업 범위

(1) 금번 사업은 공공 이마켓플레이스 고도화 외에도 셀러-바이어 매칭 시스템, 온라진 전시 시스템 등 신규 플랫폼 구축 과업이 추가되어 개발 범위가 확대됨.

(2) 베트남 온라인 수출플랫폼 운영 및 활성화 과업까지 포함되어, 기존 구축 중심에서 운영까지 범위가 확대됨.

2) 단기간 집중 수행 체계 요구

(1) 다양한 과업을 단기간에 집중적으로 수행·완수해야하는 사업으로 이슈 발생시 사업 지연 가능

3) 기자재 업체와의 협업체계 구축

(1) 선행 사업에서는 시스템 개발과 기자재가 통합 발주되었으나, 금번 사업은 기자재가 별도로 분리 발주되는 구조임

(2) 기자재 업체와의 긴밀한 협업체계 수립이 필수적이며, 개발 일정 및 품질 확보를 위해 사전 조율이 필요

4) ODA 사업 특성을 반영한 리스크 관리

(1) ODA 사업은 국내 사업과는 달리 위험, 소통, 일정, 범위 관리가 매우 중요하므로 국제적인 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소들을 체계적으로 관리 필요

(2) 현지 파트너와의 원활한 소통을 위해 수준 높은 커뮤니케이션 지원 채널을 활용하여야 함.

(3) 프로젝트 일정 관리에 있어 현지 상황을 고려한 유연한 접근 방식을 채택하며, 범위는 명확히 정의하고 변경사항 발생 시 신속히 대응해야 함

5) 수원국의 자립 운영 전환 및 플랫폼 인수 추진

(1) 본 사업은 마지막 연차로, 수원국의 자립 운영 전환을 위한 역량 강화와 실제 운영 이양이 요구됨

(2) 플랫폼에 대한 수원국의 인수 실행이 매우 중요하며, 이는 본 사업의 성공적 종료를 위한 핵심 과제

나. 추진전략

1 핵심 성공요소



1) 현지 파트너사 기반의 협력 구조 확립

(1) 베트남 공공 이마켓플레이스 시스템 구축 경험이 있는 인력이 그대로 참여하여 현지 제도 및 업무에 대한 이해도가 높음

(2) 3차년도 확대 과업을 수행할 수 있는 기술 역량 보유

2) 전문 운영 인력투입을 통한 조기 운영체계 정착

(1) 국내 플랫폼 운영 경험이 있는 전문가를 중심으로 운영센터 조직을 구성하고 초기 운영을 체계화

(2) 중소기업 수출 디지털화를 위한 실질적인 운영 기반 성과 창출 가능

3) 수원국 파트너십 구축 및 협력 강화

(1) MOIT와의 실무 협력 채널 운영 및 신뢰 기반 유지

(2) 베트남 전자상거래 마스터플랜 이해 및 선행 협력사의 대외 협력 경험 활용

4) 수원국의 플랫폼 인수 및 자립 운영 기반 마련

(1) 단계별 기능 인계 체계를 수립하고 운영 노하우를 내재화

(2) 수원기관 운영 담당자 대상 교육과 시범 운영을 통해 자율 운영 전환 기반 마련

2 시스템 구성도 및 구성체계

1) 목표시스템 구성도

2) 시스템 주요 구성

(1) 온라인 전시관

i) 베트남 특화 온라인 전시 시스템으로, 지역별 산업군과 전시 형태(온라인/오프라인/영상형 Special)를 통합 관리하며 바이어-셀러 연결을 강화

ii) 전시관, 미디어 콘텐츠, 커뮤니케이션, 세미나 등 디지털 기반 전시 기능을 체계화하여 운영 효율성과 사용자 몰입도 제고

iii) 참여율 확대와 마케팅 활용성 극대화를 위해 즐겨찾기, 상담 이력, 오프라인 전시 연계 등 데이터 기반 기능 제공

(2) 바이어 셀러 매칭

i) 바이어-셀러 매칭 시스템은 베트남 셀러와 해외 바이어 간 수출 상담을 위해 인바운드(바이어 수요 기반)와 아웃바운드(셀러 중심 마케팅)를 통합 지원하는 플랫폼 핵심 기능 제공

ii) 인바운드 매칭은 바이어의 요청에 기반해 셀러를 자동/수동 매칭하고, 이력관리 및 사후 피드백을 통해 거래 성사율 향상

iii) 아웃바운드 매칭은 캠페인, Circular Letter 발송 등 데이터 기반 마케팅 전략으로 바이어를 발굴하고 상담 기회를 확장

(3) 마케팅관리

마케팅 관리 기능은 브로셔 제작, 영상 제작, 구글 애즈 및 SNS 채널 광고 수행을 통해 수출플랫폼 활성화

(4) 통계관리

통계관리는 관리자 상담 이력 및 플랫폼 내 주요 활동 데이터를 활용하여 운영 신뢰도

및 대응 품질 향상, 관리자 중심의 전략 수립과 운영 정책 개선, 사용자 중심 플랫폼 서비스 강화

(5) 연계관리

i) 결제·정산 기능은 T/T, PayPal, 신용카드 등 다양한 수단과 연동해 외화 결제 및 베트남 중앙은행 보고서를 자동화하며, 판매·정산 이력을 체계적으로 관리

ii) 국제 물류 및 수출입 기능은 DHL 등 3PL과 연동해 배송 추적, 송장·계약·통관자료 통합 관리가 가능하며, 셀러 운영 편의성과 수출 행정 대응력을 강화

iii) Open API 서비스를 통해서 외부 플랫폼과 상품·주문 정보를 연동을 지원해서 셀러의 중복 업무를 줄이고, 데이터 기반 통계로 전략 수립을 지원

(6) 사용자 유형

i) 사용자: 사용자는 바이어와 셀러로 구성되고 바이어는 개인 바이어와 법인 바이어로 나뉘며, 상품 검색 및 구매를 주요 기능으로 함. 셀러는 중소기업 및 개인 셀러로 나뉘며, 상품 등록 및 판매 관리가 주요 기능

ii) 관리자: 관리자는 프로젝트와 운영 담당자로 구성되고 운영 담당자는 시스템 운영 및 유지보수를 담당

(7) 시스템 운영

i) 인프라: 플랫폼 개발환경을 CI/CD 클라우드 인프라 구성을 통해서 사용자 요구사항을 정확하고 신속하게 적용. 보안 강화를 위해 HTTPS, SSH, SSL 등을 사용하여 데이터 전송 및 통신의 안전성을 확보

ii) 데이터베이스: 민감 데이터는 암/복호화 과정을 통해 보호됨. 데이터베이스는 중요한 정보의 무결성을 유지하며, 안전한 데이터 관리를 지원

3 사업 추진전략

사업의 추진전략

1) 3차년도 핵심 기능 집중 개발 및 한-베 병행 개발 수행

(1) 온라인 전시, 바이어-셀러 매칭, 베트남 공공 이마켓플레이스 고도화 등 핵심 시스템 동시 구축

i) 선행사업의 연계를 기반으로, 각 시스템 간 기능 중복을 최소화하고 통합 구조를 유지하며 개발 병행

ii) 개발 우선순위를 기능 완성도, 사용자 편의성, 수원기관 활용 가능성 기준으로 설정하여 단계별 구축 추진

(2) 한국-베트남 공동 병행 개발을 통한 개발 효율화 및 기술 공유 강화

i) 기존 협력사 및 개발 인력 간 협업을 위한 개발 일정 공유 체계를 운영하고, 테스

트 환경 및 결과물을 상시 교환

ii) 기술 문서, 설계 구조 등은 한-베 양국이 상호 검토할 수 있도록 표준화된 양식으로 관리하고 공유 체계를 유지

2) 운영 전문가 중심의 운영체계 조기 정착

(1) 운영 전문가 중심의 운영센터 구성 및 업무 체계 정립

i) 플랫폼 운영 경험이 있는 인력을 기반으로 초기 운영팀을 구성하고, 각 역할(기술, 콘텐츠, 사용자지원 등)을 명확히 배분

ii) 초기 3개월 내 안정적 운영을 위한 주간 단위 업무 관리 및 이슈 대응 체계를 사전 설계

(2) 운영 매뉴얼 및 KPI 기반 관리체계 수립

i) 수원기관의 인수 및 향후 자율 운영을 고려하여, 서비스 운영 매뉴얼 및 관리자 매뉴얼을 개발 초기부터 병행 작성

ii) 방문자 수, 등록자 수, 매칭 성공 건수 등 주요 성과 지표를 기반으로 한 KPI 체계를 수립하고, 이를 정기적으로 점검

3) 수원국과의 협력 기반 운영 고도화

(1) MOIT와 실무 협의 채널 운영 및 요구사항 정기 수집

i) MOIT 내 담당자와의 주간/격주 단위 협의체를 운영하여, 개발 중 발생하는 수요와 의견을 조율

ii) 각 시스템별 담당자와 소통이 가능하도록 전담 창구를 지정하고, 협력사의 현지 대응 인력이 수렴 창구 역할을 수행

(2) 수집된 요청사항에 대한 우선순위 기반 반영 프로세스 운영

i) 요구사항 수렴 시 중요도와 구현 난이도를 기준으로 우선순위를 구분하고, 개발 일정에 따라 반영 여부를 결정

ii) 반영된 요구사항은 MOIT 측과 공유하고, 이후 결과에 대해 피드백을 다시 수렴하는 순환 구조로 운영

4) 수원국의 플랫폼 인수 및 자립 운영 기반 강화

(1) 기능별 단계적 인계 계획 수립 및 자료 이전

i) 플랫폼 내 기능 모듈 단위로 문서화된 인계자료를 준비하고, 운영 절차별 매뉴얼 및 관리도구를 포함하여 단계적으로 이전 수행

iii) 인계 시점에는 기능별 시연 및 기술 설명회를 개최하여 수원기관 담당자의 이해도를 높임

(2) 수원기관 운영 담당자 대상 교육과 시범 운영을 통해 자립 운영 역량 확보

i) 운영 담당자를 대상으로 단계별 실습 중심의 교육과정을 운영하며, 교육과 동시에 시범 운영을 병행하여 실무 적응도를 높임

ii) 교육 이수 후에는 담당자별 업무별 책임 범위와 점검 지표를 명확히 설정하여, 운영 안정성을 확보

가. 제안사 현황

1 일반현황

1) 퀀텟시스템즈

1. 회사명	퀀텟시스템즈	2. 대표자	박성용
3. 사업자등록번호	101-81-94611	4. 법인등록번호	110111-2782004
5. 사업 분야	솔루션·SI·CRM·ERP	6. 종업원 수	83명
7. 연락처	TEL 02-541-8517		
8. 주소	서울 영등포구 여의나루로 71, 16층		
9. 회사설립연도	2003. 05. 19		
10. 해당부문 사업기간	22년		

[주요연혁]
-국방기술품질원, AI 서비스 구현 (2025.02~현재)
-GS 리테일, GS 리테일 그룹 통합 포인트 및 회원관리 시스템 구축(2024.07~현재)
-E1, 오렌지카드 App/WebRenewal (2024.11~유지보수 진행중)
-에쓰오일, 차세대 CRM시스템 구축 (2022.02~유지보수 진행중)
-롯데정보통신, GRS 멤버십 시스템 구축 및 유지보수 (2022.06~유지보수 진행중)
-데상트코리아, 멤버십 마케팅 시스템 구축 (2021.11~유지보수진행중)
-투썸플레이스, 멤버십 시스템 구축 (2020.09~유지보수 진행중)
-락앤락 통합고객관리 및 로열티 마케팅 시스템 구축 (2020.09~유지보수 진행중)
-아이파크몰 멤버십 시스템 구축 (2019.09~유지보수 진행중)
-다이소 통합 CRM시스템 구축 (2018.09~2024.06)

2) 아스트라비전

1. 회사명	아스트라비전	2. 대표자	민세준
3. 사업자등록번호	821-87-03142	4. 법인등록번호	110111-8990932
5. 사업 분야	솔루션·SI	6. 종업원 수	7명
7. 연락처	TEL 02-379-0199 FAX 02-379-0211		
8. 주소	경기도 성남시 수정구 창업로40번길 20, 6-7호		
9. 회사설립연도	2024. 07. 01		
10. 해당부문 사업기간	1년		

[주요연혁]
- 2024 대한민국 중기부 예비창업지원기업 선정
- 패커드코리아 수출공급망 관세무역 원활화 지원포털(FECT 1.0) 구축

2 재무현황

1) 제안사 경영상태 및 매출(최근 3년)

(1) 퀀텟시스템즈(2022년 1월 ~ 2024년 12월)

원화 단위 : 백만원

구 분		2022년	2023년	2024년
총자산		5,747	4,569	4,910
자기자본		2,656	1,189	-1,117
유동부채		768	708	3,098
비유동부채		2,321	2,672	2,929
유동자산		4,776	2,710	2,379
당기순이익		269	-1,467	-2,307
매출액	H/W 및 SW	2,166	3,572	1,956
	시스템 개발 및 운영	8,609	6,176	5,832
	합계	10,775	9,748	7,788
자기자본비율(%)		46.23%	26.03%	-22.76%
자기자본순이익율(%)		10.13%	-123.37%	206.41%
유동비율(%)		621.67%	382.58%	76.79%

(2) 아스트라비전(2022년 1월 ~ 2024년 12월)

원화 단위 : 백만원

구 분		2022년	2023년	2024년
총자산		-	-	24
자기자본		-	-	20
유동부채		-	-	4
비유동부채		-	-	0
유동자산		-	-	24
당기순이익		-	-	0.2
매출액	라이센스	-	-	9
	합계	-	-	9
자기자본비율(%)		-	-	83%
자기자본순이익율(%)		-	-	1.37%
유동비율(%)		-	-	602%

2) 기업신용평가등급

퀀텟시스템즈

1. 기업신용평가 요약

- 발행번호 : 1328953-202406-001
- 발행일자 : 2024/06/24

■ 기업개요

기업명	(주)퀀텟시스템즈			CLIP기업신용등급
대표자	박성용			BB-
사업자등록번호	101-81-94611	법인등록번호	110111-2782004	
전화번호	02-541-8517	사업시작일	2003/05/21	
주소	서울특별시 영등포구 여의나루로 71(여의도동, 동화빌딩 16층)			
기업형태	일반, 중소기업			현금흐름등급
표준산업분류(업종)	J62021(컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업)			C+
주요제품(사업)	CRM 컨설팅 / 솔루션 공급 및 구축, 클라우드 SaaS 개발플랫폼			
재무결산기준일	2023/12/31	신용등급평가일	2024/06/24	
신용등급유효기간	2024/06/24 ~ 2025/06/23			

■ 최근신용평가

재무결산 기준일	본평가			반기 및 수시평가		
	등급평가일	기업신용등급	현금흐름등급	등급평가일	기업신용등급	현금흐름등급
2023/12/31	2024/06/24	BB-	C+			
2022/12/31	2023/04/28	BB0	C+			
2019/12/31	2020/04/14	BB0	A			

■ 주요재무사항 (단위: 백만원, %)

재무항목	2021/12	2022/12	2023/12	재무비율	2021/12	2022/12	2023/12
총 자 산	5,374	5,747	4,570	순이익증가율	-343.2	122.1	-645.1
자기자본	2,388	2,657	1,189	자기자본비율	44.4	46.2	26.0
자 본 금	111	111	111	부채비율	125.1	116.3	284.2
차 입 금	1,923	2,091	2,274	차입금의존도	35.8	36.4	49.8
금융비용	92	168	183	금융비용부담률	1.1	1.6	1.9
매 출 액	8,330	10,776	9,748	매출액증가율	-1.0	29.4	-9.5
영업이익	-1,021	391	-1,457	매출액영업이익률	-12.3	3.6	-14.9
당기순이익	-1,220	269	-1,467	매출액순이익률	-14.7	2.5	-15.1

■ 주요 주주

주주명	지분율(%)
박성용	23.9
조남승	14.0
최용석	14.0

■ 주요 매출처

주요 매출처	거래비중(%)
에쓰-오일 (S-OIL) (주)	34.6
주식회사 카카오브이엑스 (KAKAO VX)	16.9
지에이엘씨솔루션 주식회사	9.8

■ 주요 매입처

주요 매입처	거래비중(%)
에스에이피코리아 (주)	23.1
주식회사 지엘티코리아	12.0
바이트리스트 주식회사	10.0

- 2 -

(주)NICE디앤비 dun&bradstreet

아스타라비전

일련번호 : PPR-2025-3-89035-I
교부번호 : SCRI-20250311-092

SCI평가정보 Seoul Credit Information

기업신용평가등급 확인서

주식회사 아스트라비전 귀중

기 업 체	주식회사 아스트라비전
대 표 자	민세준
법 인 등 록 번 호	110111-8990932
사 업 자 등 록 번 호	821-87-03142
주 소	서울특별시 서대문구 세무서3길 19, 1층(홍제동)
재무결산기준일	2024년 12월 31일
등 급 평 가 일	2025년 03월 07일
등 급 유 효 기 한	2026년 03월 06일
제 출 처 및 용 도	공공기관 제출용

기업신용평가등급

B-

상기등급은 회사채에 대한 신용평가등급 B-에 준하는 등급임

유의사항

1. 본 기업신용평가등급 확인서는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의해 허가받은 기업신용조회회사가 기업신용등급 제공업무에 근거하여 작성되었습니다.
2. 본 확인서의 기업신용평가등급은 기업이 제출한 자료에 근거하여 당사의 평가기준 및 절차에 의하여 평가한 것으로 기업 채무이행능력에 대한 보증을 의미하지 않습니다.
3. 본 확인서의 기업신용평가등급은 평가 대상이 유효기한 내에 신용상태에 중대한 변화가 있다고 판단될 경우 사후평가절차에 따라 등급이 변동될 수 있습니다.
4. 본 확인서는 조달청, 지자체 등 공공기관 입찰 및 상거래 신용도 확인에 활용되며, 그 활용에 따른 판단이나 결정에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
5. 본 확인서에 대한 확인 및 문의는 SCI평가정보(주)(Tel. 02-514-3000)로 연락하여 주시기 바랍니다.

SCI평가정보 주식회사

Copyright(c)2019. SCI Information Service. All right reserved
여기있는 모든 정보의 저작권은 SCI평가정보(주)의 소유입니다. 따라서 어떤 정보도 당사의 서면 동의 없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단 전재되거나 복사 또는 재판매, 유포될 수 없습니다.

3 주요사업내용

1) 해외진출 현황

(1) 퀀텟시스템즈

i) 미래에셋생명, 산모수첩관리 앱 서비스 구축

ii) AeroSuite, 공항 보안 업무 관리 시스템 구축

(2) 아스트라비전

i) 베트남 현지 특화 솔루션(LQ, CO, EC, IS 등) 개발 및 공급

ii) AI 및 LLM 기술 기반 무역 자동화 솔루션 개발

4 기타

1) 온라인 수출플랫폼 구축을 위한 기술 보유현황

(1) 퀀텟시스템즈

i) ERP·SCM·CRM 설계 및 개발

ii) Analytics 설계 및 개발

iii) AI/ML 모델링 설계 및 개발

iv) AI기반 비즈니스 프로세스 자동화 설계 및 개발

(2) 아스트라비전

i) 베트남 현지 개발조직과의 공동 개발·운영체계 구축
ii) DevOps 중심 CI/CD 파이프라인, 글로벌 SaaS 서비스 운영
iii) RAG 기반 지식검색, AI 에이전트 아키텍처 구현

나. 조직 및 인원

1 조직현황

구분	컨텟시스템즈	구분	아스트라비전
R&D/AI	15명	R&D	1명
Development	53명	Product Development	1명
Consulting	6명	UI/UX Planing	2명
영업	4명	Product Management	1명
ETC(인사, 마케팅, 디자인)	4명	Marketion	2명

2 인원현황

1) 인원 현황

(1) 조직별 전문기술자 보유현황

구분	컨텟시스템즈	아스트라비전
특급기술자	25명	2명
고급기술자	14명	1명
중급기술자	14명	-
초급기술자	30명	-
합계	83명	3명

2) 기술 등급별 전문인력

컨텟시스템즈

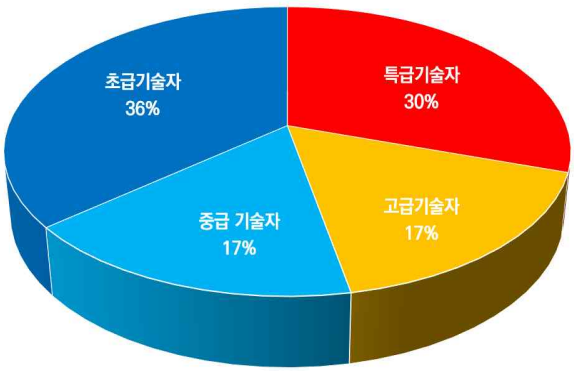

아스타라비전



3 사업 수행조직

1) ㈜퀀텟시스템즈



- AI · R&D
  - 신규 기술 습득
  - 신규 제품 엔진 개발
  - 제품 엔진 유지 보수
- Development
  - 기술지원 및 서비스
  - 프로젝트 수행
  - 장애 대응
- Consulting
  - Pre-sales
  - 전략 및 Biz 컨설팅
  - 프로젝트 제안/수행
- 영업
  - 고객사 기회 발굴
  - 프로젝트 제안
  - 프로젝트 계약
- General & Admin.
  - 인사/재무/회계
  - 마케팅
  - 디자인

2) ㈜아스트라비전



- R&D
  - 신규 기술 습득
  - Ai기술 기반 R&D 수행
  - 신규 IP 출원
- Product Development
  - 기술지원 및 서비스
  - 프로젝트 수행
  - 장애 대응
- UI/UX Planing
  - 서비스 및 플랫폼 UX 설계
  - UI 디자인
- Product Management
  - 제품 품질 관리
  - 서비스 고도화 및 서비스 확장 기획
- 경영지원
  - 인사/재무/회계
  - 디지털 마케팅 켐페인

4 투입인력 및 이력사항

1) 투입인력 총괄

2) 사업 총괄 PM의 역량

(1) 퀀텟시스템즈 최용석 부사장

성 명	최용석	소 속	㈜퀀텟시스템즈	직 책	부사장	연 령	53세
학 력	KAIST 경영공학 석사			해당분야근무경력		26년 10개월	
	NYU Stern School of Business B.S.			자격증			
본사업참여임무	PM	사업참여기간		착수일로부터 ~ 2025.11.30		참여율	100 %

경 력				
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고
경동나비엔 고객통합 컨설팅 프로젝트	2024.11 ~ 2025.01	PM	경동나비엔	
S-Oil CRM Upgrade 프로젝트	2022.02 ~ 2023.03	PM	S-Oil	
효성중공업 CRM 프로젝트	2021.04 ~ 2022.01	PM	효성중공업	
BMW Korea DWH & BI 구축 2차 프로젝트	2019.06 ~ 2020.02	PM	BMW Korea	
롯데케미칼 모바일 영업시스템(SAP)	2019.05 ~ 2019.05	PM	롯데이노베이트	
BMW Korea SEMKR Wholesale CRM 프로젝트	2019.03 ~ 2019.04	자문	BMW Korea	
삼익 THK SAP Sales Cloud 프로젝트	2018.06 ~ 2018.12	PM	삼익 THK	
BMW DWH & BI 구축 1착 프로젝트	2017.09 ~ 2018.04	PM	BMW Korea	
제주항공 FFP 기반 CRM 컨설팅 프로젝트	2016.10 ~ 2016.12	PM	AKIS	
SDS 차세대 과금청구 프로젝트	2016.01 ~ 2016.08	PM	SDS	
S-Oil PRM 프로젝트	2015.09 ~ 2015.12	PM	S-Oil	
아시아나 항공 CRM 전략컨설팅 프로젝트	2014.10 ~ 2014.11	PM	아시아나항공	
S-Oil eBiz 포탈 구축 프로젝트	2014.05 ~ 2014.09	PM	S-Oil	
SSC SAP Sales Cloud 프로젝트	2013.10 ~ 2014.01	PM/BA	서울반도체	
CIGNA 생명보험 iCAS 구축 프로젝트	2013.05 ~ 2013.09	PM/BA	CIGNA RO	
KT BIT Marketing 프로젝트	2012.02 ~ 2013.04	PM	KT	
현대기아차 CRM 2nd Roll-Out 프로젝트	2011.09 ~ 2012.02	PM/BA	오토에버	
LG 전자 SVC Offering 프로젝트	2011.06 ~ 2011.06	BA	LG CNS	
HMCA & KMAU 콜센터 구축 프로젝트	2010.10 ~ 2010.11	BA	오토에버	
KOSCOM SFA & SR 관리 시스템 구축	2010.08 ~ 2010.09	BA	KOSCOM	
LG전자 BRM 및 파트너 포털 시스템 구축 2차	2010.01 ~ 2010.06	PM	LG CNS	
LG전자 BRM 및 파트너 포털 시스템 구축 1차	2009.06 ~ 2009.12	PM	LG CNS	
HMA 마케팅 시스템 구축 프로젝트	2008.09 ~ 2009.04	BA	오토에버	
FnC 코오롱 CRM 시스템 구축 프로젝트	2008.02 ~ 2008.03	PM	FnC 코오롱	
옥션 CRM 시스템 및 콜센터 구축 프로젝트	2007.07 ~ 2008.01	PM/BA	eBay Korea	
관세청 CRM 시스템 구축 프로젝트	2006.05 ~ 2006.12	PM/BA	관세청	
L'Oreal Korea CRM 전략 컨설팅	2006.02 ~ 2006.04	BA	L'Oreal Korea	
라이나생명 콜센터(KCC) 구축 프로젝트	2005.07 ~ 2006.01	PM/BA	라이나생명	

3) 사업 핵심인력 역량

(1) 개발 PL 홍바울 이사

성 명	홍바울	소 속	㈜퀀텟시스템즈	직 책	이사	연 령	50세
학 력	서울대학교 생물교육과 학사			해당분야근무경력		24년 4개월	
				자격증			
본사업참여임무	PL	사업참여기간		착수일로부터 ~ 2025.11.30		참여율	100%

경 력				
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고
GS리테일 통합 포인트 구축 프로젝트	2024.08 ~ 2025.06	PM	GS리테일	
카카오 VX GMS 구축 프로젝트	2023.01 ~ 2024.01	PL/BA	카카오 VX	
대교 올인원 제품 제작	2021.12 ~ 2022.05	PM/BA	디피니션	
SK 가스 멤버십 구축 프로젝트	2020.08 ~ 2021.01	BA	SK 주식회사	
데상트 온오프 통합 및 고객관리 컨설팅	2020.01 ~ 2020.03	BA	데상트 코리아	
이랜드 리테일 실시간 마케팅 구축	2019.09 ~ 2019.12	PM	이랜드 리테일	
BAT Korea 멤버십 시스템 구축	2019.06 ~ 2019.12	PM	BAT Korea	
다이소 멤버십 구축 프로젝트	2018.11 ~ 2019.03	PM	아성다이소	
롯데호텔 차세대 PI/ISP	2018.09 ~ 2018.10	PL	롯데호텔	
E1 오렌지카드 3기 구축 프로젝트	2017.09 ~ 2018.04	PM	E1	
이랜드 리테일 차세대 CRM 구축 프로젝트	2016.12 ~ 2017.09	PL	이랜드 리테일	
삼성 SDI 서비스 시스템 구축 프로젝트	2015.09 ~ 2016.06	PM	삼성 SDI	

(2) 역량강화 PL 민세준 대표

성 명	민세준	소 속	㈜아스트라비전	직 책	대표	연 령	40세
학 력	건국대학교 국제무역학사			해당분야근무경력		15년	
				자격증		관세사	
본사업참여임무	PL	사업참여기간		착수일로부터 ~ 2025.11.30		참여율	100 %

경 력				
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고
2025년 베트남 글로벌 소싱페어 박람회 통역용역사업	2025.04 ~ 2025.04	PM	글로벌소시스	
2024년 베트남 온라인수출플랫폼 모델 전수 ODA사업	2024.07 ~ 2024.12	PL	KTNET	
2023년 베트남 온라인수출플랫폼 현지 역량강화 및 컨설팅 용역사업	2023.09 ~ 2023.11	PM	KTNET	
2021년도 원산지관리시스템 종합컨설팅 사업	2021.04 ~ 2021.12	PM	산업통상자원부	
2021년도 FTA 특혜관세 활용지원사업	2021.05 ~ 2021.12	PM	농수산식품유통공사	
2021년도 FTA Korea 원산지관리시스템 유지보수 사업	2021.01 ~ 2021.12	PM	산업통상자원부	
와이지원 FTA 원산지 관리 시스템 유지보수 사업	2021.01 ~ 2021.12	PM	와이지원	
2020년도 원산지관리시스템 종합컨설팅 사업	2020.04 ~ 2020.12	PM	산업통상자원부	
2020년도 FTA 특혜관세 활용지원사업	2020.05 ~ 2020.12	PM	농수산식품유통공사	
2020년도 FTA Korea 원산지관리시스템 유지보수 사업	2020.01 ~ 2020.12	PM	산업통상자원부	
와이지원 FTA 원산지 관리 시스템 유지보수 사업	2020.01 ~ 2020.12	PM	와이지원	
2019년도 원산지관리시스템 종합컨설팅 사업	2019.04 ~ 2019.12	PM	산업통상자원부	
2019년도 FTA 특혜관세 활용지원사업	2019.05 ~ 2019.12	PM	농수산식품유통공사	

와이지원 FTA 원산지 관리 시스템 유지보수 사업	2019.01 ~ 2019.12	PM	와이지원	
2018년도 원산지관리시스템 종합컨설팅 사업	2018.04 ~ 2018.12	PM	산업통상자원부	
2018년도 FTA 특혜관세 활용지원사업	2018.05 ~ 2018.12	PM	농수산식품유통공사	
2018년도 FTA Korea 원산지관리시스템 유지보수 사업	2018.01 ~ 2018.12	PM	산업통상자원부	
와이지원 FTA 원산지 관리 시스템 유지보수 사업	2018.01 ~ 2018.12	PM	와이지원	

(3) 센터 운영 및 마케팅 PL 오대산 대표

성 명	오대산	소 속	빅마운트(유)	직 책	대표	연 령	43세
학 력	Nanjing Normal Univ.,, Chinese Language &Literature (학사) 학점은행제 컴퓨터공학과(학사) 서울과학종합대학원대학교 AI전략경영 (석사과정)			해당분야근무경력		15년	
				자격증			
본사업참여임무	PL	사업참여기간		착수일로부터 ~ 2025.11.30		참여율	100 %

경 력				
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고
베트남 온라인 수출플랫폼 모델 전수 ODA 사업용역	2024.07.26.~2024.11.30	기획	중소기업벤처기업진흥공단	온라인수출플랫폼
에티오피아 가죽 및 가죽제품 경쟁력 강화사업	2024.06.07.~2024.06.28	컨설팅	KOICA	3차 파견
베트남 온라인 수출플랫폼 모델 전수 ODA 사업용역	2023.11.08.~2023.11.17	컨설팅	중소기업벤처기업진흥공단	온라인수출플랫폼
에티오피아 가죽 및 가죽제품 경쟁력 강화사업	2023.10.16.~2023.11.06	교육	KOICA	2차 파견
디지털정부 해외진출 기반 조성사업(SICA 온라인수출플랫폼 구축)	2023.09.10.~2023.09.17	컨설팅	NIA	온라인수출플랫폼
페루 마켓플레이스 및 E-pymex시스템 고도화	2023.07.14.~2023.07.24	컨설팅	페루통상관광부	온라인수출플랫폼
우즈베키스탄 국가전자무역시스템 1차년도 (ODA)	2019.12.19.~2019.12.27	컨설팅	한국산업기술진흥원	온라인수출플랫폼
대구광역시 온라인 해외마케팅 B2B 운영 지원 사업	2017.7.5.~2018.7.3.	PL	한국무역협회	온라인수출플랫폼
B2C 판매전략 세미나 및 컨설팅 상담회 운영 사업	2017.8.17.~2017.9.16.	PL	성남산업진흥원	온라인수출플랫폼

(4) 사업관리 PL 이상진 이사

성 명	이상진	소 속	㈜아스트라비전	직 책	CTO	연 령	49세
학 력	명지대학교 전기전자 전공			해당분야근무경력		24년 4개월	
				자격증		SCJP	
본사업참여임무	PL	사업참여기간		착수일로부터 ~ 2025.11.30		참여율	100 %

경 력				
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고
2024 원산지관리시스템 종합 컨설팅 사업	2024.04 ~ 2025.01	PL/개발	KTNET	
FECT (베트남 수출공급망 관세무역 원활화 지원포털)	2023.06 ~ 2023.12	PM/개발	RUDA S&C	
질병청 모의훈련 시스템 구축	2023.06 ~ 2023.09	PM/개발	질병청	
RAC 글로벌 렌터카 프론트엔드 구축	2023.07 ~ 2023.10	PM/개발	투어마케팅 코리아	
VLE (베트남 수책 관리 엔진)	2021.01 ~ 2021.02	PM/개발	자체개발	
20년도 원산지관리시스템 종합컨설팅 사업	2020.05 ~ 2020.12	개발	KTNET	
(주)제노코 근태관리 시스템 구축	2019.09 ~ 2019.12	PM/개발	(주)제노코	
FTAKorea 간편형 기능추가	2019.07 ~ 2019.09	개발	KTNET	
(주)제노코 공수원가 시스템 구축	2019.04 ~ 2019.07	PM/개발	(주)제노코	
FTAKorea 공급망 구축 시범 사업	2018.05 ~ 2019.01	PM/개발	KTNET	
FTAKorea Enterprise 시스템 구축 사업	2017.05 ~ 2018.02	PM/개발	KTNET	

스마트 팩토리 솔루션 개발	2016.01 ~ 2017.04	PM/개발	(주)유비포럼	
한국타이어 GTS/WCS 중국&인도 법인 추가 구축	2015.08 ~ 2015.12	PM/개발	(주)한국타이어	
외국인 전용 배달 서비스 시스템 구축	2015.01 ~ 2015.07	PM/개발	(주)유비포럼	
FTAKorea 1차 고도화	2014.03 ~ 2014.12	PM/개발	KTNET	
YG1 FTA 원산지 관리 시스템 구축	2013.12 ~ 2013.02	PM/개발	YG1	
FTAKOREA 유지보수	2013.02 ~ 2013011	개발	KTNET	
금호석화 FTA 원산지 관리 시스템 구축	2012.06 ~ 2011.12	PM/개발	(주)금호석유화학	
대우전자 FTA 원산지 관리 시스템 구축	2011.07 ~ 2011.12	PM/개발	(주)대우전자	
FTA 원산지 관리 솔루션 개발	2011.01 ~ 2011.06	PM/개발	(주)유비포럼	
삼성 ITTS 물류추적 연계센터 유지보수	2010.01 ~ 2010.12	개발	(주)삼성전자	
주택공사/금결원 연계 모듈 개발	2009.07 ~ 2009.12	개발	한국주택공사	
주택공사/예탁원 연계 모듈 개발	2009.01 ~ 2009.06	개발	한국주택공사	
한국타이어 물류추적 시스템 개발	2008.07 ~ 2008.12	PL/개발	(주)한국타이어	
수출입 물류시스템 운영 유지보수	2007.02 ~ 2008.06	개발	(주)비투비인터넷	
게임포인트 관리 시스템 개발	2006.07 ~ 2009.12	PL/개발	JCE엔터테인먼트	
화물관리 패키지(Web, CS) 개발	2006.03 ~ 2006.06	개발	(주)레디코리아	
KTNET ECF 2차	2005.07 ~ 2006.02	PL/개발	KTNET	
(주)동아제약 외환상역 EDI 시스템 개발	2005.04 ~ 2005.06	PL/개발	(주)동아제약	
수출입은행 외환상역 EDI 시스템 개발	2005.01 ~ 2005.03	개발	수출입은행	
KTNET 전자민원 2차	2004.06 ~ 2004.12	개발	KTNET	
업무혁신 전산화 프로젝트	2003.12 ~ 2004.05	개발	(주)능원금속	
자동차 정비통장 및 게시판 유지보수	2001.06 ~ 2001.12	개발	(주)호미넷	

4) 사업 수행 인력

업무	성명	전문가등급	직위	학력	비고
PL	홍바울	특급	이사	학사	
개발	김태욱	특급	부장	학사	
개발	정재영	특급	부장	학사	
개발	배승철	특급	부장	학사	
개발	안남기	특급	부장	학사	
개발	조명진	특급	부장	학사	
개발	이경남	특급	부장	학사	
기획	이필수	고급	차장	학사	
개발	이범신	특급	이사	학사	
개발	한창훈	특급	이사	학사	
개발	백상주	고급	차장	학사	
개발	박광민	중급	과장	학사	
개발	고형화	중급	과장	학사	
개발	이경영	중급	과장	학사	
디자인	김재희	중급	차장	학사	
개발	김장운	특급	부장	학사	
개발	최태영	특급	부장	학사	

업무	성명	전문가등급	직위	학력	비고
개발	문경선	특급	차장	학사	
개발	이승범	특급	부장	학사	
개발	강길제	고급	과장	학사	
워크숍	이돈녕	초급	주임	학사	
개발	정수지	초급	대리	학사	
개발	김정석	특급	부장	학사	
기획	표민종	특급	부장	학사	
개발	이기오	고급	차장	학사	
초청 연수	이승태	초급	주임	학사	
운영팀	박정환	초급	대리	학사	
초청 연수	문선준	초급	주임	학사	
매칭팀	이연희	초급	대리	학사	
워크숍	문준원	고급	차장	학사	
초청 연수	김정균	초급	주임	학사	
운영팀	이혜리	초급	대리	학사	
PL	민세준	특급	대표	학사	관세사
품질	지원호	특급	이사	학사	
PL	이상진	특급	CTO	학사	SCJP
관리	남의석	고급	팀장	학사	
세미나	김지예	고급	팀장	학사	
관리	조아영	고급	책임	학사	
운영팀	Nguyen Xuan anh	초급	선임	학사	
통역	Dinh Thi Tu Anh	초급	선임	학사	
개발	Nguyen Thanh Trung	특급	팀장	학사	
운영센터	Bui Van Nhu	특급	팀장	학사	
개발	Phan Trung Kien	특급	팀장	학사	
개발	Vuong Van Toan	고급	책임	학사	
개발	Dinh Huy Chuong	고급	책임	학사	
개발	Dang Viet Cuong	고급	선임	학사	
개발	Hoang Van Hoa	고급	선임	학사	
개발	Nguyen Duc Hung	고급	선임	학사	
개발	Tran Xuan Vu	고급	선임	학사	
개발	Van Dinh Hoang Vu	고급	선임	학사	
디자인	Bui Vinh Quoc Bao	중급	선임	학사	
개발	Bui Duc Hai	초급	사원	학사	
개발	Nguyen Hoang Bach	초급	사원	학사	
통역	Nguyen Thi Linh Chi	고급	책임	석사	
통역	Nguyen Thi Thanh Lan	중급	책임	학사	
운영센터	Truong Thi Nguyet	중급	책임	학사	
세미나	Tran Thi Ngoc Anh	고급	책임	학사	
세미나	Dinh Van Thinh	중급	선임	학사	
세미나	Phan Thi Thao	중급	선임	학사	
통역	Nguyen Thi Huyen Trang	초급	선임	학사	

업무	성명	전문가등급	직위	학력	비고
매칭팀	Hoàng Quảng An	고급	책임	학사	
매칭팀	Ta Xuan Giao	고급	책임	학사	
기술팀	Nguyen Xuan Nam Long	중급	선임	학사	
기술팀	Nguyen Van Manh	중급	선임	학사	
기술팀	Nguyen Van Cuong	초급	선임	학사	
기술팀	Nguyen Trong Hiep	초급	선임	학사	
기술팀	Van The Duy	고급	선임	학사	
보안팀	Do Thai Son	중급	선임	학사	
보안팀	Can Kim Chi	고급	선임	학사	
보인팀	Nguyen Thanh Hai	중급	선임	학사	

가. 베트남 공공 이마켓플레이스 및 전시·매칭 시스템 구축

1 공공 이마켓플레이스 고도화

1) 공공 이마켓플레이스 고도화 개요

◆ 2024년 2차년도 사업을 통해 상품 등록, 주문, 견적, 인콰이어리 등 기본적인 B2B 거래 프로세스 구축
◆ 실제 글로벌 거래 환경에서 필수적인 외화 결제, 물류 연동, 수출입 신고, 통계 조회, 외부 데이터 연계 기능은 미비한 상태
◆ 본 3차년도 사업은 기존 시스템을 고도화하여 이러한 미비 기능을 보완하고, 베트남 수출기업의 실질적 거래 편의성과 플랫폼 경쟁력을 강화하는 데 목적이 있음.

(1) 결제 및 정산 기능의 실용화

i) 수출 결제 수단(T/T, PayPal, 신용카드 등)과 연계하여, 결제자료 등록·조회·수정·정산이 가능하도록 기능 구현이 필요. 특히 중앙은행 보고 의무를 준수할 수 있도록 외화 결제 보고자료 생성 지원

(2) 국제 물류 기능의 통합 제공:

i) DHL 등 글로벌 3PL 업체와 연동하여 배송 추적 등 물류 관련 작업을 한 플랫폼 내에서 처리할 수 있도록 API 기반 연동 기능을 구축하고 베트남 셀러가 배송 자료 및 송장 등록 가능

(3) 데이터 연계 API 제공:

i) 베트남 셀러들이 다수의 글로벌 쇼핑몰(Shopee, Amazon 등)에 동일 상품을 등록할 수 있도록 하기 위해, 상품/주문/쇼핑몰 정보의 오픈 API 제공 구조가 필요. 이를 통해 중복 업무 부담을 줄이고 정보 확산을 촉진

(4) 수출입 신고 및 서류 자동화:

i) 수출통관 연계와 합계, 수출입 신고 관련 정보를 등록, 조회 등을 할 수 있는 기능을 구축하여, 셀러가 수출입과 관련된 정보와 문서를 디지털 방식으로 관리할 수 있도록 지원

(5) 통계 기반 운영지원:

i) 기간별/대륙별 회원, 카테고리별/대륙별 인콰이어리, 바잉오퍼 등 통계를 조회하고 시각화하여, 플랫폼 운영자 및 셀러가 마케팅 전략과 운영 개선을 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 기능을 강화.

2) 외화 결제 및 중앙은행 보고 관리

◆ 고비즈베트남 플랫폼은 베트남 수출기업과 글로벌 바이어 간의 실질적인 거래 편의를 높이기 위해, 외화 기반의 다양한 결제 수단(T/T, PayPal, 신용카드)을 지원
◆ 결제 정보 및 판매 내역을 체계적으로 관리할 수 있는 기능을 제공
◆ 외화 수취 내역에 대한 베트남 중앙은행 보고의무 대응을 위해 결제자료 기반의 보고서 생성 기능을 제공

(1) 결제자료 및 외화 정산관리

i) 결제 정보를 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 구성하고, 결제 상태(대기, 완료, 실패 등)를 기준으로 목록 및 상세 조회 기능 제공
ii) 증빙 자료(인보이스 등)를 함께 등록/수정/조회할 수 있도록 서식 자료 관리 기능 제공
iii) 결제 완료 건에 대해 셀러 기준 외화 수령 및 정산 이력 관리 기능 제공

(2) 외화 결제수단 연동 기능
i) T/T 방식: 셀러가 등록한 외화 계좌 정보(SWIFT, 은행명, 계좌번호 등)를 바이어에게 표시하고, 입금 완료 후 결제 완료 처리
ii) PayPal 방식: 셀러가 PayPal 계정을 등록하고, 바이어가 결제 시 입금 내역을 확인한 후 결제 완료 처리
iii) 신용카드 방식: 베트남 내 결제 게이트웨이(Napas, OnePay 등)와 연계하여 카드 결제 승인 및 실패 결과를 시스템에 자동 반영
iv) 결제 실패, 취소 시 상태 값 변경 및 이력 관리 기능 포함

(3) 은행 자료 관리 및 외화 보고서 생성
i) 은행(외화 결제 정보)를 등록, 수정, 삭제, 조회할 수 있도록 구성
ii) 외화 결제 내역을 기반으로 월간 단위의 외화 보고서(PDF, CSV) 생성 기능 제공
iii) 보고 항목은 결제수단, 금액, 송금은행, 거래일, 셀러 기업명, 수출 상품명 등 포함

(4) 상품별 판매 및 구매자 결제 이력 관리
i) 상품별 판매 정보에 대해 등록, 수정, 삭제, 목록/상세 조회 기능과 바이어 기준 결제 이력 조회할 수 있는 기능 구현

【기대 효과】
i) 다양한 외화 결제수단을 통해 글로벌 바이어의 접근성을 높이고 거래 성사율을 향상
ii) 결제, 정산, 판매, 이력 관리를 하나의 시스템에서 통합함으로써 운영 효율성 향상
iii) 외화 수취에 대한 보고서 자동화 기능을 통해 플랫폼 운영자의 중앙은행 대응 실무 부담 최소화

3) 국제 물류 및 수출입 통합 관리

◆ 베트남 수출기업이 글로벌 바이어와의 거래 과정에서 상품의 배송, 송장, 수출 신고까지 모든 물류 프로세스를 효율적으로 처리할 수 있도록 지원
◆ 특히 글로벌 3PL 연동을 통해 실시간 배송 상태 확인이 가능하며, 수출통관 연계와 송장·계약 자료 등록 기능을 통해 다양한 셀러 유형에 유연하게 대응할 수 있는 구조로 구성

(1) 배송 및 정산 자료 통합 관리
i) 배송 정보를 등록, 수정, 삭제, 조회할 수 있는 기능 제공
i) 배송 상태(배송대기, 운송중, 배송완료 등)를 기준으로 배송 현황을 모니터링 가능
ii) 송장 정보 관리 기능과 함께 배송비 입력을 포함한 물류비 정산 자료를 통합 관리
iii) 셀러가 자율적으로 계약 정보를 등록·조회하고, 계약 현황을 확인할 수 있도록 기능 제공

(2) 글로벌 3PL 연계 기능
i) DHL과의 연계를 통해 운임 조회, 배송 예약, 송장 발급, 배송 추적 기능을 REST API로 통합 구현

ii) DHL은 베트남 현지에 지사를 운영하고 있으며, 글로벌 API 문서를 제공하여 연동 안정성과 실현 가능성이 높음

(3) 수출통관 및 신고자료 관리

i) 제조사 및 판매자가 입력한 수출입 신고자료를 등록, 수정, 삭제, 목록 및 상세 조회할 수 있는 기능 제공

ii) 수출 신고정보를 기반으로 한 통관 연계 정의 자료를 관리하고, 수출통관 절차의 자동화를 지원

iii) 수출입 신고자료를 디지털 방식으로 통합 관리함으로써 법적 신고 의무이행을 체계적으로 지원

【기대 효과】

i) 국제 특송사(DHL) API 기반의 배송 연동으로 바이어에게 실시간 배송 상태 제공

ii) 배송, 송장, 정산, 계약 정보를 하나의 시스템에서 통합 관리하여 운영 편의성 향상

iii) 수출 신고 자동화로 행정 부담을 줄이고, 실시간 데이터 기반 대응력 강화

iv) DHL 연계를 통해 신뢰도 높은 물류 환경을 조성하고, 해외 바이어 만족도 제고

4) 오픈 API 기반 데이터 연계 서비스

◆ 다양한 국내외 플랫폼에 상품을 등록하고, 주문을 처리해야 하는 번거로움이 발생 가능함.

◆ 이러한 불편을 해소하기 위해 상품, 주문, 쇼핑몰 정보에 대한 Open API를 제공하여, 외부 시스템과의 정보 연동을 가능하도록 지원

◆ 데이터의 중복 입력을 방지하고, 플랫폼 간 상품정보 확산을 유도함으로써 셀러의 디지털 경쟁력을 강화

(1) 판매/주문/쇼핑몰 자료 관리 API 제공

i) 셀러가 고비즈베트남 플랫폼에서 등록한 상품 데이터를 외부 플랫폼(Amazon, Shopee 등)과 연동 가능하도록 상품 등록/수정/삭제 API 제공

ii) 외부 쇼핑몰에서 발생한 주문 정보를 고비즈베트남 주문 시스템으로 자동 수신 및 처리 가능한 주문 수신 API 제공

iii) 연동된 외부 쇼핑몰에 대한 입점 정보 등록, 수정, 삭제가 가능한 쇼핑몰 정보 API 제공

(2) 통계 정보 조회 API 제공

i) 상품별, 셀러별, 쇼핑몰별, 기업별 단위로 판매, 주문, 등록 현황을 조회할 수 있는 통계 API 제공

ii) 일/주/월 단위 필터 등 다양한 조건 기반 현황 필터링 기능 포함

(3) 외부 개발자 연계 지원

i) 외부 플랫폼 및 개발자가 사용할 수 있도록 문서화된 API 명세 제공하고 인증키 기반의 보안 접근 제어

【기대 효과】

i) API 기반 연동을 통해 셀러가 여러 플랫폼에 상품정보를 한 번에 등록·관리할 수 있어, 데이터 중복 작업을 최소화

ii) 주문 정보 수신 자동화로 운영 효율성 향상

iii) 통계 API를 통한 판매 데이터 확보로 판매전략 수립에 필요한 의사결정 기반 제공

5) 관리자용 상담 이력 및 통계 분석 기능

◆ 셀러 및 바이어와의 상담 이력을 관리자가 체계적으로 기록·관리할 수 있는 기능을 제공
◆ 고객 지원 품질을 높이고 운영 신뢰성을 확보
◆ 플랫폼 내 주요 활동 데이터(회원, 인콰이어리, 상품, 바잉오퍼 등)를 기반으로 통계를 제공하여 운영 성과 분석 및 전략 수립 지원

(1) 관리자 상담 이력 관리 기능
i) 셀러 또는 바이어와의 상담 종료 후, 관리자가 상담 내용을 등록하여 이력 관리 가능
ii) 상담 내용은 등록, 수정, 삭제할 수 있으며, 상담 일자, 사용자 정보, 주요 이슈 등 필드 포함
iii) 상담 유형(문의, 기술 지원 등) 및 사용자 유형(셀러/바이어) 기준으로 필터링 및 검색 기능 제공

(2) 관리자 전용 통계 정보 조회 기능
i) 회원 통계: 국내 셀러 및 해외 바이어의 가입 현황을 기간별/지역별로 조회 가능
ii) 인콰이어리 통계: 업체, 카테고리, 대륙별로 수신/발신 인콰이어리 현황을 분석
iii) 상품 및 바잉오퍼 통계: 카테고리 기준 등록상품 수, 바잉오퍼 등록 건수 등의 데이터 제공
iv) 통계 정보는 Excel/CSV 파일로 내보내기 기능을 통해 외부 활용 가능

【기대 효과】
i) 상담 이력의 체계적 관리를 통해 운영 신뢰도 및 응대 품질 향상
ii) 다양한 통계 정보 제공을 통해 관리자 중심의 전략 수립과 운영 정책 개선에 기여
iii) 데이터 기반운영 효율성 제고 및 사용자 중심 플랫폼 서비스 강화

2 바이어-셀러 매칭 시스템

1) 매칭 시스템 개요 및 구현 방향

◆ 바이어-셀러 매칭 시스템은 베트남 현지 수출기업(셀러)과 해외 바이어 간의 효율적 연결을 지원하기 위한 플랫폼의 핵심 기능으로, 바이어 수요 기반의 인바운드 서비스, 셀러 중심의 아웃바운드 서비스, 캠페인 기반의 마케팅 기능을 통합적으로 제공하는 통합형 매칭 서비스임.

(1) 본 시스템은 수출 상담 및 거래의 실질적 연결을 목표로, 거래 과정에서 생성되는 다양한 비정형 수요 및 공급에 대한 문의 정보(Inquiry, RFQ, Buying Offer, Circular Letter 등)를 체계적으로 수집하고, 이를 기반으로 플랫폼 관리자가 적합한 바이어와 셀러를 분석·선별하여 매칭하는 구조로 설계함.

(2) 관리자는 기업별 거래 가능성, 제품 적합도, 수출 준비도, 과거 거래 이력 등 다층적 요소를 고려해 매칭 전략을 수립하고, 이후 상담 결과 및 반응에 대한 사후 피드백과 통계 분석을 통해 매칭 품질을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 이를 통해 플랫폼의 서비스 신뢰도 및 운영 효율성도 함께 제고됨.

(3) 향후 본 사업이 착수되면, 플랫폼 운영을 담당하는 전담 매칭팀이 본 시스템을 직

접 활용하여 바이어-셀러 간의 실질적인 연결과 수출 상담을 지원하게 되며, 이 시스템은 상담부터 사후관리까지 전 과정을 아우르는 현장 중심형 지원 도구로 기능할 것으로 생각됨.

2) 인바운드 매칭 및 사후관리 기능

◆ 인바운드 서비스 관리는 해외 바이어로부터 유입되는 다양한 구매 요청(Inquiry, RFQ, Buying Offer 등)을 체계적으로 접수·관리하고, 해당 수요에 적합한 베트남 셀러를 매칭하여 실질적인 수출 상담으로 연결되도록 지원하는 기능임

◆ 플랫폼 운영자는 인바운드 수요를 분류·검토하고, 셀러 추천 및 상담 결과 모니터링, 사후 피드백까지 전체 매칭 흐름을 주도적으로 운영하며, 이를 통해 수요 기반 맞춤형 매칭 서비스 제공

(1) 인바운드 서비스 접수 및 워크플로우 관리

i) 플랫폼을 통해 자동 유입된 인콰이어리뿐 아니라 외부 채널(이메일, 전시회 등)에서 수집된 수요 정보도 수동 등록 가능

ii) 수요 정보에 대해 담당자 배정, 상태 변경(접수/검토/매칭완료/폐기), 보완 요청, 반려 등의 워크플로우 관리 기능 제공

iii) 각 요청 건에 대한 처리 내역은 메모로 기록되며, 업무 이력으로 통합 관리됨

(2) 인바운드 셀러 매칭 기능

i) 바이어의 제품 제원, 희망 지역 등 조건에 기반한 셀러 검색 및 필터링 기능 제공

ii) 셀러 기업 정보, 제품 등록 정보, 수출 이력 등과 연계하여 매칭 적합도 분석 가능

iii) 매칭된 셀러 정보를 바이어에게 메일로 발송하고, 바이어의 회신 및 열람 여부를 확인할 수 있도록 구성하며, 해당 매칭 이력은 자동 저장되도록 구성

(3) 인바운드 사후관리 기능

i) 거래 성사 또는 미성사 사유(가격 불일치, 제품 부적합, 응답 없음 등)를 등록, 수정 기능 등 구현과 함께, 사유별 통계 수집 기반 마련

ii) 모든 매칭 이력은 통합 조회 가능하며, 주기적인 거래 상태 체크를 위한 후속 알림 기능 제공

【기대 효과】

i) 수요 기반 정밀 매칭을 통해 거래 성사 가능성이 높은 실질적 상담으로 연결

ii) 운영자의 워크플로우 기반 매칭 프로세스를 통해 처리 속도 및 업무 일관성 향상

iii) 셀러의 제품 정보, 과거 매칭 이력, 반응률 등을 고려한 고품질 추천으로 바이어 만족도 증대

iv) 매칭 결과에 대한 체계적인 사후관리로 향후 서비스 품질 개선 및 고객 신뢰도 제고

3) 아웃바운드 매칭 및 마케팅 관리

◆ 아웃바운드 및 마케팅 관리는 거래 성사로 이어지지 못한 베트남 셀러의 제품 정보와 역량을 기반으로, 적합한 해외 바이어를 적극적으로 발굴하고 맞춤형 마케팅 활동을 통해 새로운 거래 기회를 창출하는 기능임

◆ 플랫폼 운영자는 셀러의 제품 현황, 과거 상담 이력, 시장 타겟 조건 등을 바탕으로 타겟 바이어를 선정하고, 이를 기반으로 마케팅 서비스, 캠페인, 개별 제안서 발송 등을 전개하여 매칭 성공률을 높이고 수출 상담으로의 전환 유도함.

(1) 아웃바운드 서비스 관리

i) 거래 미성사 셀러의 Inquiry, RFQ 등을 선별하고, 아웃바운드 마케팅 대상으로 수동 등록하는 기능

ii) 서비스 진행을 위한 담당자 배정, 서비스 상태(승인, 반려, 보완) 변경, 메모 기록 등을 통해 업무 흐름을 체계적으로 관리

(2) 아웃바운드 타겟 마케팅

i) 바이어 데이터베이스에서 검색 및 필터링을 통해 마케팅 대상 바이어를 도출

ii) 셀러 제품에 기반한 Circular Letter 작성, 템플릿 등록 및 관리 기능 제공

iii) 바이어별 발송 조건 설정, 발송 후 열람 및 응답 여부 기록 등을 통해 매칭 현황 파악

(3) 아웃바운드 사후관리

i) 매칭 이력 목록 및 상세 내역을 조회하고, 각 이력에 대한 피드백 및 진행 상태를 업데이트

ii) 매칭 메일 수신 확인, 내용 열람 여부, 재발송 기능을 통해 전달 효과를 추적

iii) 바이어/셀러 정보 연계 조회로 매칭 전체 흐름 통합 관리

(4) 바이어 정보 관리

i) 외부 전시회, 기업 방문 등으로 수집된 바이어 정보를 공공 이마켓플레이스 가입 정보와 통합 관리

ii) 바이어 목록 관리, 신규 등록, 수정 기능 외에 그룹, 출처, 등급 분류 기능 제공

iii) 마케팅 대상 설정 및 유형 분류 기능을 통해 타겟팅 효율성 강화

(5) 바이어 마케팅 관리

i) 마케팅 메시지 작성, 회신 설정, 발송 기간 설정, 테스트 발송, 최종 미리 보기 기능 제공

ii) 발송 현황 및 반응 상태를 실시간으로 모니터링하여 진행 상황을 확인하고 결과 데이터를 기록

(6) 셀러 정보 관리

i) 외부 활동에서 수집된 셀러와 공공 이마켓플레이스 등록 셀러 정보를 통합 관리

ii) 셀러 정보 수정, 신규 등록, 분류 기능 외에 마케팅 이력 및 상품정보 연계 기능 제공

(7) 캠페인 관리

i) 특정 테마, 산업군, 지역 기반으로 셀러를 선별하여 집중 마케팅을 수행할 수 있도록 캠페인 그룹 구성

ii) 캠페인 등록, 수정, 삭제 및 캠페인 이력관리 조회 기능 구현

【기대 효과】

i) 셀러의 제품·역량 기반 타겟 마케팅을 통해 단순 제안 중심이 아닌 전략적 바이어 접근 실현

ii) 체계적인 타겟 마케팅 활동을 통한 효율적인 바이어 접근 및 매칭 성공률 제고

iii) 메일 열람 여부, 응답률, 반응 데이터 기반의 상담 유도 전략 수립 가능

iv) 전략적 캠페인 운영을 통한 베트남 주요 산업 및 품목의 집중 홍보 실현

4) 매칭 현황 및 통계관리

◆ 매칭 현황 및 통계관리 기능은 매칭팀의 인바운드·아웃바운드 매칭 활동 성과와 데이터를 실시간으로 파악하고, 이를 기반으로 효율적인 업무 운영과 전략 수립을 지원하는 기능임.

◆ 매칭 실적, 담당자별 현황, 품목·국가별 트렌드 분석 등을 시각적으로 제공하여 운영의 투명성과 책임성을 높이며, 바이어 및 셀러 데이터베이스의 정량적 분석을 통해 타겟팅과 마케팅 전략의 정교화가 가능함.

(1) 매칭 현황 관리

i) 인바운드 서비스 현황 조회 기능을 통한 인바운드 매칭 성과 파악

ii) 아웃바운드 서비스 현황 조회 기능을 통한 아웃바운드 매칭 성과 파악

iii) 전체 매칭 실적을 기간(월/분기/연도) 단위로 집계하여 성과 추이 분석 가능

iv) 담당자별, 산업별, 국가별 매칭 실적 데이터를 통해 운영 성과 비교 및 업무 분배 최적화

v) 바이어, 셀러 데이터베이스 현황 조회 기능

(2) 통계 정보 관리

i) 인바운드/아웃바운드 각각에 대한 등록 건수, 매칭 성사율 등을 정량적으로 분석

ii) 매칭 실적 통계를 월간/분기/연간 기준으로 시각화하여 매칭팀의 운영 성과를 명확히 제시

iii) 바이어, 셀러 데이터베이스 통계 정보 확인 기능

【기대 효과】

i) 매칭 현황의 실시간 시각화 및 담당자별 성과 확인을 통해 운영 효율성과 책임성 강화

ii) 기간·국가·품목별 매칭 실적 데이터를 통해 트렌드 분석을 하여 베트남 주요 수출 품목에 대한 마케팅 방향성을 수립

5) 사용자 권한 및 부가기능 관리

◆ 사용자 권한 및 부가기능 관리 기능은 바이어-셀러 매칭 시스템의 안정적 운영을 위해 관리자, 매칭 담당자 등의 사용자 계정을 효율적으로 설정하고, 역할에 따른 접근 권한을 세분화하여 시스템 보안성과 업무 효율성을 동시에 확보하는 기능임.

◆ 산업군, 국가군, 제품 분류 등 시스템 전반에서 활용되는 공통코드 체계를 표준화하고, 커뮤니케이션 및 상담 이력 관리를 지원하는 부가기능을 통해 매칭 업무의 연속성과 관리 체계성을 향상.

(1) 사용자 관리

i) 사용자 유형(예: 관리자, 매칭 담당자 등)에 따라 프로필 등록 및 수정 기능 제공

ii) 사용자 검색, 권한 그룹 설정, 카테고리 분류, 업무대행 지정 등 업무 처리 기능 제공

iii) 메일 발송 시 활용되는 개인 서명 관리 기능 포함

(2) 사용자 권한/그룹 관리

i) 열람, 등록, 수정, 삭제 등 기능별 권한을 사용자 또는 그룹 단위로 세분화하여 설정 가능

ii) 그룹 권한 일괄 설정, 사용자별 메뉴 접근 제어, 바이어 정보 접근 제한 등 기능

제공

iii) 권한 설정의 저장, 초기화, 이력 확인 기능을 통해 보안성과 일관성 유지

(3) 공통코드 및 부가기능 관리

i) 셀러 산업군, 바이어 국가군, 제품 분류 등 공통코드를 정의하고 매칭 시스템에 일괄 적용

ii) 코드 항목의 수정, 삭제, 추가가 가능하며 프로그램 단위로 관리 가능

iii) 시스템 운영 공지, 매칭 이슈 등의 공유를 위한 게시판 기능 제공

iv) 상담 중 메모 기능을 활용해 상담 흐름 유지 및 사후관리 연계 가능

【기대 효과】

i) 사용자별 권한 제어 및 메뉴 접근 제한을 통해 시스템 보안성과 책임성 강화

ii) 산업/국가/품목 기준의 사용자 카테고리 분류·지정으로 전문성 기반 매칭 서비스 운영 실현

iii) 표준화된 코드 관리로 데이터 정합성과 시스템 유지보수 효율성 확보

iv) 부가기능(공지, 메모 등)을 활용한 내부 커뮤니케이션 강화 및 매칭 이력의 체계적 관리 실현

3 온라인 전시 시스템

1) 전시 시스템 기능 개요 및 전략

◆ 베트남은 섬유, 농수산물, 목재제품, 전자제품, 수공예품 등 다양한 수출 품목을 보유하고 있으며, 특히 북부 하노이 지역의 전통 공예품, 중부의 특산 식품, 남부 호치민 지역의 현대적 제조업 제품 등 지역별 특성이 뚜렷함.

◆ 온라인 전시 시스템은 이러한 베트남의 경제적 특성과 현지 환경을 고려하여 설계되었으며, 베트남 기업과 해외 바이어 간의 효과적인 연결을 지원.

2) 온라인 전시관 등록 및 관리

◆ 전시관의 기본 정보부터 배너, 기간, 전시 상태 등을 등록하고 관리할 수 있으며, 베트남 특화 제품군과 지역성을 반영한 가상 카테고리 구성을 통해 사용자 맞춤형 탐색 환경을 제공.

◆ 전시관 구성은 단일 콘텐츠 중심이 아닌, 가상 전시관, 오프라인 전시 연계, 영상 기반 전시관(Special) 등 다양한 유형으로 운영되며, 각각의 콘텐츠는 베트남 기업 및 제품 특성과 연계되어 보다 실감 나는 전시 경험을 구현.

(1) 전시관 기본 관리

i) 등록된 전체 전시관 현황을 목록 및 상세 정보를 확인하고, 검색 필터를 적용하여 필요한 전시관을 신속하게 조회할 수 있도록 구성

ii) 신규 전시관 생성 시 필수정보와 초기 콘텐츠 등록을 유도하여 관리자의 작업 효율성을 높이며, 등록된 전시관은 전시 상태(전시/비전시)를 실시간으로 변경 기능을 제공.

(2) 전시관 기본정보 관리

i) 전시관명, 설명, 전시 카테고리 등의 정보를 저장·수정할 수 있도록 구성하며, 관

리자가 효율적으로 유형별(온라인/오프라인/Special) 전시관 기본(공통)정보를 입력·관리할 수 있는 기능 제공.

ii) 베트남 기업의 제품군은 지역별 특산업종이 강한 특성을 보유하고 있으므로, 전시관명 또는 설명에서 지역성과 산업군을 함께 표현할 수 있도록 템플릿 또는 태그 입력기능을 제공.

iii) 예: "하노이 지역 전통 수공예 전문 전시관", "호치민 소비재 수출 유망기업 전시관" 등 명칭 기반으로 셀러-바이어의 직관적인 인지 유도.

(3) 전시관 기간정보 관리

i) 전시관별 운영기간을 지정하여 기간 내 노출이 가능하도록 하며, 설정된 기간에 따라 자동으로 전시 시작·종료 처리가 가능하도록 기능을 제공.

ii) 베트남의 실제 전시회나 지역별 산업주간과 연계하여 가상전시 기간을 설정하는 경우도 고려되며, 오프라인 일정과 병행하여 활용될 수 있음.

iii) 단, 가상 전시관은 상시 노출이 가능하므로, 운영 목적에 따라 기간 설정 기능은 선택적으로 활용할 수 있도록 유연한 설정 방식으로 구성.

(4) 전시관 배너 관리

i) 각 전시관의 대표 이미지(배너)를 등록하고, 이를 통해 방문자의 시각적 인지를 유도할 수 있도록 구성.

ii) 전시관의 성격에 따라 배너 이미지를 유형별(온라인/오프라인/Special)로 분류하고, 해상도 및 용량 제한을 자동 안내하여 로딩 성능을 저해하지 않도록 구성.

(5) 롤링배너 관리

i) 전시관 메인 페이지 내 롤링 배너 영역을 운영하여, 등록된 전시관 간 순차적 노출이 가능하도록 순서를 설정.

ii) 단일 콘텐츠 또는 홍보용 전시관이 우선 노출될 수 있도록 관리자 중심의 순서 조정 기능을 제공.

(6) 온라인 전시관 관리

i) 베트남의 특화 품목을 반영하여, 가상 카테고리를 유연하게 구성·편집할 수 있도록 목록 관리 기능을 제공.

ii) 등록된 전시 제품을 카테고리별로 분류하고, 전시 여부 설정을 통해 사용자가 탐색할 수 있도록 구성.

iii) 베트남 중부 농식품, 북부 공예품, 남부 제조업 제품 등 지역성과 품목 특성을 반영한 구조 설정이 가능하도록 기능 제공.

(7) 오프라인 전시관 관리

i) 실제 개최된 베트남 내 전시회와의 연계 정보를 관리할 수 있도록 URL, 행사명, 개최 장소 등을 등록.

ii) 전시회 공간을 가상 구역 단위로 나누어 관리하고, 전시 제품 목록/상세 조회, 선택 등록/해제를 통한 오프라인 전시관 제품 구성 관리할 수 있도록 구성.

(8) Special 온라인 전시관 관리

i) 영상 기반 전시 콘텐츠를 구성하여 영상 속 북마크 지점을 기준으로 기업 정보를 연결할 수 있도록 구성.

ii) 영상 내 기업의 소개가 시작하는 부분에 북마크를 삽입하고, 해당 지점에 해당하는 기업 정보를 등록함

iii) 실물 전시 참여가 어려운 바이어에게 효과적인 대체 수단으로 작용할 수 있음.

(9) 셀러 콘텐츠 관리

i) 오프라인 전시회 참가 이력이 있으나 공공 이마켓플레이스에 미등록된 기업 정보를 수집하여 등록할 수 있는 기능 제공.

ii) 기업 기본정보와 함께 주요 제품 정보를 수동 등록 가능하며, 이후 온라인 전시관으로 전환하거나 Special 전시 콘텐츠로 연계 가능.

【기대 효과】

i) 직관적인 전시관 관리 인터페이스를 통해 전시 콘텐츠 등록과 품질 유지 업무의 효율성을 높일 수 있음.

ii) 베트남의 지역별 산업 특성과 주요 수출 품목을 반영한 가상 카테고리 구성을 통해 바이어의 제품 탐색 편의성 제고.

iii) 온라인·오프라인·Special 전시관의 통합 관리를 통해 다양한 전시 형태에 대한 경험을 제공함으로써 플랫폼 활용도 및 몰입감 강화.

iv) 오프라인 전시회에만 참가한 미가입 기업의 정보까지 수집·관리함으로써 플랫폼 내 기업 데이터의 포괄성과 대표성을 확보.

v) 전시관 상태의 실시간 변경 및 자동 스케줄 운영 기능을 통해 전시 운영의 유연성과 시스템 효율성 향상.

3) 전시관 미디어 콘텐츠 관리

◆ 전시관 미디어 콘텐츠 관리는 Vietnam Expo, Vietnam Manufacturing Expo 등 베트남 주요 전시회와 관련된 영상 및 시각 자료를 체계적으로 수집·관리하고, 온라인 전시관 내 콘텐츠로 효과적으로 활용하기 위한 기능임.

◆ 특히 바이어가 실물 방문 없이도 전시 기업과 제품에 대한 시청각 정보를 얻을 수 있도록 영상 중심의 정보 제공 방식을 채택하며, 콘텐츠 품질관리, 업로드 효율성, 재생 호환성 확보가 중요하게 고려됨.

◆ 이 기능은 단순 저장소 개념을 넘어서, 실질적인 온라인 전시 효과를 극대화하기 위한 디지털 전시 전략의 핵심 도구로 작동.

(1) 영상 업로드 관리

i) 전시회 또는 개별 기업이 제공한 영상 파일을 관리자 화면에서 업로드할 수 있으며, 업로드 중단/재개 기능을 통해 불안정한 인터넷 환경에서도 안정적으로 등록 가능하도록 구성.

ii) 업로드된 파일은 확장자, 용량, 비트레이트 등의 기준으로 유효성 검사를 진행하여 고품질 콘텐츠만 등록되도록 검증 체계를 운영.

(2) 영상 메타정보 관리

i) 업로드된 영상에서 재생 시간, 해상도, 프레임률, 코덱 등의 메타정보를 자동 추출하며, 이는 사용자별 재생 환경 최적화에 활용.

ii) 메타정보는 콘텐츠 분류, 검색 필터, 재생 옵션 결정 등 시스템 내 다양한 기능과 연계되어 활용되며, 관리자에 의한 수정도 가능하도록 구성.

(3) 영상 파일 관리

i) 등록된 영상 파일은 리스트 형태로 관리되며, 불필요한 파일은 삭제 처리를 통해 저장소를 정리할 수 있음.

ii) 영상 콘텐츠 사용 이력, 미노출 콘텐츠, 과거 콘텐츠 등의 기준에 따라 관리자가 파일 보관 기간 또는 삭제 우선순위를 설정할 수 있도록 지원.

(4) 트랜스코딩 관리

i) 영상 원본을 트랜스코딩 기능을 통해 네트워크 속도나 디바이스에 관계없이 원활한 영상 재생이 가능하도록 구성.

ii) 트랜스코딩 상태 확인 및 완료 여부 모니터링 기능을 제공하여 콘텐츠 등록 완료 시점을 관리자가 명확히 확인할 수 있도록 함.

【기대 효과】

i) 고품질의 전시 영상 콘텐츠 등록 및 메타정보 관리를 통해 바이어가 온라인 전시관에서 시각적으로 직관적인 제품 정보 제공

ii) 영상 업로드, 저장, 트랜스코딩 등의 일련 과정을 체계화함으로써 관리자 입장에서 콘텐츠 등록 및 관리소요 시간 절감.

iii) 영상 콘텐츠 사용 이력 및 파일 저장소를 관리함으로써 불필요한 리소스 낭비를 줄이고, 전체 전시 시스템의 운영 안정성 향상.

iv) 수집된 미디어 콘텐츠를 향후 다른 전시관 또는 마케팅 캠페인과 연계함으로써 콘텐츠 재활용 가능성을 극대화.

4) 전시관 커뮤니케이션 및 미팅 지원 기능

◆ 전시관 커뮤니케이션 및 미팅 관리 기능은 베트남 셀러와 해외 바이어 간의 실시간 또는 비동기 소통을 지원하고, 상담 일정 조율 및 상담 결과를 통합적으로 관리하기 위한 기능.

◆ 특히 언어 장벽 및 시차 문제를 고려한 메시징 기반 소통, 관리자 중심의 미팅 조율, 비대면 환경을 고려한 영상회의 스케줄 관리 등이 포함되며, 전시관 내 상담 프로세스의 완결성을 확보하는 데에 핵심적 역할 수행.

◆ 이를 통해 바이어는 플랫폼상에서 관심 전시관 또는 셀러와 직접 소통할 수 있으며, 관리자는 전체 상담 흐름을 모니터링하고 통합적으로 지원.

(1) 전시관 커뮤니케이션 서비스 관리

i) 각 전시관별 커뮤니케이션 채널의 운영 상태(활성/비활성)를 실시간으로 제어할 수 있는 기능 제공

ii) 관리자는 채널 개설 현황, 메시지 이력 등 현황을 확인하여 부적절한 언행 또는 스팸성 메시지 발생 시 해당 커뮤니케이션 채널을 제재 또는 차단하는 기능 제공.

(2) 바이어-셀러 커뮤니케이션 관리

i) 바이어는 관심 전시관 또는 제품에 대해 메시지 기반의 커뮤니케이션 채널을 생성 가능하며, 대화 내역은 누적 저장

ii) 메시지 송수신 기능 외에 셀러의 응답 가능 여부(상태 표시)를 확인할 수 있도록 하여 불필요한 시도 방지.

(3) 영상 미팅(Video Call) 신청 관리

i) 바이어 또는 셀러가 화상 미팅 요청서를 등록하면 관리자가 이를 승인하거나 조율할 수 있는 기능 제공

ii) 미팅 일정은 관리자가 베트남 근무시간, 국가별 시차를 반영하여 설정

iii) 승인된 미팅은 자동 캘린더 등록 또는 알림 기능과 연계되어 사전 안내 가능

(4) 미팅 일정 관리

i) 관리자가 바이어와 셀러 간의 상담 일정을 수동 등록하거나 수정할 수 있는 기능

제공

ii) 등록된 미팅 목록은 전시관 단위로 구분되며, 일정 변경 시 알림 제공

iii) 확정된 일정은 바이어·셀러 양측이 확인할 수 있으며, 회의 링크도 함께 관리 가능

(5) 상담 기록 및 이력 관리

i) 상담 전후 기록을 통합적으로 저장하고, 회의록 또는 비고 메모를 등록할 수 있어 상담 기록 등의 이력 확인이 가능하여 후속 상담에 활용 가능.

【기대 효과】

i) 시간과 장소 제약 없이 바이어와 셀러 간 상담이 가능해져, 플랫폼 기반 비즈니스 성사 가능성 극대화

ii) 텍스트 채팅, 화상 미팅, 알림 및 스케줄링 등 다양한 소통 채널을 제공함으로써 사용자의 접근성과 만족도를 향상

iii) 관리자 중심의 일정 조율과 상담 이력 통합 관리를 통해 전체 커뮤니케이션 프로세스의 품질과 운영 효율성을 확보 가능

iv) 시차, 언어 장벽 등 물리적 한계를 영상미팅(Video Call)으로 보완함으로써, 실질적인 거래 전환을 유도하는 데 기여

iv) 상담 이력 및 기록의 누적 관리를 통해 향후 후속 상담, 정책 수립 등 다방면의 활용이 가능

5) 전시관 게시판 및 즐겨찾기 관리

◆ 전시관 게시판 및 즐겨찾기 기능은 전시관 내 공지사항, 제품 소식 등 다양한 정보를 체계적으로 공유하고, 바이어의 관심도에 기반한 셀러-바이어 연결 가능성을 확장하기 위한 기능.

◆ 관리자는 각 전시관 별 공지 및 안내사항을 통합 관리하며, 바이어는 관심 제품에 즐겨찾기를 설정함으로써 선호 기업에 대한 지속적인 접근 가능

◆ 이를 통해 셀러는 타겟 바이어군을 식별하고 맞춤형 제안을 할 수 있으며, 플랫폼 전반의 유저 활동 데이터를 기반으로 마케팅 전략에도 활용 가능.

(1) 전시관 게시판 관리

i) 전시관별 공지사항, 전시 제품 업데이트 등 주요 내용을 게시판 형태로 안내할 수 있도록 구성.

ii) 게시글은 등록/수정/삭제가 가능하며, 주요 전시 관련 문서도 첨부파일로 제공 가능.

iii) 전시관 유형(온라인/오프라인/Special)별로 구분 게시판을 구성하여 콘텐츠 접근성 향상.

(2) 바이어 즐겨찾기 관리

i) 바이어는 관심 있는 전시관 또는 제품에 대해 즐겨찾기를 설정할 수 있으며, 등록/삭제 기능과 함께 즐겨찾기 목록을 개인화된 화면에서 관리할 수 있는 기능 제공

(3) 셀러 즐겨찾기 현황 관리

i) 셀러는 본인 기업 또는 제품을 즐겨찾기한 바이어 목록을 확인할 수 있으며, 이를 바탕으로 타겟 바이어 풀을 구성할 수 있는 기능 제공

ii) 관심 바이어를 대상으로 Circular Letter(제안서, 홍보자료 등)를 발송할 수 있으며, 바이어 관심도 데이터 활용을 통한 타겟 마케팅 기회 창출

【기대 효과】

i) 관리자는 전시관별 주요 안내사항 및 전시 콘텐츠를 체계적으로 제공할 수 있어 전시 운영의 일관성과 효율성 향상

ii) 바이어는 선호 기업이나 제품을 즐겨찾기로 등록하여 반복 방문 및 비교 탐색을 용이하게 할 수 있음

iii) 셀러는 관심 바이어의 현황을 파악하고, 이를 기반으로 타겟 마케팅 및 상담 제안 전략을 수립할 수 있음

iv) 정보 게시 기능과 즐겨찾기 기반 연결 기능 등을 통해 플랫폼 전반의 콘텐츠 전달력과 매칭 연결 가능성 제고

6) 오프라인 전시회 연계 운영 및 지원

◆ 오프라인 전시회 및 지원 관리 기능은 플랫폼이 직접 주관하거나 연계된 오프라인 전시회에 대한 참가자 관리, 전시장 정보 제공, 방문 전·중·후에 필요한 각종 지원 정보를 체계적으로 제공하는 기능임.

◆ 온라인 전시관과의 연계 운영을 통해 참여자(바이어/셀러)의 전시 경험을 확장하며, 사전 정보 제공, 참가 신청, 현장 정보 확인, 방문 지원 안내 등을 통합적으로 구성함으로써 실질적인 전시 참여율 제고와 운영 효율화를 동시에 실현.

(1) 전시회 참가 관리

i) 바이어 및 셀러가 오프라인 전시회 참가 신청서를 온라인상에서 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 구성

ii) 신청 현황은 전시회별로 목록화되며, 관리자는 이를 통해 참가자 추이 및 모집 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 기능 제공.

iii) 사용자 유형에 따라 인터페이스 언어 및 입력 항목이 구분되며, 바이어는 영어 기반, 셀러는 베트남어 기반 화면으로 접근 가능

(2) 전시장 관련 콘텐츠 관리

i) 전시장에 대한 기본정보(행사명, 위치, 규모 등)를 등록하고, 이미지를 활용한 시각적 정보 제공할 수 있도록 기능 제공

ii) 전시장 내 주요 구역, 동선, 부스 배치 정보는 디지털 콘텐츠(이미지, 영상 등)로 등록·관리되며, 참여기업 정보와 연동됨

iii) 필요 시 전시장 분위기 또는 테마를 반영한 배경 음원도 등록 가능하며, 전시회 성격에 따라 선택적 활용 가능

(3) 바이어 전시장 이용 지원

i) 바이어는 전시장 정보 확인 외에도, 온라인상에서 전시장 뷰어를 실행하여 간접 체험 가능

ii) 전시장 내 위치 정보를 기반으로 해당 구역에 배정된 셀러 기업과 제품 정보를 함께 확인 가능

iii) 특히 사전 매칭된 셀러가 있는 경우, 해당 기업의 부스 위치 안내 기능 제공

(4) 오프라인 지원 정보 관리

i) 전시회 참석을 위해 베트남을 방문하는 해외 바이어를 위해, 숙박(호텔), 교통, 비자 안내 등 필수정보를 별도 모듈로 구성.

ii) 관리자 화면을 통해 호텔 등록, 편의시설 안내, 접근 경로 정보 등을 제공하며, 주요 도시(하노이/호치민 등)별 분류 제공.

iii) 비자 발급 요건, 신청 방법, 소요 시간 등의 정보를 정기적으로 업데이트하여 바이어 편의 지원.

【기대 효과】

i) 오프라인 전시 정보와 온라인 시스템 간의 통합 운영을 통해 바이어·셀러 모두의 전시 경험을 확장하고 플랫폼의 기능 범위를 넓힐 수 있음.

ii) 전시장 뷰어 및 콘텐츠 기반 가상 체험 기능을 통해 실제 참가가 어려운 바이어에게도 정보 접근성을 제공하고, 사전 관심도 유도 가능.

iii) 참가 신청에서 부스 안내, 지원 정보 제공까지의 흐름을 일원화함으로써 전시회 운영자의 업무 효율 향상.

iv) 호텔, 비자, 교통 등 필수정보를 사전에 제공함으로써 해외 바이어의 실제 방문율을 제고하고, 행사 참가 장벽을 실질적으로 낮출 수 있음.

7) 오프라인 세미나 신청 및 콘텐츠 관리

◆ 오프라인 세미나 관리 기능은 자체 전시회와 연계되어 운영되는 세미나에 대한 참가 신청, 평가, 자료 관리를 체계적으로 지원하며, 해당 콘텐츠를 온라인으로 확장할 수 있도록 구성된 기능임.

◆ 오프라인 현장에서 제공되는 실무 중심의 강연, 설명회, 교육 콘텐츠를 기반으로, 참가자의 피드백을 수집하고 지식 콘텐츠로 재가공하여 플랫폼 자산화하는 것을 주요 목적으로 함.

◆ 또한, 현장 참가 외에도 비대면 콘텐츠 활용 기능을 제공함으로써 참여 채널을 다변화하고 세미나 운영의 지속 가능성을 높이는 구조로 설계됨.

(1) 세미나 신청 및 참가자 관리

i) 참가자는 세미나 신청 화면을 통해 참가 등록 또는 취소가 가능하며, 신청 상태는 개인별로 실시간 확인 가능.

ii) 세미나 리스트 및 상세 정보(강연자, 시간, 장소 등)를 조회 가능.

iii) 현장 참가가 어려운 경우, 사전 녹화 영상 제공을 통해 비대면 참가 방식도 선택 가능하도록 구성.

(2) 세미나 평가 관리

i) 세미나 종료 후 참가자는 별점 또는 코멘트 기반의 평가를 등록할 수 있으며, 작성한 평가는 조회 및 수정·삭제 가능.

ii) 세미나별 전체 평가 목록 및 평균 평점을 통해 세미나의 전반적 만족도 수준을 확인할 수 있으며, 향후 개선 참고 자료로 활용되며, 부적절한 언어 또는 무성의한 평가는 관리자 권한으로 삭제 또는 수정 가능.

(3) 세미나 자료 관리

i) 세미나 개요, 주제, 연사 정보 등 기본 콘텐츠를 등록·수정·삭제할 수 있으며, 전시관별로 분류 가능.

ii) 녹화된 세미나 영상을 플랫폼에 등록하여 스트리밍 제공이 가능하며, 세미나 발표자료, 배포 문서 등은 업로드 후 참여자에게 공유 가능.

iii) 일정 기간 이후에도 반복 시청이 가능하도록 콘텐츠 라이브러리화하여 플랫폼 자산으로 활용 가능.

【기대 효과】

i) 오프라인 세미나 콘텐츠를 온라인으로 확장함으로써 시공간 제약 없이 다양한 참여자에게 정보 제공 가능

ii) 참가자의 실시간 신청 및 평가 등록을 통해 세미나 운영 품질을 수치화하고, 지속적인 콘텐츠 개선의 근거자료 활용 가능

iii) 축적된 세미나 영상 및 자료 콘텐츠를 통해 기업 및 바이어 대상 교육 콘텐츠 자산화를 실현할 수 있으며, 향후 반복 활용 가능성 확보.

iii) 세미나의 비대면 참가 지원 및 자료 공유 기능을 통해 참가자 경험을 다양화하고, 플랫폼 기반 학습 및 정보 접근성 증대.

4 기술 적용 방안

1) 기술 적용 개요

(1) 클라우드 네이티브 아키텍처를 기반으로 안정적이고 확장 가능한 시스템을 구축 제안하는 기술 스택은 업계 표준 준수하며 시스템의 유지보수성과 확장성을 극대화

2) 개발환경 및 인프라 구성

(1) CI/CD 파이프라인을 구축하여 코드 변경사항 발생 시 자동으로 빌드 및 배포 과정을 수행하여 개발 생산성을 높이고 안정적인 배포를 보장

3) 빌드 및 의존성 관리

(1) Maven은 프로젝트의 빌드 및 의존성 관리를 체계적으로 수행하여 프로젝트 구조의 일관성을 유지하고, 라이브러리 충돌 없이 안정적인 백엔드 환경을 유지

4) 백엔드 아키텍처

(1) Spring Boot 프레임워크를 사용하여 견고하고 확장 가능한 벡엔드 시스템을 구축 표준화된 API설계 원칙을 준수하는 REST API 구현

(2) JPA (Java Persistence API)를 통해 데이터베이스 접근의 추상화를 실현하며, 객체지향적인 방식으로 데이터 처리를 할 수 있어 개발 생산성 및 유지 보수성 향상

〈레이어드 아키텍처〉

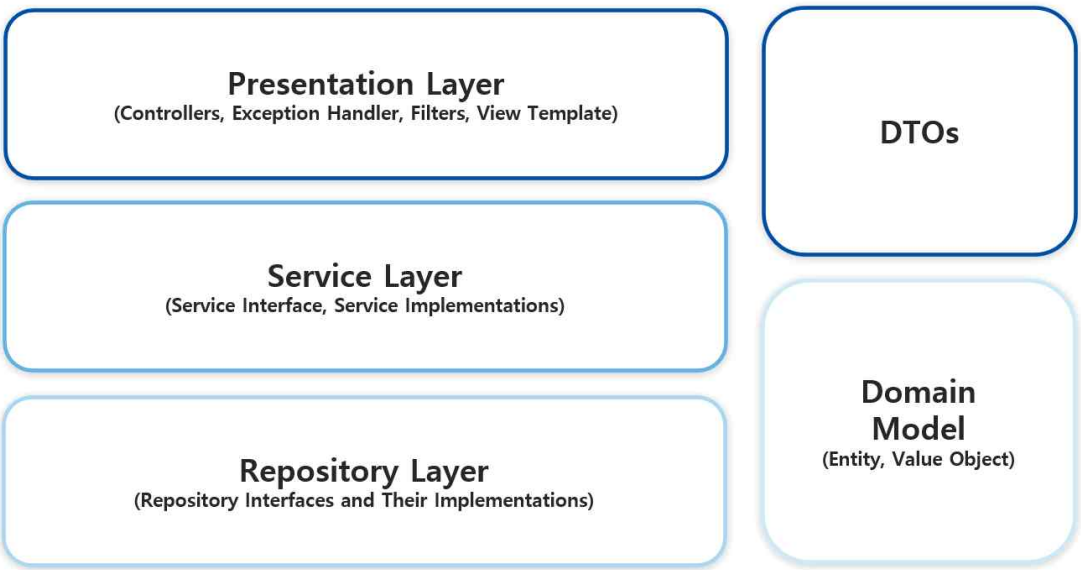

5) 프론트엔드 아키텍처

(1) 서버 사이드 렌더링, 정적 사이트 생성(SSR/SSG) 지원으로 SEO 친화적인 웹 애플리케이션을 구축

〈프론트엔드 주요기술〉

구분	주요기술	세부내용	적용 이점
프레임워크	Next.js	• 서버 사이드 렌더링(SSR) • 정적 사이트 생성(SSG) • 클라이언트 사이드 라우팅	• 초기 로딩 속도 향상 • SEO 최적화
스타일링	Tailwind CSS	• 반응형 디자인 • 테마지원	• 빠른 UI 개발 • 일관된 디자인 시스템 • 다양한 디바이스 지원
인증	JWT	• 토큰 기반 인증 • 권한 기반 접근 제어	• XSS 공격 방지 • 세분화 된 접근 제어
개발도구	TypeScript	• 정적 타입 검사 • 인터페이스 정의 • 타입 추론	• 런타임 오류 감소 • 개발자 생산성 향상
배포	Docker/CI/CD	• 컨테이너화 • 자동화된 빌드/배포 • 환경별 설정 분리 • 버전 관리	• 일괄된 실행 환경 • 배포 프로세스 자동화 • 환경별 최적화 • 롤백 용이성

5 성능 준수 방안

1) 성능 준수 방안 개요

(1) 사용자에게 안정적이고 효율적인 서비스를 제공하기 위한 성능 최적화 및 모니터링 방안 제시 및 운영

2) 성능 요건 일반사항

(1) 시스템 성능 고려 개발 방안

i) 캐싱 전략: Redis를 활용한 데이터 캐싱으로 반복적 데이터베이스 조회 최소화

ii) JPA 튜닝(fetch join, EntityGraph 등)

(2) 안정적 서비스 운영

i) 자동화된 헬스체크: 시스템 주요 구성요소의 상태를 자동으로 점검하는 헬스체크 시스템 구축

(3) 아키텍처별 성능 최적화

i) 응용 아키텍처: 대용량 처리 작업의 비동기 처리를 통한 응답성 향상

ii) 데이터베이스: 쿼리 패턴 분석을 통한 최적의 인덱스 설계, 데이터베이스 커넥션 효율적 관리 (HikariCP 최적화)

(4) 데이터 형식오류 응답시간

〈3초 이내 오류 제시 방안〉

구분	적용기술	세부내용	기대 효과
클라이언트	React Hook Form	• 입력 필드별 즉각적인 피드백 • 폼 제출 전 종합 검증	• 서버 요청 전 오류 사전 검출 • 사용자 즉각적 피드백
서버	Bean Validation	• 반복 검증 최적화	• 일괄된 검증 로직 적용

(5) 지연 작업 조치 방안

〈지연 메시지 및 진행 상황 표시〉

구분	적용기술	세부내용	기대 효과
진행 상황 표시 UI	React 모달 컴포넌트	• 모달 팝업 또를 프로그레스 바 • 단계별 진행 상태 표기	• 사용자 불안감 감소 • 작업 투명성 향상
사용자 친화적 메시지	상황별 메시지 템플릿 사용자 행동 유도 디자인	• 작업 내용 및 진행 상황 안내 • 대안 작업 제안	• 사용자 경험 개선 • 사용자 만족도 향상

(6) 동시 사용자지원 방안

i) 서버 아키텍처 최적화: 로드 밸런싱을 통한 부하 분산

ii) 리소스 최적화: 효율적인 자원 관리, 시스템 한계치 분석 및 모니터링, 자원 사용 최적화

iii) 데이터베이스: 쿼리 최적화 및 캐싱

iv) 성능테스트: 목표 사용자 수의 150%(300명) 이상으로 부하 테스트 시행, 지속적인 성능 모니터링 및 튜닝

(7) 평균 처리시간 및 동시처리 방안

〈최대 부하 상태에서 초당 50건 처리 방안〉

구분	적용기술	세부내용	기대 효과
부하 분산 전략	트래픽 쉐이핑	• 리소스 우선순위 조정	• 핵심 서비스 안정성 유지
자원 할당 최적화	리소스 할당 정책	• 컴퓨팅 리소스 확장	• 리소스 효율적 사용
비동기 처리 확대	• CompletableFuture • 작업 스케줄링	• 비동기 처리 확대 • 작업 큐잉 시스템	• 응답성 유지 • 부하 피크 완화

(8) CPU 사용률

i) 자원 모니터링: 실시간 CPU 사용률 추이 분석

ii) 성능 최적화: 코드 및 알고리즘 최적화, 불필요한 프로세스 제거, 캐싱 전략 적용

iii) 자원 확장 계획: 사용률 기준 자동 확장 정책, 주기적 용량 계획 수립, 부하 예측 및 사전 대응

6 인터페이스 방안

1) 사용자인터페이스 방안

(1) 콘텐츠 정보 제공방안

i) 서식 작성 가이드: 서식 작성 시 필요한 정보와 예시를 제공하여 사용자가 쉽게 작성할 수 있도록 지원

ii) 도움말 아이콘: 주요 항목 옆에 도움말 아이콘을 배치하여 마우스 오버 시 상세설명 제공

iii) 단계별 안내: 복잡한 서식 작성 시 단계별로 안내하여 사용자의 이해도 향상

iv) 관련 법규 및 정보 링크: 관련 법규나 추가 정보에 대한 링크 제공

(2) 콘텐츠 구성 최적화

i) 일관된 레이아웃: 전체 사이트에 일관된 레이아웃을 적용하여 사용자 학습 부담 최소화

ii) 시각적 계층 구조: 중요도에 따른 시각적 계층 구조 적용으로 내용의 흐름 명확화

iii) 그룹화 및 분류: 관련 정보의 그룹화 및 논리적 분류를 통한 정보 이해도 향상

iv) 여백 활용: 적절한 여백을 활용하여 콘텐츠 가독성 향상

(3) 기능 접근성 향상

i) 직관적인 메뉴 구조: 사용자 관점에서 논리적이고 직관적인 메뉴 구조 설계

ii) 검색 기능 강화: 키워드, 카테고리, 태그 등 다양한 검색 방식 제공

iii) 자주 사용하는 기능: 사용 빈도가 높은 기능을 쉽게 접근할 수 있도록 배치

(4) 직관적 인터페이스 구현

i) 일관된 디자인 시스템: 색상, 폰트, 아이콘 등 디자인 요소의 일관성 유지

ii) 시각적 피드백: 사용자 액션에 대한 즉각적인 시각적 피드백 제공

iii) 명확한 행동 유도: 버튼, 링크 등 상호작용 요소의 명확한 시각적 표현

iv) 적절한 애니메이션: 사용자 이해를 돕는 직관적이고 간결한 애니메이션 적용

2) 사이트 구성 및 디자인 설계

(1) 플랫폼 독립적 사용자 환경

i) 반응형 웹 디자인: 다양한 디바이스(PC/모바일) 환경에 최적화된 반응형 디자인 적용

ii) 크로스 브라우저 호환성: 주요 브라우저(Chrome, Firefox, Safari, Edge 등) 호환성 보장

iii) 표준 기술 사용: HTML5, CSS3, JavaScript 등 웹 표준 기술 사용

iv) 사용자 중심 설계: 사용자 행동 패턴 분석을 통한 최적의 레이아웃 설계

v) 스크롤 최적화: 불필요한 스크롤을 최소화하고 중요 콘텐츠를 상단에 배치

vi) 색상 대비 최적화: 텍스트와 배경 간 적절한 대비로 가독성 확보

vii) 일관된 색상 시스템: 기능별 일관된 색상 적용으로 사용자 이해도 향상

viii) 범용적 아이콘: 널리 사용되는 표준 아이콘 활용으로 직관성 확보

ix) 일관된 스타일: 전체 사이트에 일관된 아이콘 및 버튼 스타일 적용

x) 상태 피드백: 버튼 상태(기본, 호버, 활성화, 비활성화)를 명확히 구분

3) 사용단말을 고려한 화면 사이즈

(1) 반응형 웹 구현

i) 모바일 대응 설계: 모바일 환경을 고려한 디자인 설계

ii) 콘텐츠 우선순위 조정: 화면 크기별 콘텐츠 표시 우선순위 조정

(2) 사용자 환경별 최적화

i) 바이어 페이지: 모바일 및 PC 환경 모두 지원하는 완전 반응형 웹으로 구현

ii) 셀러 페이지: PC 환경에 최적화된 인터페이스 구현

iii) 어드민 페이지: 데이터 관리와 분석에 최적화된 PC 중심 인터페이스 구현

iv) 해상도별 테스트: 다양한 해상도에서의 철저한 테스트 진행

(3) 네비게이션 구성

i) 컨텍스트 메뉴: 사용자 위치와 작업에 따른 컨텍스트 메뉴 제공

ii) 검색 기능 강화: 디바이스별 최적화된 검색 인터페이스 제공

(4) 스크린 사이즈

i) 상대적 단위 사용: 픽셀(px) 대신 rem, em, % 등 상대적 단위 사용

ii) 최소/최대 값 설정: min-width, max-width 등을 활용한 한계 설정

iii) CSS 변수 활용: 재사용 가능한 CSS 변수로 일관성 유지

(5) 수평 스크롤 제한

i) 콘텐츠 래핑: 화면 너비에 맞춰 자동으로 줄바꿈되는 콘텐츠 설계

ii) 테이블 최적화: 반응형 테이블 구현으로 모바일 환경에서도 데이터 접근성 보장

(6) 사용자 활동 확인 메시지

i) 작업 완료 알림: 데이터 저장, 삭제, 수정 등 작업 완료 시 명확한 알림 제공

ii) 진행 상태 표시: 장시간 소요되는 작업의 진행 상태 표시

iii) 성공/실패 구분: 작업 결과에 따른 시각적으로 구분된 메시지 제공

iv) 사용자 친화적 문구: 기술적 용어보다 사용자가 이해하기 쉬운 문구 사용

3) 확인 메시지 제공방안

(1) 사용자 행동 확인 메시지

i) 일관된 메시지 패턴: 유사한 상황에 일관된 메시지 패턴 적용

ii) 접근성 보장: 키보드 탐색 및 스크린 리더 지원

iii) 반응형 대응: 다양한 화면 크기에 대응하는 메시지 UI

iv) 확인/취소 옵션: 중요 작업 수행 전 확인/취소 옵션 제공

v) 결과 예측 정보: 해당 행동의 결과에 대한 정보 제공

7 데이터 관리 방안

1) 데이터 관리 개요

(1) 체계적인 데이터 표준 수립, 효율적인 데이터 구조 설계

(2) 데이터 품질관리 등을 통해 고품질의 데이터 기반 시스템을 구축하여 안정적이고 효율적인 서비스를 제공

2) 데이터 표준 개선 및 정비

(1) 데이터 표준항목 식별 프로세스

i) 요구사항 분석 단계에서 필요한 데이터 항목 식별

ii) 기존 표준사전과 비교하여 신규/변경 항목 도출

iii) 식별된 항목에 대한 명명규칙 적용 및 정의

iv) 표준사전 반영 및 관리

데이터 항목 식별 › 신규/변경 항목 도출 › 명명규칙 적용 및 정의 › 표준사전 반영 및 관리

(2) 표준 준수 식별 방안

i) 표준사전 내 상위표준 출처 항목 추가

ii) 표준 준수 여부 식별 플래그 관리

iii) 준수 표준과 미준수 표준 구분 관리

iv) 상위표준 변경에 따른 영향도 분석 체계 구축

3) 데이터 표준 관리

(1) 데이터 표준 관리체계

i) 표준 관리 조직

담당 역할	세부항목	내용
데이터 아키텍트	데이터 표준 관리 책임자	• 데이터 표준 정책 수립, 표준 관리 총괄
도메인 전문가	도메인별 표준 관리 담당자	• 업무 도메인별 표준 관리, 표준 요청 검토
관련 이해관계자	표준 검토 위원회	• 표준 승인 및 변경 검토

ii) 표준 관리 프로세스

표준 요청 › 검토 › 승인 › 적용 › 검증 프로세스 정립

(2) 데이터 구조 설계

i) 표준화된 설계 방법론: 정보공학 방법론 기반 데이터 모델링, 정규화 원칙 준수(비즈니스 요구에 따라 반정규화 허용), 엔티티 유형 분류 및 명명 규칙 정의, 관계 유형별 표현 방식 표준화

ii) 데이터 설계 표준: 데이터 분류체계 정의, 엔티티 및 속성 명명 규칙 표준화, DB 객체 명명 규칙 표준화, 인덱스, 제약조건 등 설계 표준 정의

iii) 성능 최적화 고려사항: 대용량 데이터 처리를 위한 설계 원칙, 인덱스 설계 가이드라인, 캐싱 전략 및 적용 기준지원을 위한 설계 고려, 데이터 증가에 따른 확장 방안 포함

(3) 데이터 주제영역 정의 및 모델 설계

i) 데이터 주제영역 정의: 주제영역별 엔티티 그룹 정의, 주제영역 간 관계 및 인터페이스 정의, 공통 데이터 영역 식별 및 관리

ii) 개념 데이터 모델 설계: 핵심 비즈니스 개체 및 관계 정의, 주요 비즈니스 규칙 반영, 이해관계자 관점의 개념적 표현, 주제영역별 모델 통합 및 조정

iii) 논리 데이터 모델 설계: 상세 엔티티 및 속성 정의, 정규화를 통한 데이터 중복 최소화, 식별자 및 관계 상세 정의, 업무규칙 및 제약조건 반영

(4) 유연한 데이터 구조 설계

i) 유연성 확보 전략: 공통코드 체계 도입으로 확장성 확보, 메타데이터 기반 동적 구조 설계, 표준 인터페이스 정의를 통한 변경 영향 최소화

ii) 변경 관리 용이성: 모듈화된 데이터 구조 설계, 느슨한 결합(Loose Coupling) 원칙 적용, 데이터 계층 분리(운영/통계/분석 등)

(5) 데이터 구조 검증

i) 검증 절차 및 방법: 체크리스트 기반 구조화된 검증, 사용 사례(Use Case) 기반 적합성 검증, 모델 시뮬레이션 및 프로토타이핑

ii) 검증 결과 관리: 검증 결과 문서화 및 공유, 이슈 및 개선사항 등록 및 추적, 변경 적용 및 재검증 프로세스, 최종 승인 및 확정 절차

(6) 데이터 구조관리

i) 형상관리 도구 활용: 데이터 모델 형상관리 도구 도입, DDL 스크립트 버전 관리, 변경사항 추적 및 비교 기능 활용, 협업 및 변경 충돌 관리

ii) 문서화 및 커뮤니케이션: 구조 변경 문서화 표준 수립, 변경 내용 공유 및 교육 방안, 정기적 구조 현황 보고체계, 이해관계자 의견수렴 및 반영 절차

(7) 데이터값 검증

i) 진단 계획 수립: 진단 범위 정의(전체 또는 주요 데이터 영역), 진단 시기 및 주기 설정, 진단 방법 및 도구 선정, 담당자 및 역할 정의

ii) 진단 방법론: 공공데이터 품질관리 매뉴얼 기반 진단, 데이터 프로파일링 기법 적용, 통계적 분석 방법 활용, 규칙 기반 검증 방식 적용

iii) 진단 범위 및 우선순위: 핵심 업무 데이터 우선 진단, 외부 연계 데이터 중점 검증, 사용자 피드백 기반 문제 영역 식별, 리스크 기반 진단 우선순위 설정

(8) 데이터 품질관리 체계

i) 운영 단계까지 지속 가능한 데이터 관리 조직과 역할을 정의

ii) 데이터 표준, 구조, 값 등 핵심요소의 추가/변경/삭제 절차를 수립하고, 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 관리기준을 명확히 제시

iii) 연계 데이터의 정합성 유지 및 관리 방안을 수립

(9) 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계

i) 공공데이터 개방 정책에 따라, 수원기관 및 수원국 데이터 관리 부처와 협의하여 데이터 개방 여부를 결정하고, 개방이 필요한 데이터는 베트남 데이터 포털 등에서 공개될 수 있도록 설계 및 구축

ii) 메타데이터 관리체계: 메타데이터 항목 정의 및 표준화, 메타데이터 수집 및 등록 절차, 메타데이터 품질관리 방안, 메타데이터 갱신 프로세스

iii) 메타데이터 개방 형태: 파일 데이터 개방(CSV, Excel, JSON 등), API 기반 데이터 서비스 제공

8 테스트 수행방안

1) 테스트 환경 구축 개요

(1) 테스트 환경은 실제 운영 환경과 분리된 독립적인 서버에 구축하여 운영 환경에 영향을 주지 않으면서 시스템의 모든 기능을 테스트

2) 테스트 환경 구축 전략

(1) 인프라 아키텍쳐

i) Kubernetes Cluster 분리 구성

ii) Docker 컨테이너 기반 환경 표준화

(2) CI/CD 연동

i) Jenkins Pipeline을 구축하여 테스트 환경 자동 연계

ii) GitHub Actions 워크플로우별 환경 변수 분리 관리

〈테스트 관리 도구〉

도구명	용도	적용 영역
JIRA	테스트 케이스 및 결함 관리	전체 테스트 과정
JUnit	단위 테스트 자동화	개발자 테스트
JMeter	성능/부하 테스트	성능 테스트

3) 단위 테스트

(1) 단위 테스트 범위

i) 개별 모듈, 클래스, 메서드 수준의 기능 테스트, API 호출 테스트, 데이터 처리 로직 테스트

(2) 단위 테스트 방법

i) 테스트 시나리오 작성: 각 기능별 정상 케이스 시나리오, 예외 및 경계 케이스 시나리오

3) 통합 테스트

(1) 통합 테스트 범위

i) 모듈 간 인터페이스 테스트, 시스템 내부 컴포넌트 간 연동 테스트, 외부 시스템과의 인터페이스 테스트

(2) 통합 테스트 방법

i) 통합 전략: 점진적 통합 방식(Incremental Integration) 적용, 상향식(Bottom-Up) 및 하향식(Top-Down) 통합 병행

ii) 통합 테스트 시나리오: 업무 프로세스 기반 End-to-End 시나리오, 사용자 권한별 시나리오, 예외 상황 시나리오

(2) 통합 테스트 수행절차



3) 성능 테스트

(1) 성능 테스트 목표

항목	목표치	측정 방법
응답시간	3초 이내 (온라인 조회)	사용자 화면 로딩 완료 시간
처리량	시간당 1,000건 이상	단위 시간당 트랜잭션 처리량
동시 사용자	200명	가상 사용자 생성 부하 테스트
CPU 사용률	피크 시 90% 이하	서버 모니터링

(2) 성능개선 방안

i) DB 튜닝: 인덱스 최적화, 쿼리 최적화

ii) 애플리케이션 튜닝: 코드 최적화, 캐시 적용, 비동기 처리 적용

iii) 인프라 튜닝: 서버 자원 최적화, 로드 밸런싱 적용

4) 인수 테스트

(1) 인수 테스트 준비

i) 요구사항별 테스트 매트릭스 작성

ii) 인수 테스트 시나리오 개발

iii) 테스트 데이터 준비

(2) 인수 테스트 계획

i) 인수 테스트 일정 및 참여자 확정

ii) 테스트 환경 및 데이터 준비 확인

iii) 테스트 시나리오 및 케이스 검토

(3) 인수 테스트 수행절차

i) 테스트 환경 셋업 및 검증

ii) 요구사항별 테스트 실행

iii) 테스트 결과 기록 및 보고

iv) 결함 조치 및 재테스트

v) 최종 승인 요청

9 제약사항

1) 시스템 개발 제약사항 준수 방안

(1) 개발 보안 가이드 이해 및 적용

i) 베트남 정보통신부가 발행한 소프트웨어 개발보안 가이드(25/2018/TT-BTTTT) 전문 번역 및 분석

ii) 가이드의 주요 보안 요구사항을 개발 프로세스 전반에 반영

(2) 라이센스 관리 방안

i) 상용 소프트웨어의 정품 라이선스 확보 및 오픈소스 소프트웨어 라이센스 준수

2) 전자정부프레임워크 적용 방안

(1) 협의 기반 표준 프레임워크 적용

i) 베트남 수원기관과의 초기 협의를 통한 프레임워크 요구사항 파악하여 협의를 통해 결정된 프레임워크의 세부 적용 범위 및 방식 확정

3) 다양한 디바이스 환경지원 방안

(1) 공통컴포넌트 개발표준 준수

i) 공통컴포넌트 설계 및 개발표준 정의

ii) 재사용 가능한 공통컴포넌트 라이브러리 구축

(2) 멀티 디바이스 지원 기술 적용

i) 반응형 웹 디자인(Responsive Web Design) 적용

ii) 크로스 브라우징(Cross Browsing) 지원

iii) 다양한 화면 해상도 및 입력 방식 대응

(3) 시스템 확장성 확보 방안

i) 마이크로서비스 아키텍처 적용 검토

ii) 컨테이너 기반 배포 환경 구성 검토

iii) API 기반 서비스 연계 체계 구축

4) 표준 제약사항

(1) 베트남 현지 법규 및 표준 준수 체계

i) 베트남 정보통신부 소프트웨어 개발보안 가이드(25/2018/TT-BTTTT) 준수 방안 수립

ii) 사업 수행 및 유지관리 전 기간에 걸친 법규 준수 모니터링 체계 구축

iii) 수원국의 법률 및 규정 변경사항 추적 및 분석 프로세스 정립

나. 수출플랫폼 안정화 및 활성화

1 온라인수출플랫폼 운영센터 운영 방안

1) 온라인수출플랫폼 운영센터 운영 방안

◆ 베트남 온라인 수출플랫폼의 안정적 운영과 지속적 고도화를 위해, 개발사는 핵심 기능 단위에 기반한 전문 운영조직을 구축하고, 체계적이고 실행 가능한 운영 프로세스를 설계하여 단계적으로 이행

(1) 운영센터 조직 구성

i) 운영팀 조직 구성

(i) 베트남 온라인 수출플랫폼의 기능별 안정적 운영과 기술적 유지보수를 전담하기 위한 5인 조직의 운영팀을 구성하며, 기획-디자인-운영-개발을 아우르는 기능 중심 직무체계를 기반으로 편성합니다.

(ii) 각 인력은 플랫폼의 핵심 운영 기능을 중심으로 분업된 업무 및 책임을 지며, 일상 운영과 중장기 고도화를 동시에 추진할 수 있는 복합형 운영조직으로 설계합니다.

(iii) 운영팀은 초기에 한국 개발사 중심으로 운영되며, 수원기관 추천 현지 인력 2인 포함 공동운영 체계를 통해 현지화와 역량 이전을 병행합니다.

(iv) 운영팀 구성 및 역할

직책	인원	주요 업무 및 책임
운영팀장	1명	• 플랫폼 운영 총괄 및 기술 방향성 수립

직책	인원	주요 업무 및 책임
		• 시스템 기술 구조 및 운영 전략 관리 • 운영 인력 및 외부 협력 조율, 베트남 정부 및 유관기관 대응 • KPI 기반 성과 평가 및 자원 재배분 의사결정 수행
기획 담당자	1명	• 서비스 기능 기획 및 사용자 요구사항 기반 신규 기능 정의 • 마케팅 전략 수립 및 채널 운영, 전시/매칭 이벤트 기획 • KPI 설계 및 지표기반 운영 분석 • SNS 광고 콘텐츠 설계 및 성과 검토 책임
디자인 담당자	1명	• 플랫폼 UI/UX 고도화, 사용자 중심 시각 설계 • 브랜드 아이덴티티 관리 및 콘텐츠 일관성 유지 • SNS 채널용 시각 콘텐츠 제작 전담
사이트 운영 및 CS 담당	1명	• 플랫폼 모니터링 및 안정성 점검, 운영 이상 감지 • 콘텐츠 업로드 및 품질관리, 고객 문의 대응 • 회원사 활동 현황 파악 및 플랫폼 내 커뮤니케이션 지원 • 바이어-셀러 매칭 프로세스 후속 관리 및 피드백 수집
개발 담당	1명	• 신규 기능 개발 및 UI 연동 구현 • API 연계, 외부 시스템 통합, 성능 최적화 작업 • 보안 정책 설정 및 장애 대응 시나리오 관리 • 플랫폼 데이터베이스 운영 및 유지보수 작업 전담

ii) 매칭팀 조직 구성

(i) 거래 성사율 향상을 위한 바이어-셀러 매칭 전담조직으로 3인 규모의 매칭팀을 구성합니다.

(ii) 인바운드 대응 및 무역 자문 역할을 분리하여, 바이어 니즈 식별 → 셀러 매칭 → 사후 지원에 이르는 전 과정을 통합 관리합니다.

(iii) 베트남 기업과 시장에 대한 이해도가 높은 수원기관 추천 인력을 포함하여, 실질적인 거래 지원이 가능한 현지 기반 매칭 전문조직을 운영합니다.

(iv) 매칭팀 구성 및 역할

직책	인원	주요 업무 및 책임
매칭 팀장	1명	• 전체 매칭 전략 수립 및 성과 목표 설정 • 베트남 셀러 발굴 및 해외 바이어 네트워크 확장 • 유관기관 협력체계 운영
매칭 담당자	2명	• 바이어 인콰이어리 분류, 셀러 매칭 우선순위 결정 • 초기 커뮤니케이션 중개 및 품질관리 • 매칭 데이터 기록 및 성과 분석 • 거래 성사 지원(오퍼, 샘플, 계약서 등) • 사후 피드백 수집 및 사례 관리

(2) 운영체계 구축 및 운영 방안

i) 운영체계 및 운영 방안

(i) 베트남 온라인 수출플랫폼의 기능 기반 안정 운영을 위해 정기적 운영 회의, KPI 평가, 권한 의사결정 구조를 구성하고, 성과 기반 개선 루프를 실행합니다.

(ii) 운영팀과 매칭팀의 수평적 협업과 외부 기관 간 유기적 연계를 통해 운영 리스크를 최소화합니다.

(iii) 운영체계 상세

구분	내용
정기 미팅 체계	• 일일 스크럼 미팅 (15분): 업무 공유, 기술/운영 이슈 논의 • 주간 회의 (60분): 운영팀-매칭팀 연계 운영 성과 공유 및 문제해결 • 월간 성과 회의 (90분): KPI 리뷰, 기능 개선 계획 도출
의사결정 체계	• 일상 운영: 팀장 권한 내 승인 (24시간 이내) • 중요 사항: 운영/매칭 팀장 공동협의 (48시간 이내) • 전략 결정: 주관기관/베트남 정부 협의체 운영 (7일 이내) • 긴급 상황: 에스컬레이션 프로토콜 기반 대응 실행
성과 관리체계	• KPI 설정: 신규가입, 활성 사용자, 매칭 성공률, 응대율 등 • 대시보드: 실시간 운영 데이터 시각화 및 자동 보고 • 피드백 연계: 사용자 불만, 요청사항 기반 기능 개선
협업 시스템 도입	• Jira: 업무 및 이슈 트래킹 • Confluence: 매뉴얼 및 지식 위키 구축 • Slack: 팀 간 실시간 소통 체계 • Google Workspace: 운영자료 및 문서 공동 관리

ii) 운영 리스크 관리 방안

(i) 플랫폼 운영 중 발생할 수 있는 기술적, 운영적, 사업적, 외부 환경 리스크를 분류하고, 위험도를 평가하여 대응 전략을 수립합니다.

(ii) 에스컬레이션 체계를 바탕으로, 장애 발생 시 신속한 감지-대응-복구-재발방지 흐름을 확보합니다.

(iii) 리스크 관리 상세

구분	내용
리스크 범주별 대응 전략	• 기술적: 장애 예방 점검(월간), 백업 체계(일별), 보안 패치 정례화 • 운영적: 대체인력 지정, 프로세스 매뉴얼, 업무 연속성 확보 • 사업적: 성과 저조 항목 분석, 마케팅 재편성, 예산 우선순위 조정 • 외부적: 정책/시장 모니터링, 협의체 기반 신속 대응
위기 대응 프로토콜	• 1단계: 감지 및 담당자 확인 (1시간 내) • 2단계: 팀장 에스컬레이션 (4시간 내) • 3단계: 기관 협의 및 대외 공유 (24시간 이내) • 4단계: 사후 회고 및 프로세스 개선

(3) 기대효과

i) 플랫폼 안정성 확보

(i) 실시간 운영 모니터링, 기술장애 대응 체계 도입으로 서비스 가용성 99.9% 이상 확보

(ii)일상 운영 매뉴얼 및 책임 분장으로 업무 효율성 20% 이상 향상

ii) 고객 중심 플랫폼 운영

(i) 사용자 문의 응대율 95% 이상, 피드백 기반 콘텐츠 지속 개선

(ii) 바이어-셀러 매칭 성공률 40% 이상 달성 목표

iii) 현지화 기반 자립 운영 기반 구축

(ⅰ) 단계적 권한 이양 및 현지 인력 교육 완료 후, 베트남 주도 운영체계로 전환 가능
(ⅱ) 한국의 노하우 이전과 현지 기업의 지속 참여 기반 확보

ⅳ) 디지털 무역 활성화 기여
(ⅰ) 플랫폼 기반 중소기업 수출 활성화, 거래 성사로 국제 경쟁력 강화
(ⅱ) 베트남 정부 및 국제기관과 연계한 정책 협력 플랫폼 모델 정착 가능

2 베트남 온라인수출플랫폼 활성화 방안

1) 베트남 온라인수출플랫폼 활성화 방안

(1) 홍보 콘텐츠(영상 및 브로셔) 제작

ⅰ) 영상 제작

(ⅰ) 베트남 온라인 수출플랫폼의 인지도 확산과 사용자 확보를 위해 목적별 맞춤형 홍보 영상을 제작하고, 다양한 채널을 통해 효과적으로 배포

(ⅱ) 영상 제작 전략

구분	내용
영상 콘텐츠	• 플랫폼 가입 및 활용법 • 베트남 제품 경쟁력, 플랫폼 신뢰성 강조
영상 유형별 제작 계획	• 플랫폼 소개 영상 (3분): 핵심 기능과 혜택을 명확히 전달하는 메인 홍보 영상 • 바이럴용 숏폼 (15~30초): SNS 배포용 임팩트 있는 짧은 영상 클립
영상 제작 방식	• 내부 기획 및 시나리오 작성: 운영팀 기획 담당자 주도 • 촬영 및 편집: 전문 영상 제작사 외주 협업 • 언어: 베트남어 기본, 영어 자막 제공
제작 일정 및 배포 계획	• 1개월: 기획 및 시나리오 작성, 제작사 선정 • 2~3개월: 촬영 및 편집, 1차 영상물 완성, 피드백 수렴 • 4개월: 최종 영상물 완성, 온·오프라인 채널을 통해 지속 배포

ⅱ) 브로셔 제작

(ⅰ) 플랫폼의 핵심 가치와 기능을 효과적으로 소개하는 다양한 형태의 브로셔를 제작하여, 온/오프라인 마케팅 활동을 지원

(ⅱ) 브로셔 제작 전략

구분	내용
브로셔 종류 및 목적	• 종합 소개: 플랫폼 개요, 핵심 기능 등을 담은 메인 홍보물 • 퀵가이드: 주요 기능 활용법을 간략히 소개하는 가이드북
디자인 및 내용 구성	• 베트남 전통 요소와 현대적 디자인의 조화로 차별화된 브랜드 이미지 구축 • 시각적 요소(인포그래픽, 다이어그램)를 활용한 직관적 정보 전달 • 실제 플랫폼 UI 화면과 성공사례 이미지로 구체성 강화
제작 및 배포 계획	• 디자인: 운영팀 디자인 담당자 주도, 필요 시 외부 디자인 에이전시 협업 • 콘텐츠: 기획 담당자와 매칭팀 공동 작성, 전문가 감수 • 인쇄/제작: 현지 인쇄소 통해 고품질 인쇄물 확보 • 배포 채널: 정부 행사, 무역 박람회, 유관기관 네트워크, 디지털 버전 온라인 배포

(2) 구글 애즈 및 SNS 채널 광고 수행

◆ 베트남 온라인 수출플랫폼의 인지도 확산과 신규 사용자 유입을 위해 다채널 기반 디지털 광고 전략을 수립하고 실행
◆ 각 마케팅 채널은 사용자 특성 및 콘텐츠 소비 형태를 고려해 맞춤형 콘텐츠 및 타겟팅 전략을 적용하며, 플랫폼 운영조직 내 기획 및 디자인 담당자가 캠페인을 주도하고 외부 전문 에이전시와 협력하여 효율적 광고 집행을 지원

i) 구글 애즈(CPC/CPV) 수행

(i) 베트남 및 글로벌 주요 시장에서 플랫폼의 노출을 극대화하고, 실제 가입 전환율 증가를 목적으로 Google Ads(검색, 디스플레이, 유튜브 광고)를 중심으로 외부 전문 광고사를 통해 캠페인을 집행

(ii) 주요 키워드는 플랫폼명, 수출 관련 산업어, 지역명 기반의 조합 키워드를 활용하며, 전환율이 높은 세그먼트를 중심으로 지속적인 키워드 성과 분석 및 리마케팅 광고 병행

(iii) 광고 집행 예산은 전체 디지털 광고 예산의 50%를 배정하며, 외부 광고대행사가 광고 집행 및 보고서 작성을 수행하고, 플랫폼 운영팀 기획 담당자가 전략 수립 및 성과 검토 담당

구분	내용
광고 유형별 세부 전략	• 검색광고(CPC): "수출 판매", "베트남 제품", "B2B 플랫폼", "Gobiz 가입" 등의 키워드를 중심으로 구글 검색결과 상단 노출 • 디스플레이광고(CPC): 산업 관련 웹사이트 및 무역 커뮤니티 타겟팅 배너 운영 • 동영상광고(CPV): 유튜브 비즈니스 채널 타겟팅, 자체 제작 성공사례 영상 활용
타겟팅 전략	• 지역: 하노이, 호치민, 다낭 중심 베트남 주요 산업도시 • 언어: 베트남어(판매자용), 영어(글로벌 바이어용) • 타겟층: 중소기업 경영자 및 수출입 실무자
성과 측정 항목(KPI)	• CTR: 평균 3% 이상 • 전환율: 5% 이상 • CPA: $10 이하 유지 • ROAS: 300% 이상 확보 목표
성과 기반운영 계획	• 초기 1개월: 키워드 테스트 및 타겟 검증 • 중기 2개월: 고효율 키워드 확대 및 디자인 최적화 • 후반 3개월: 집중 예산 집행 및 고도화 캠페인 운영

ii) SNS 채널 광고 운영

(i) SNS 채널 특성에 맞춰 플랫폼 인지도 제고, 웹사이트 유입, 플랫폼 기능 안내를 위한 다채널 SNS 광고 캠페인을 운영합니다. 주요 채널은 Facebook, Instagram, YouTube, TikTok으로 구성되며, 콘텐츠 제작은 기획자와 디자이너가 공동 수행하며, 필요 시 외주 크리에이터 및 인플루언서를 활용

(ii) SNS 채널별 계획

구분	내용	실행 계획
Facebook	• 베트남 중소기업 및 온라인 판매자 대상 정보 중심 콘텐츠 확산 채널로	• 캠페인 목표: 플랫폼 방문 유도 및 회원가입 전환

	활용 • 25세 이상 기업 실무자를 주요 타겟으로 삼고, 게시물 및 광고는 인포그래픽 /짧은 영상/인터뷰 콘텐츠로 구성 • KOL 및 업계 인플루언서와의 협업을 통해 플랫폼을 간접 소개하고, 정부 정책 연계 홍보 병행	• 콘텐츠 유형: 정책 혜택 소개, 참여 성공사례, Q&A 카드뉴스 • 광고 예산: SNS 예산의 30% • 집행 방식: 자체 운영, 기획자 및 디자인 담당 연계 실행
Instagram	• 시각 콘텐츠 중심의 플랫폼 기능 홍보, 베트남 제품의 브랜드 이미지 고도화 채널로 활용 • 기업의 제품 이미지, 생산현장 스토리 등을 중심으로 감성 기반 스토리텔링을 통해 브랜드 친화도 향상 • 타겟은 25세 이상 중소기업 관계자 및 수출입 관심층으로 설정	• 콘텐츠 유형: 제품 사진, 생산 비하인드, 캐러셀형 홍보 콘텐츠 • 해시태그: #GoBizVietnam #MadeInVietnam #베트남수출 • 광고 예산: SNS 예산의 20% • 운영 방식: 자체 실행 + 인플루언서 마이크로 캠페인
YouTube	• 기업 신뢰성 강화 및 플랫폼 기능 심층 안내 목적의 장형 콘텐츠 채널 • 기업 사례 중심 영상, 제품 수출 프로세스 및 플랫폼 튜토리얼 구성 • 유튜브 인스트림 광고는 외부 대행사를 통해 병행 집행	• 영상 유형: 성공사례, 기능 소개 영상, 캠페인 광고 영상 • 광고 예산: SNS 예산의 30% • 외주 활용: 영상광고 집행은 외주, 콘텐츠 제작은 내부 주도
TikTok	• 젊은 기업인, 창업가 등을 타겟으로 한 짧고 임팩트 있는 영상 콘텐츠 배포 채널 • 수출 사례, 박람회 스케치 등을 짧은 영상으로 구성하여 플랫폼의 접근성과 진입장벽 완화를 도모 • 트렌드 해시태그 및 음악을 활용한 챌린지 기반 콘텐츠도 제작 가능	• 콘텐츠 유형: 15~30초 제품 소개, 현장 하이라이트, 인터뷰 요약 • 광고 예산: SNS 예산의 20% • 운영 주체: 기획자 및 디자이너 중심 자체 운영 • KOL 활용: 베트남 청년 기업인 기반 인플루언서 협력

(iii) 종합 운영체계

구분	내용
예산 배분	• 구글 광고: 전체 마케팅 예산의 50% (외주 위탁) • SNS 광고: 전체 마케팅 예산의 50% (내부 실행 중심, 일부 외주 활용) • Facebook: 30%, Instagram: 20%, YouTube: 30%, TikTok: 20%
운영조직 연계	• 기획/운영: 운영팀 내 기획 담당 주도, 디자인 담당 협업 • 성과 분석: 기획 담당 및 사이트 운영 담당이 KPI 기반 보고 • 외부 협업: 광고 집행 대행사, 영상 제작사, SNS 인플루언서
성과 분석 및 개선	• 주간: 콘텐츠별 조회수, 클릭률, 전환율, 피드백 수집 • 월간: 고성과 콘텐츠 유형 확대, 타겟층 분석 보완 • 분기별: 전체 광고 전략 리포트 기반 전략 수정 및 재편성

(3) 제품 등록 대행 지원

i) 제품 등록 대행 및 상세 콘텐츠 지원

(i) 베트남 온라인 수출플랫폼에 참여하는 베트남 중소기업들의 초기 진입장벽을 낮추고 높은 품질의 제품 정보를 확보하기 위해, 전문적인 제품 등록 대행 서비스를 제공합니다. 이를 통해 플랫폼의 콘텐츠 품질과 신뢰성을 향상시키고, 궁극적으로 바이어-셀러 매칭 성공률을 높이는 것을 목표로 함.

(i) 제품 등록 대행 서비스 개요

구분	내용
서비스 대상	• 신규가입 중소기업 • 디지털 역량이 부족한 전통 제조업체 • 우수 품질 제품 보유 기업 (중점 지원 대상)
지원 범위	• 제품 정보 수집 및 구조화 • 상세 페이지 기획 및 제작 • 다국어 상품 설명 작성(베트남어, 영어) • 제품 속성 및 카테고리 최적화
운영 방식	• 온라인 접수 시스템: 공공 이마켓플레이스 내 관리자 문의를 통한 간편 신청 프로세스 구축

(ii) 맞춤형 상세 콘텐츠 제작 지원

구분	내용
제품 사진 촬영 지원	• 상세 부분 확대 이미지 제작 • 이미지 보정 및 최적화 작업
상품 설명 콘텐츠 작성	• 표준화된 상품정보 템플릿 개발 및 적용 • SEO를 고려한 키워드 최적화 텍스트 작성 • 주요 타겟 시장별 맞춤형 정보 강조 • 구매 의사결정에 필요한 핵심 정보 구조화
마케팅 포인트 개발	• 제품의 차별화 요소 발굴 및 USP(고유 판매 제안) 개발 • 베트남 제품의 경쟁력 부각 콘텐츠 개발 • 바이어 관점의 구매 동기 유발 포인트 강조

(iii) 대행 서비스 프로세스

구분	내용
1단계: 사전 컨설팅	• 기업 및 제품 기초 정보 수집 및 분석
2단계: 콘텐츠 제작	• 이미지 작업 • 상품 설명 텍스트 작성 • 기술 사양 및 인증 정보 정리 • 다국어 번역 및 검수
3단계: 등록 및 최적화	• 플랫폼 내 상품 등록 및 카테고리 설정 • 검색 최적화 및 태그 설정
4단계: 사후관리	• 피드백 기반 콘텐츠 개선

(iv) 기대효과

• 등록 제품의 품질 및 신뢰성 향상

* 전문적인 제품 정보 구성으로 바이어 신뢰도 증가

* 표준화된 정보 제공으로 플랫폼 전체 품질 수준 향상

• 거래 성사율 향상

* 상세하고 정확한 제품 정보를 통한 미스매칭 감소
* 바이어 의사결정에 필요한 충분한 정보 제공으로 구매 전환율 증가

• 플랫폼 활성화 촉진
* 초기 콘텐츠 품질 및 수량 확보로 플랫폼 활성화 가속화
* 우수 사례 축적을 통한 추가 참여기업 유입 유도

3 온라인수출플랫폼 IT센터 운영 방안

1) IT센터 조직 구성

(1) 기술팀 조직 구성 및 역할

직책	인원	주요 업무 및 책임
기술팀장	1명	• 기술 설계 총괄 • 기술팀 관리 및 운영 • 성과 관리 및 자원 할당 의사결정 • 위기관리 및 주요 기술적 이슈 해결
테크니컬 아키텍트 담당자	1명	• 개발 가이드 제공 • 기술 표준화 및 아키텍처 설계 • 개발 프레임워크 구축 • 코드 품질관리
시스템 아키텍트 담당자	1명	• 시스템 구조 및 연동 설계 • 시스템 성능 최적화 • 클라우드 환경 구성 및 관리 • 데이터베이스 설계 및 최적화
네트워크 지원 담당자	1명	• 네트워크 인프라 구축 및 운영 • 네트워크 보안 설계 • 장애 감지 및 대응 • 트래픽 관리 및 최적화 • 네트워크 모니터링 체계 구축
소프트웨어 아키텍트 담당자	1명	• 소프트웨어 구조 설계 • 코드 품질관리 • 기술 부채 관리 • CI/CD 파이프라인 구축 • API 설계 및 관리

(2) 기술팀 주요 업무

i) 기술 설계 및 표준화: 플랫폼 아키텍처 설계 및 최적화, 기술 표준 및 개발 가이드라인 수립, 개발 프레임워크 및 라이브러리 표준화, 코딩 컨벤션 및 품질 기준 수립, 기술 로드맵 및 발전계획 수립

ii) 시스템 구조 및 연동 설계: 시스템아키텍처 설계 및 검증, 내·외부 시스템 연동 방안 수립, API 설계 및 관리, 마이크로서비스 아키텍처 설계 및 구현, 데이터베이스 설계 및 최적화

iii) 네트워크 인프라 구축 및 운영: 네트워크 인프라 설계 및 구축, 클라우드 환경 설계 및 최적화, 로드 밸런싱 및 트래픽 관리, 네트워크 모니터링 및 장애 대응, 보안 네트워크 설계 및 운영

iv) 성능 및 보안 관리: 시스템 및 애플리케이션 성능 모니터링, 성능 병목 현상 분석 및 최적화, 보안 요구사항 분석 및 구현, 정기적인 성능 테스트 및 개선

v) 소프트웨어 품질 및 유지보수: 코드 품질관리 및 리뷰 프로세스, 기술 부채 관리 및

리팩토링 계획, 지속적 통합 및 배포(CI/CD) 파이프라인 관리, 버그 수정 및 이행 관리

(3) 보안팀 조직 구성 및 역할

직책	인원	주요 업무 및 책임
보안 팀장	1명	• 보안 정책 수립 및 관리 • 보안팀 관리 및 운영 • 보안사고 대응 총괄 • 외부 감사 대응 • 보안 위험 평가 및 관리
사이버 보안 담당자	1명	• 네트워크 및 시스템 보안 관리 • 침입 탐지 및 방어 시스템 운영 • 취약점 점검 및 모의해킹 • 해킹 대응 및 침해사고 분석 • 보안 패치 및 업데이트 관리
정보보호 담당자	1명	• 개인정보보호 정책 운용 • 접근 권한 관리 • 정보보호 교육 및 인식 제고 • 내부 데이터 보호 체계 관리

(4) 보안팀 주요 업무

i) 보안사고 대응 및 외부 감사 대응: 보안사고 대응 체계 수립 및 운영, 침해사고 분석 및 복구 절차 수행, 사이버 위협 인텔리전스 수집 및 분석, 외부 보안 감사 준비 및 대응, 보안사고 보고 및 개선 대책 수립

ii) 네트워크 및 시스템 보안 관리: 네트워크 보안 아키텍처 설계 및 구현, 방화벽, IDS/IPS 등 보안 시스템 운영, 보안 패치 및 업데이트 관리, 취약점 스캔 및 보안 점검 수행, DDoS 대응

iii) 침입 탐지 및 해킹 대응: 침입 탐지 시스템 운영 및 모니터링, 실시간 보안 이벤트 분석 및 대응, 해킹 시도 탐지 및 차단, 보안 이벤트 로그 분석 및 상관관계 분석, 사이버 공격 대응 및 복구 절차 수행

iv) 개인정보 및 내부 데이터 보호: 개인정보보호 정책 수립 및 운영, 데이터 분류 및 접근 통제 체계 구축, 암호화 정책 수립, 개인정보 처리 시스템 점검 및 관리

v) 정보보호 교육: 임직원 보안 인식 교육 계획 수립 및 실행, 베트남 사이버보안법 등 현지 법규 준수, 보안 정책 및 지침 문서화

2) 베트남 현지 사무실 임차 및 운영

(1) 입지 선정기준

i) 인프라: 안정적인 인터넷 및 전력 공급 시설

ii) 보안: 건물 보안 시스템 및 출입 통제 시설

iii) 확장성: 인력 확대를 고려한 공간 확보

(2) 개발 인프라 구성

i) 개발 서버 환경: Google Cloud CI/CD Pipeline 구성

ii) IT 장비: 고성능 개발용 노트북/테스크톱(인당1대)

iii) 소스트웨어 및 라이센스: 운영체제 및 사무용 소프트웨어, 개발 도구 및 IDE(IntelliJ), 협업 및 커뮤니케이션 도구 (Jira)

다. 역량강화

1 지방세미나

1) 프로그램 개요

구 분	내 용
대상 인원	▫ 한국 및 베트남 지방 정부 또는 유관기관 담당자 ▫ 참석을 희망하는 베트남 수출중소기업 담당자 ▫ 참석 예상인원 (1~7차) 50명 내외 (※ 한-베 통역 수행원 2명 상시 지원 / 세미나 발표내용 동시통역)
행사일시	▫ (1차) 2025년 6월 27일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (2차) 2025년 7월 22일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (3차) 2025년 7월 12일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (4차) 2025년 8월 26일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (5차) 2025년 8월 11일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (6차) 2025년 9월 25일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간) ▫ (7차) 2025년 11월 11일 (행사시간 : 14:00 ~ 17:00, 3시간)
행사장소	▫ 베트남 산업통상부 교육지원센터(ICD)와 협의하여 장소 확정
참가자	[정부 및 유관기관] ▫ (한국) 중소벤처기업기업진흥공단, 온라인수출플랫폼 관계자 ▫ (베트남) 지방성(시) 산업통상부 및 상공회의소 관계자 [참여 연사] ▫ (sessions 1.) 중소벤처기업진흥공단 사업담당자 / 아스트라비전 민세준 PL ▫ (sessions 2.) 빅마운트앤컴퍼니 오대산 대표 ▫ (sessions 3.) 베트남 지방성(행사개최지) 산업통상부 또는 상공회의소 실무담당자 / 베트남 산업통상부 Vu 과장
세미나 목적	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 활용 홍보 ▫ 실무 중심 교육을 통한 플랫폼 활용 능력 배양 및 수출 자생력 확보를 지원 ▫ 수출플랫폼을 통한 지방 중소기업의 글로벌 시장 진출 기회 확대 지원

2) 프로그램 내용

(1) (sessions 1.) 베트남 온라인 수출플랫폼 소개
  i) 베트남 온라인 수출플랫폼 소개
  ii) 베트남 온라인 수출플랫폼 활용 사례
(2) (sessions 2.) 베트남 온라인 수출플랫폼 상세 활용 가이드
  i) 베트남 온라인수출플랫폼 개요, 주요 기능 등
  ii) 베트남 온라인수출플랫폼 활용법
(3) (sessions 3.)베트남 온라인 수출플랫폼 활용 지방산업 활성화 방안
  i) 지역 산업별 플랫폼 활용전략 및 지원 프로그램 안내

시 간		일정 주요 내용	수행처
14:00 ~ 14:10	10분	▫ 환영 인사	(한) 주관기관 (베) 산업무역부
14:10 ~ 14:50	40분	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 소개	(한) 주관기관
14:50 ~ 15:10	20분	▫ Tea Break 및 참석자 네트워킹	
15:10 ~ 15:50	40분	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 상세 활용 가이드	(한) 주관기관
15:50 ~ 16:10	20분	▫ Q&A 및 참석자 네트워킹	
16:00 ~ 16:50	40분	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 활용 지방산업 활성화 방안	(베) 산업무역부
16:50 ~ 17:00	10분	▫ Q&A 및 참석자 네트워킹, 참석자 대상 설문조사	

3) 프로그램 일정 (베트남 북부 하노이시 근접 지방성 기준)

단 계	내 용	비 고
1 행사 전일	【출국】	
오전(출발)	▫ 인천 → 하노이(5시간 내외)	대한항공
오후(도착/이동)	(한국 측) 발표자 및 수행인력 ▫ 베트남 입국(노이바이 공항) 후 설명회 개최 호텔로 내륙이동 • 노이바이 공항에서 차량 이동	
석식	▫ 행사 운영 관계자 참석	
2 행사 당일	【세미나】	
오전	(베트남 측) 발표자 및 수행인력 ▫ 베트남 하노이 산업무역부에서 행사장으로 내륙이동	
	▫ 행사장 최종 점검 및 리허설 진행 • 운영 인력 전원 행사 시작 2시간 전 도착	
중식	▫ 호텔 내 식사 장소 별도 예약 • 식사 시간(11~13시)을 내서 자유식	
오후	★ 세미나 본식 진행 • 참석인원 50명 내외 예상	
	(베트남 측) 발표자 및 수행인력 ▫ 행사장에서 하노이로 내륙이동	

단 계	내 용	비 고
3 행사 후일	【입국】	
오전	□ 호텔 조식(뷔페) 후 개별휴식, 출국 준비 □ 차량으로 하노이 노이바이 공항 내륙이동	
오후(출발)	□ 하노이 → 인천(4시간 30분 내외)	대한항공
저녁(도착)	□ 인천공항 도착 및 귀가	

4) 수행절차 및 추진방안

단 계	내 용
1 계획수립단계 (D-day 50일 전부터)	
1-1. 기본계획 수립	□ 기본계획 수립을 위하여 베트남 산업무역부, 사업 주관기관과의 면밀한 사전 협의와 의견 조율 진행 □ 세미나 목적 정의 및 주제 선정, 세미나 전체 구성요소(개최지, 세부 장소, 일정/시간, 프로그램, 참석자, 발표자, 행사 마케팅 등)를 고려하여 기본계획 수립
1-2. 실 예산계획수립	□ 실제 세부적으로 필요한 비용(장소대여료, 발표자 비용, 다과/음료, 세미나 자료, 마케팅 비용 등) 예측 후 예산관리 계획 수립
2 사전준비단계 (~D-day)	
2-1. 장소 확정	□ 세미나 예상 참석자 수, 예산, 교통 편의성, 시설 여건을 종합적으로 고려하여 후보 장소 중 최종확정 □ 행사장 준비를 위한 명확한 주문/요청 절차 진행(LCD 프로젝트와 AV 장비 세팅, 상차림, 강단 세팅과 backdrop 등)
2-2. 일정 확정	□ 발표자와 참석자의 일정, 이벤트 특성, 기타 환경적 상황을 고려하여 일정과 행사 진행 시간을 최종확정
2-3. 프로그램 확정	□ 세미나의 구체적인 '일, 시, 분' 단위 프로그램 일정 확정, 축사 – 발표 시간 – 휴식 시간(tea break) – 발표 시간 – 네트워킹 세션 –오찬 or 만찬으로 프로그램을 조직적으로 구성 □ 베트남 산업무역부와 사업 주관기관과의 사전 협의를 거쳐, 세미나 주제를 반영한 최적의 커리큘럼을 설계
2-4. 발표자 확정	□ 세미나 주제에 적합한 전문성을 보유한 발표자를 특정하여 사전일정을 협의하고 초대장 발송. 발표내용과 형식을 발표자와 구체적으로 논의하여 주제 및 내용의 추가, 수정을 거쳐 발표내용을 구체적으로 확정
2-5. 참가대상 확정	□ 베트남 정부 또는 유관기관 인사, 사업 관계자, 베트남 주재 한국 수출 및 전자상거래 유관기관, 협회, 한인 단체 등 담당자들을 대상으로 기본참석자 리스트를 작성하여 초대장을 발송하고, 행사 참석 대상군을 확정하여 마케팅 활동 전개 □ 참석자에게 세미나 온라인 사전등록 절차를 안내하고, 참가자 명단을 관리, 행사정보를 사전에 충분히 전달하고 행사 당일까지 주기적으로 리마인드 활동 진행
2-6. 세미나 자료준비	□ 세미나 주제의 효과적 전달을 위해, 주관기관과 발표자와의 사전 협의와 피드백을 거쳐 커리큘럼별 주제자료 작성, 디자인, 편집, 인쇄, 검수 절차

단 계	내 용
	진행 □ 사업 관련 마케팅 자료준비, 수출플랫폼 지원을 위한 유관기관 관련 홍보물 비치 검토(내용, 주제, 수량 확인)
2-7. 마케팅 및 홍보	□ 마케팅/홍보 계획에 따라, 홍보물을 제작(웹자보)하고 Korcham 및 무역협회 회원사(3,000여 개 社) 대상으로 웹사이트, SNS 알림, 뉴스레터, 이메일 홍보활동 등을 전개 □ 행사 당일 참석자에 현장 배포함으로써 마케팅 효과와 사업 이해를 돕기 위한 참고 책자, 홍보물을 사전 마련
2-8. 사전 점검	□ 행사개최 직전 발표자와 기본참석자들의 이동 동선, 예상 날씨(베트남의 7~8월은 우기인 상황을 고려), 교통상황 등을 점검하고, 행사장 안내표지, AV 장비, 식음료 준비, VIP 좌석 등 행사 운영 요소 점검 □ 사회자, 발표자 및 기본참석자들의 참석 여부 등 특이사항을 최종 점검하고, 세미나에 필요한 발표자료, 각종 책자, 기타 자료를 수송하여 준비 완료
3 진행단계 (D-day)	
3-1. 행사장 관리	□ 행사 당일 행사장 준비상태 최종 점검 실시(AV 장비, 테이블, 강단, 식음료, backdrop과 자료 등 마케팅 요소, 행사지원인력, 참석자 및 VIP 동선 등) □ 참석자들의 이동 동선에 안내판(X 배너 등), 안내원 배치 □ 행사 일정표에 따른 시간대별 행사장 운영 체크
3-2. 참석자 관리	□ 참가자 등록(방명록 작성, 자료 배포) 진행 □ 참가자 행사장 입장을 위한 안내, 이동지원 □ 기본참석자 중 불참자, 지각자에 대한 개별 연락 진행
3-3. 스케쥴 관리	□ 행사 식순에 따른 진행 전후, 사회자 진행 상황 모니터링 □ 축사, 발표 시간, 휴식 시간(tea break), 네트워킹 세션 순서별 시작, 종료 소요 시간 관리 □ 행사장 참석자 및 VIP의 출입, 착석, 이동과 소음방지 등 내외부 상황 통제
3-4. 비상 상황 해결	□ 통제 가능 요소별 비상대책 사전 마련(사례 : AV 장비의 기능 고장에 대비하여 행사장 엔지니어 상시 대기) □ 통제 불가 요소에 대해서는 사전에 행사운영팀, 행사장 관계자, 수행기관 간 R&R에 따른 신속 대응 지시/실행 □ 참석자 등 행사 운영 인력/참여인력에서 발생 가능한 비상 상황에 대비하여 대사관, 공안 등 비상 대응 연락망 운영
4 평가 및 사후관리 (D-day +10일 이내)	
4-1. 결과측정	□ 참석자를 대상으로 한 설문조사 및 질의응답 내용 정리 □ 참석자 통계(신청자 수 대비 참석자 수, 업종 등 기업 정보) □ 결과의 정성적 측면까지 반영하여 결과보고 작성
4-2. 결과평가 및 의견수렴	□ 측정된 결과를 바탕으로 한 주관기관 및 수행기관 내부 의견조회(성취도, 만족도에 대한 자기평가) □ 측정된 결과와 내부 평가 내용을 공유하고 내외부 의견 적극 수렴
4-3. 개선방안 마련	□ 결과평가와 의견수렴 내용을 바탕으로 세미나의 내용과 효과적인 측면에서 개선방안을 도출, 향후 계획에 반영

2 정부세미나

1) 프로그램 개요

구 분	내 용
대상 인원	ㅁ 한국 및 베트남 정부 또는 유관기관 담당자 ㅁ 참석을 희망하는 베트남 수출중소기업 담당자 ㅁ 참석 예상인원 : 60명 내외 (※ 한-베 통역 수행원 2명 상시 지원 / 세미나 발표내용 동시통역)
행사 일정	ㅁ 2025년 11월 25일 화요일 15:00~19:00 (4시간)
행사장소	ㅁ 하노이
참가자	[정부 및 유관기관] ㅁ (한국) 중소벤처기업기업진흥공단, 온라인수출플랫폼 관계자 ㅁ (베트남) 지방성(시) 산업통상부 및 상공회의소 관계자 [참여 연사] ㅁ (sessions 1.) 퀀텟시스템즈 최용석 PM ㅁ (sessions 2.) 베트남 공공 이마켓플레이스 구축 개발 총괄 담당자 ㅁ (sessions 3.) 베트남 산업통상부 Vu 과장
세미나 목적	ㅁ 베트남 온라인 수출플랫폼의 운영 시작을 알리는 런칭 행사 추진 및 실적 보고 ㅁ 베트남 정부 주도의 온라인 수출정책 수립과 플랫폼 운영 자립화를 양국 협력방안 마련 ㅁ 베트남 온라인 수출플랫폼 구축에 따른 후속대책 및 성과 확산 방안 마련

2) 프로그램 내용

(1) (sessions 1.) 베트남 온라인 수출플랫폼 런칭 및 성과 보고
  i) 베트남 온라인 수출플랫폼 구축사업 개관
  ii) 베트남 온라인 수출플랫폼 구축 성과 보고
  iii) 베트남 온라인 수출플랫폼 운영 성과 보고
(2) (sessions 2.) 베트남 온라인 수출플랫폼 서비스 시연
  i) 바이어, 셀러 중심의 핵심 기능 시연
  ii) 베트남 사용자 기업의 활용 사례 소개
(3) (sessions 3.) 베트남 온라인 수출플랫폼 구축 성과 확산을 위한 양국 협력방안
  i) 베트남 정부의 온라인 수출플랫폼 활성화 정책 수립 및 운영 자립화 협력방안

시 간		일정 주요 내용	수행처
14:00 ~ 14:10	10분	▫ 환영 인사	(한) 주관기관 (베) 산업무역부
14:10 ~ 14:50	40분	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 구축사업 개관 ▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 구축·운영 성과	(한) 주관기관
14:50 ~ 15:10	20분	▫ Tea Break 및 참석자 네트워킹	
15:10 ~ 15:50	40분	▫ 베트남 온라인 수출플랫폼 시연 ▫ 베트남 기업의 활용 사례 소개	(한) 주관기관
15:50 ~ 16:10	20분	▫ Tea Break 및 참석자 네트워킹	
16:10 ~ 16:50	40분	▫ 수원기관 운영 전환 및 안정화를 위한 논의	(베) 산업무역부
16:50 ~ 17:10	20분	▫ 참석자 네트워킹 및 VIP 만찬장 이동	
17:10 ~ 18:30	80분	▫ VIP 만찬	

3) 프로그램 일정

단 계	내 용	비 고
1 1일차	【출국】	
오전(출발)	▫ 인천 → 하노이(5시간 내외)	대한항공
오후(도착)	▫ 베트남 입국 및 숙소 도착 ▫ 행사장 등 행사 운영 점검	
석식	▫ 행사 운영 관계자 참석	
2 2일차	【유관기관 세미나】	
오전	▫ 행사장 최종 점검 및 리허설 진행 • 운영 인력 전원 행사 시작 2시간 전 도착	
중식	▫ 호텔 내 식사 장소 별도 예약 • 식사 시간(11~13시) 자유식	
오후	★ 세미나 본식 진행 • 참석인원 60명 내외 예상	
석식	▫ 행사 VIP 만찬(뷔페) • 참석인원 최대 20명 예상	
3 3일차	【입국】	
오전	▫ 호텔 조식(뷔페) 후 개별휴식, 출국 준비	
오후(출발)	▫ 하노이 → 인천(4시간 30분 내외)	대한항공
저녁(도착)	▫ 인천공항 도착 및 귀가	

4) 수행절차 및 추진방안

상기 “1. 지방세미나” 의 “4) 수행절차 및 추진방안”과 동일

5) 안전 비상대책

(1) 주베트남 한국대사관/영사관 비상 연락망

① 근무시간 내 긴급 상황 발생 시
- +84-24-3771-0404(비자, 여권 등)
- +84-24-3831-5111(정무, 경제 등)

② 근무시간 외 긴급 상황 발생 시
- +84-90-402-6126(24시간)

※ 상기 번호 연락 시 국가번호 +84 반드시 확인 필요

③ 영사콜센터: +82-2-3210-0404 (서울, 24시간)
- 상담 내용 : 우리 국민 해외 사건·사고 접수, 신속해외송금지원제도 안내, 가까운 재외공관 연락처 안내 등 전반적인 영사 민원 상담

④ 외교부 '해외안전 여행 애플리케이션' 활용
- 여행경보제도, 해외여행자 등록제, 동행, 위기 상황별 대처 매뉴얼, 좌충우돌 상황별 카툰, 대사관, 총영사관 연락처 현지 긴급구조 번호안내

(2) 베트남 비상 연락망

① (경찰-범죄 신고) 113 / (하노이경찰서) 04-3942-4244
② (소방-화재 신고) 114
③ (구급, 응급의료-앰뷸런스) 115
- VINMEC: +84 (0)24 3974 4333
- Korea Clinic : 04) 3734-6835
- 베-한 병원 : 04) 3945-4688 / (원장) 095-335-9857
- Bach Mai 병원 : 04) 3574-0740 / (응급실) 04) 3574-1111
- AEA 병원 : 04) 3826-4544 / (응급실) 04) 3934-0555
- SOS International 병원 : 04) 3934-0666
- 베트남-프랑스 병원 : 04) 3577-1110
- Famaily Practice 병원 : 04) 3726-5222
- 한국병원 : 04-843-7231

(3) 안전대책 (위급상황별 대응조치)

위급상황	대응조치
1 도난/분실	
1-1. 여권 분실	• 여권 분실 시, 분실발견 즉시, 가까운 현지 경찰서를 찾아가 여권 분실 증명서 발급 요청 • 재외공관에 분실증명서, 사진 2장(여권용 컬러사진), 여권번호, 여권 발행일 등을 기재한 서류를 제출 • 급히 귀국해야 할 때 여행 증명서를 발급
위급상황	대응조치
1-2. 현금 및 수표 분실	• 여행경비를 분실·도난당한 경우, 신속해외송금지원제도를 이용(재외공관 혹은 영사콜센터 문의) • 여행자 수표를 분실한 경우, 경찰서에 바로 신고한 후 분실 증명서를

	발급 요청 • 여권과 여행자 수표 구입 영수증을 가지고 수표 발행 은행의 지점에 가서 분실 신고서를 작성하면, 여행자 수표를 재발행받음. 이때, T/C의 고유번호, 종류, 구입일, 은행점 명, 서명을 제공
1-3 항공권 분실	• 항공권을 분실한 경우, 해당 항공사의 현지 사무실에 신고하고, 항공권 번호를 제공하여 확인
1-4. 수하물 분실	• 수하물을 분실한 경우, 화물인수증(Claim Tag)을 해당 항공사 직원에게 제시하고, 분실 신고서를 작성. 공항에서 짐을 찾을 수 없게 되면, 항공사에서 책임을 지고 배상함

2 부당한 체포 및 구금

- 당황하지 말고 침착하게 현지 사법당국의 절차에 따름
- 우리 공관에 구금 사실을 알리도록, 현지 사법당국에 요청
- 현지 언어가 능통하지 않을 경우, 사법당국에 통역 지원이 가능한지 문의
- 본인이 모르는 외국어로 작성된 문서나 내용을 정확하게 이해하지 못할 경우, 함부로 서명하지 않음
- 영사와의 면담 시행 후 진행될 사법절차, 현지 법체계에 대한 일반적인 정보를 받음
- 국내 가족과 연락을 하고 싶을 경우, 사법당국 또는 담당 영사에게 협조를 요청
- 체포·구금 당시 부당한 대우, 가혹 행위, 반인권적인 사항이 있었을 경우, 영사와의 면담 시 관련 사실을 알려 관계 당국에 시정을 요청할 수 있도록 함
- 변호사비, 보석, 소송비를 지급하는 데 필요한 경우, 신속 해외송금 지원제도를 활용
- 전문적인 법률 자문을 구하고 싶을 경우, 변호사 선임에 필요한 정보를 받음

3 인질/납치

- 납치되어 인질이 된 경우, 자제력을 잃지 말고 납치범과 대화를 지속하여 우호적인 관계를 형성하도록 함
- 눈이 가려지면 주변의 소리, 냄새, 범인의 억양, 이동 시 도로 상태 등 특징을 기억하도록 노력
- 납치범을 자극하는 언행은 삼가고, 몸값 요구를 위한 서한이나 음성녹음을 원할 때 응하도록 함
- 버스나 비행기 탑승 중 인질이 된 경우, 순순히 납치범의 지시에 따르고 섣불리 범인과 대적하려 들지 않음
- 납치범과 대적할 경우, 자신의 생명은 물론 다른 인질들의 생명도 위태로워질 수 있음에 유의

4 교통사고

- 재외공관(대사관 혹은 총영사관)에서 사건 관할 경찰서의 연락처와 신고 방법 및 유의사항을 안내받음. 의사소통의 문제로 어려움을 겪을 경우, 통역 선임을 위한 정보를 받음.
- 사고 후 지나치게 위축된 행동이나 사과를 하는 것은 자신의 실수를 인정하는 것으로 이해될 수 있으므로 분명하게 행동
- 목격자가 있는 경우 목격자 진술서를 확보하고, 사고 현장 변경에 대비해 현장을 사진 촬영
- 장기 입원하게 될 경우, 국내 가족들에게 연락하여 자신의 안전을 확인시켜 주고, 직접 연락할 수 없는 경우 공관의 도움을 요청. 사안이 위급하여 국내 가족이 즉시 현지로 와야 하는 경우, 긴급 여권 발급 및 비자 관련 협조 요청
- 급작스러운 사고로 의료비 등 긴급 경비가 필요할 경우, 해외공관이나 영사콜센터를 통해 신속 해외송금 지원제도를 이용

• 피해보상 소송을 진행할 경우, 그 나라의 일반적인 법제도 및 소송을 제기하기 위한 절차에 문의하고, 현지 또는 통역사 선임에 필요한 정보를 받음
5 업무수행 중 사망
• 여행 도중 동행인이 사망한 경우, 병원에서는 의사의 사망진단서를, 경찰로부터는 검사진단서 및 경찰 사망 증명서 등 필요한 서류를 발급 • 불의의 사망 시, 재외공관에 사망자의 성명, 사망일시, 사망 장소 및 유해 안치 장소, 사망원인, 사망자의 한국 주소, 본적, 유족의 성명과 주소, 사망자의 여권번호 및 발급일을 신고함. 사업 수행기관은 사망자가 있는 경우, 사망자의 성명, 사망일시, 사망 장소, 사망원인, 유해 안치 장소, 가족에 대한 연락, 보험 수속 의뢰 상황을 보고

(4) 제안사 안전대응 기본수칙 준수

① 비상연락망 보관/숙지 후 행사 참석 인원에게 비상시 즉시 전파
② 한국에서 입국하는 행사참여인 원에 여행자 보험 가입 권유
③ 행사 전·중·후, 장거리 이동 간 수행인력과 참석자 상시 건강 체크
④ 이동 시 안전한 지역, 공간에 체류 권고
⑤ 수행인력 및 참석자에게 개인 소지품 분실 방지 노력 요청
⑥ 베트남 현지식을 이용할 때 완전히 조리된 것을 섭취하고, 끓인 물 또는 병입 생수를 음용할 것을 권고
⑦ 제안사의 PM 이하 수행인력(베트남 현지 통역직원 포함)은 행사참석자 등 모든 관련 인력들에 필요 시 상기 '위급상황별 대응조치'에 따른 행동 요령을 전파하고, 현지 법규와 관습에 대한 이해를 바탕으로 신속하게 상황별 대처에 적극적으로 투입되도록 함

3 초청연수

1) 프로그램 개요

구 분	내 용
인원	□ 베트남 산업무역부 공무원 10명 (연수단장 1명, 실무담당자 9명)
연수 일정	□ 2025년 10월중 (9박 10일)
참석대상	□ 온라인수출플랫폼 전수사업 주요의사 결정자, 플랫폼 운영 실무담당자 (※ 한-베 통역 수행원 2명 전체 일정 동행 / 행사운영 인력 4명 상시 지원)
연수목적	□ 온라인수출플랫폼의 이해증진 및 활성화 □ 온라인수출플랫폼 개발 내용 등 소개 □ 베트남 현지화에 따른 플랫폼 적용과 이용정착 및 확산
연수내용	□ 온라인수출플랫폼 기반 지식 습득 및 시스템 운영관리 교육 □ 성공사례 분석 □ 현장 실습 □ 독자 운영 및 현지 활용역량 강화 □ 유관기관 방문 □ 한국문화 체험과 이해

※베트남 산업통상부 협의에 따라 일정 및 인원 등 변경 가능

2) 프로그램 내용

구 분	교육내용
OT	▫ 실무연수 교육 오리엔테이션
실무 Training	▫ 플랫폼의 이해 /시연 / 성공사례
	▫ 플랫폼 입점 지원 및 방법, 관리
집중교육 및 실습	▫ 수출상품 등록 및 관리
	▫ 인콰이어리 검증 및 관리
	▫ 결제, 배송 등 플랫폼 기능 관리
	▫ 온라인 거래알선 관리
	▫ 플랫폼 실습 및 특강
심화 토의 및 총론	▫ 만족도 조사 / 성과도 조사
	▫ 의견교환 및 수렴 등 향후 발전계획 수립

3) 프로그램(연수) 일정

일차	구분	내용	체크 사항
1일차	입국/OT	▫ 입국 및 공항 영접 ▫ 호텔 이동 ▫ 휴식 및 OT(숙박호텔 소연회장)	▫ 참석대상 확인 ▫ OT 자료
2일차	교육(1) 유관기관 방문	▫ 퀀텟시스템즈 방문 ▫ 정책교육 및 양국 의견교환 ▫ (한국) 온라인수출플랫폼 실무 교육 ▫ (베트남) 온라인수출플랫폼 활용 방향	▫ 교육자료
3일차	유관기관방문	▫ 중소벤처기업진흥공단 방문	▫ 일정 확인
4일차	교육(2)	▫ 집중교육 및 실습(1)	▫ 교육자료 ▫ 외부강사 초빙
5일차	교육(3)	▫ 집중교육 및 실습(2) ▫ 전자상거래 파워셀러 간담회	▫ 교육자료 ▫ 외부강사 초빙 ▫ 이커머스 파워셀러 명단
6일차	교육(4) 산업시찰	▫ 집중교육 및 실습(3) ▫ GOBIZ KOREA 센터 방문(예시)	▫ 교육자료 ▫ 일정 확인 ▫ 외부강사 초빙
7일차	유관기관방문	▫ 우정사업국 국제물류센터(예시) ▫ CJ 대한통운 물류센터(예시)	▫ 일정 확인
8일차	교육(5)	▫ 집중교육 및 실습(4)	▫ 교육자료 ▫ 외부강사 초빙
9일차	교육(6) 산업시찰	▫ 심화토론 및 결론 ▫ 서울시내 문화체험	▫ 교육자료 ▫ 일정 확인
10일차	출국	▫ 출국 준비	▫ 만족도 조사

4) 수행절차 및 추진방안

당사는 한-베 경협 사업을 통해 베트남 산업통상부와 여러 차례 역량강화 세미나 개최 경험을 바탕으로 다음과 같은 수행단계별 수행절치 및 추진방안을 수립하였음

단계	업무 내용	체크 사항	비고
준비기획 (6월)	□ (베) 산업통상부 미팅 - 일정, 장소, 커리큘럼 협의 - 참석인원 협의 □ 중진공 미팅 - 초청대상 공무원 확인 - 연사(안) 컨펌 - 기본 프로그램(안) 컨펌(일정/장소 등)	□ 시기, 일정, 장소 □ 참석대상 확인 □ 연사 리스트 작성 □ 산업통상부 요청사항 반영	□ 비자 확인 □ 초청공문 레터 발송 □ 가족 동반 확인
세부실행계획 (6-7월)	□ 연사 섭외 및 확정 □ 세부 교육내용 확정 □ 연수 총괄계획서 확정	□ (베) 산업통상부 미팅, 컨펌 □ 중진공 미팅, 컨펌 □ 연수 장소, 숙박, 차량 등 예약 □ 교육자료 취합 □ 참석대상 CV 취합 □ 현장 방문 기관 협조 공문 발송	□ 입출국 일정 확인 □ 운영매뉴얼 작성 □ 체크리스트 공유 □ 특이식단자 체크 □ 유관기관 사전협조 공문 발송(병원, 경찰서, 소방서, 현장 방문 기관)
실행운영 (8월)	□ 연수프로그램 진행	□ 비상 상황 체크 □ 안전 상황 체크	□ 비상연락망 공유
완료 (8월)	□ 만족도 조사 □ 성과도 조사 □ 향후 발전의견 교환	□ 조사표 작성 및 배포	□ 향후 계획반영

4 초청 워크숍

1) 프로그램 개요

구 분	내 용
인원	□ 베트남 산업무역부 공무원 5명
연수 일정	□ 2025년 9월중 (4박 5일)
참석대상	□ 온라인수출플랫폼 전수사업 주요의사 결정자 및 관련 공무원 (※ 한-베 통역 수행원 2명 전체 일정 동행 / 행사운영 인력 4명 상시 지원)
연수목적	□ 베트남 ODA 사업 중간성과 공유 □ APEC 중소기업 장관회의 부대행사 참가
연수내용	□ APEC 부대행사 참가 및 참가국, 운영기관과의 네트워킹 기회 확보 □ 사업 중간성과 발표 및 추진 현황 공유 □ 향후 운영 전략 및 개선 방향 논의 □ 지역 기반 문화 교류 및 체험

※베트남 산업통상부 협의에 따라 일정 및 인원 등 변경 가능

2) 프로그램 내용

구 분	교육내용
OT	□ 워크숍 오리엔테이션
중간성과 공유 및 논의	□ 베트남 ODA 사업 중간성과 발표
	□ 질의응답 및 향후 계획 논의
APEC 행사 참여	□ APEC 부대행사 참석
	□ 참가국 및 운영기관과의 네트워킹

구 분	교육내용
문화체험	▫ 제주 지역 기반 산업·문화 콘텐츠 체험
	▫ 협력 기반 조성을 위한 문화 교류 활동

3) 프로그램(연수) 일정

일차	구분	내용	체크 사항
1일차	입국/OT	▫ 입국 및 공항 영접 ▫ 호텔 이동 ▫ 휴식 및 OT(숙박호텔 소연회장)	▫ 참석대상 확인 ▫ OT 자료
2일차	중간성과 공유 및 논의	▫ 베트남ODA 사업 중간성과 발표 ▫ 질의응답 ▫ 향후 계획 논의	▫ 발표자료
3일차	APEC 행사 참여	▫ 'Global Startup Day in Jeju' 등 APEC 부대행사 참석	▫ 일정 확인
4일차	문화체험	▫ 제주 자연 및 문화체험 ▫ 워크숍 피드백 수렴	▫ 일정 확인
5일차	출국	▫ 출국 준비	▫ 만족도 조사

4) 수행절차 및 추진방안

당사는 한-베 경협 사업을 통해 베트남 산업통상부와 여러 차례 역량강화 세미나 개최 경험을 바탕으로 다음과 같은 수행단계별 수행절치 및 추진방안을 수립하였음

단계	업무 내용	체크 사항	비고
준비기획 (7월)	▫ (베) 산업통상부 미팅 - 일정, 장소, 커리큘럼 협의 - 참석인원 협의 ▫ 중진공 미팅 - 초청대상 공무원 확인 - APEC 행사 참석 신청 - 기본 프로그램(안) 컨펌(일정/장소 등)	▫ 시기, 일정, 장소 ▫ 참석대상 확인 ▫ 연사 리스트 작성 ▫ 산업통상부 요청사항 반영	▫ 비자 확인 ▫ 초청공문 레터 발송 ▫ 가족 동반 확인
세부실행계획 (7-8월)	▫ APEC 행사 참석 확정 ▫ 연수 총괄계획서 확정 ▫ 중간성과 보고자료 작성	▫ (베) 산업통상부 미팅, 컨펌 ▫ 중진공 미팅, 컨펌 ▫ 워크숍 장소, 숙박, 차량 등 예약 ▫ 중간성과 보고자료 체크 ▫ 참석대상 CV 취합 ▫ 현장 방문 기관 협조 공문 발송	▫ 입출국 일정 확인 ▫ 운영매뉴얼 작성 ▫ 체크리스트 공유 ▫ 특이식단자 체크 ▫ 유관기관 사전협조 공문 발송(병원, 경찰서, 소방서, 현장 방문 기관)
실행운영 (9월)	▫ 워크숍 프로그램 진행	▫ 비상 상황 체크 ▫ 안전 상황 체크	▫ 비상연락망 공유
완료 (9월)	▫ 만족도 조사 ▫ 성과도 조사 ▫ 향후 발전의견 교환	▫ 조사표 작성 및 배포	▫ 향후 계획반영

5 제안사 강점

1) 현지 파트너사와의 협력체계 구축

(1) 2024년 역량강화 부문의 원활한 추진을 수행한 현지 파트너사와의 협업체계 구축

(2) 검증된 핵심인력을 유지하여 안정적 역량강화 프로그램 안정적 운영체계 확보

가. 일반 사업관리

1 개발 방법론

1) 방법론 개요

(1) Water-Scrum-Fall 방법론은 전통적인 폭포수 모델(Waterfall)과 애자일 방법론인 스크럼(Scrum)의 장점을 결합한 접근 방식으로, 체계적인 프로젝트 관리와 유연한 개발 프로세스를 동시에 달성할 수 있는 하이브리드 개발 방법론

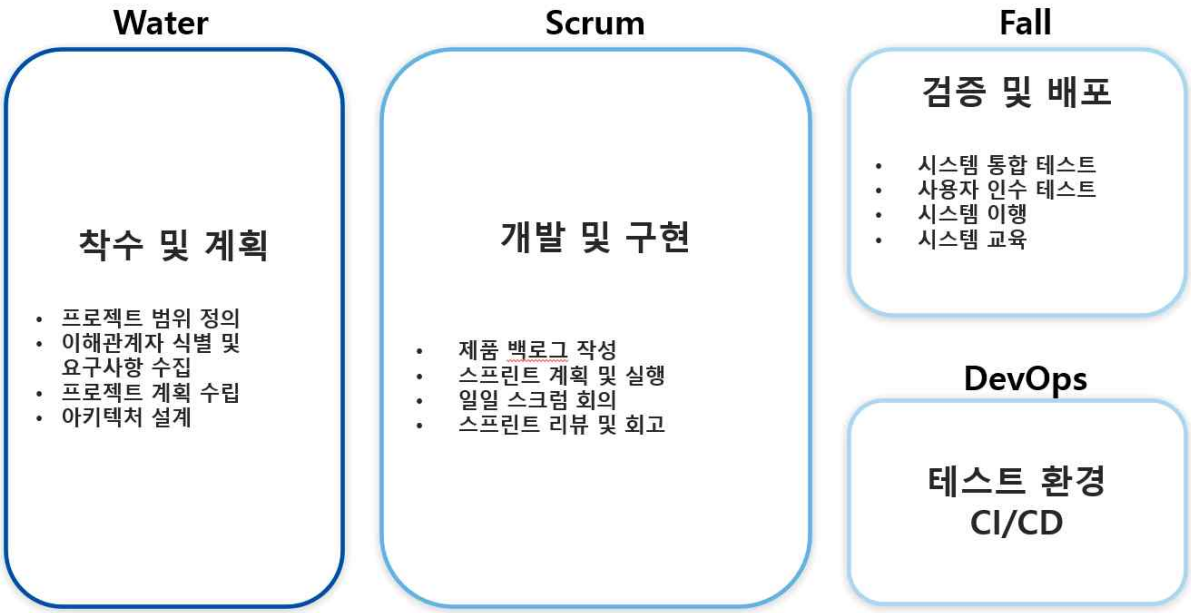

2) 방법론 특징

(1) 구조화된 프로세스와 유연성의 결합: 명확한 계획과 요구사항 정의를 기반으로 하되, 개발 과정에서의 변화에 유연하게 대응

(2) 위험 최소화: 초기 단계에서의 철저한 계획과 분석으로 위험 요소를 사전에 식별하고 관리

(3) 점진적인 가치 전달: 반복적인 개발 사이클을 통해 지속적으로 기능을 제공하고 피드백 반영

(4) 안정적인 품질 보장: 명확한 요구사항과 체계적인 테스트를 통한 품질 확보

2 관리방법론

1) 개요

(1) 사업관리 목표

i) 일정 준수: Water-Scrum-Fall 단계별 계획대비 지연 최소화

ii) 범위 관리: 범위 변경에 대한 통제 및 관리체계 확립

iii) 제품 품질: 결함 발견률 지속적 감소 추세 확보

iv) 예산 준수: 변경 관리를 통한 추가 예산 요구 최소화

v) 자원 최적화: 핵심 역량 보유 인력 확보, 외부 의존성 최소화를 통한 프로젝트 리스크 감소

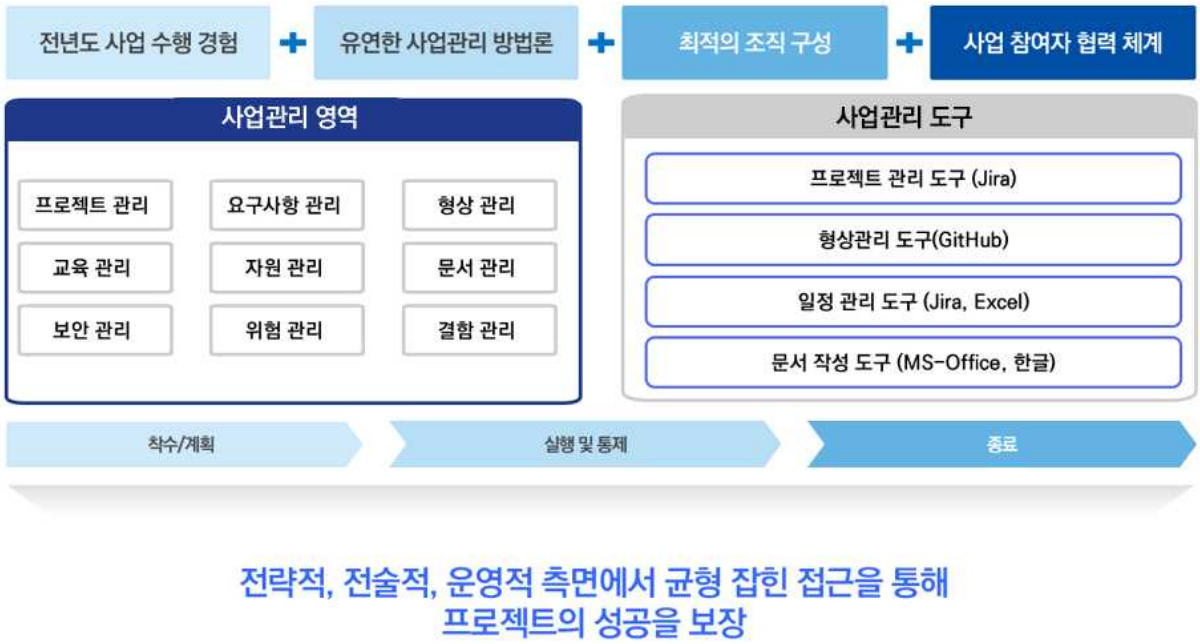

전략적, 전술적, 운영적 측면에서 균형 잡힌 접근을 통해 프로젝트의 성공을 보장

(2) 사업관리 범위 : 사업계획 수립부터 시스템 구축, 운영, 유지보수까지 전 단계 포괄

〈사업관리 범위〉

단계	관리 영역	주요 활동
사업계획	• 사업 목표 및 범위 설정 • 일정계획 수립 • 예산 편성 • 자원 확보	• 사업 목표 및 범위 명확화 • 상세 일정계획 수립 및 주요 마일스톤 설정 • 예산 항목별 세부계획 수립 • 필요 인력 및 장비 확보
사업 실행	• 공공 이마켓플레이스, 온라인 전시관, 바이어-셀러 매칭, 공공 이마켓플레이스 고도화 구축 • 기자재 공급 및 설치 • 교육 프로그램 운영	• 시스템 요구사항 정의 및 설계 반영 • 단계별 산출물 검토 및 승인 • 시스템 개발 및 테스트 • 기자재 설치 및 시스템 통합 • 교육 프로그램 개발 및 운영
사업 완료	• 시스템 운영 및 유지보수 • 사업 성과 평가 • 결과보고서 작성	• 시스템 안정성 확보 및 장애 대응 • 사용자 피드백 수렴 및 시스템 개선 • 사업 목표 달성도 평가 • 사업 결과보고서 작성 및 제출

(3) 사업관리 조직 : 사업을 효율적으로 관리하기 위해 다음과 같은 조직을 구성하고, 각 조직의 역할과 책임을 명확하게 설정

〈사업관리 조직〉

조직	역할
사업관리위원회 (PMO)	• 사업 전반 총괄 및 의사결정 • 사업계획 검토 및 승인 • 사업 진행 상황 점검 및 평가
사업관리자 (PM)	• 사업계획 수립 및 실행

	• 일정 관리, 자원 관리, 품질관리, 위험 관리 • 사업 진행 상황 보고 및 의사소통
분야별 책임자 (PL)	• 각 분야별 업무수행 및 관리 (컨설팅, 시스템 구축, 교육 등) • 팀원 관리 및 업무 분담 • 품질관리 및 문제해결
실무담당자	• 각 분야별 실무 업무수행 • 품질관리 활동 참여 • 문제 발생 시 보고 및 해결 지원

2) 프로젝트 관리 방안

(1) Water-Scrum-Fall 기반 프로젝트 관리를 통해서 예측성과 유연성을 동시에 확보하며, 효율적인 개발과 안정적인 서비스를 제공

〈프로젝트 관리 개요〉

구분	Waterfall	Scrum	통합 운용 전략
적용 단계	• 요구사항 수집 • 계획 수립 • 산출물 승인	• 반복적 기능 개발 • 사용자 피드백 반영	• 전체 일정은 기존 방식 • 개발은 Sprint 중심
적용 범위	• 산출물 작성 • 품질 점검 • 검수 대응	• 핵심 기능 빠른 구현 • 프로토타입 테스트 • 요구사항 반영	• 산출물 적합성 확보 • 민접한 대응 병행
운용 주체	• PMO • 수원기관 • 총괄 PL	• 개발팀 • UI/UX • QA	• 개발자 • 기획자 • 수원기관

(2) 이해관계자 관리

i) 본 사업의 성공적인 수행을 위해 다양한 이해관계자들과의 효과적인 소통 및 협력이 중요. 각 이해관계자의 특성을 파악하고, 맞춤형 관리 전략을 수립하여 원활한 사업 추진 도모

〈이해관계자 관리〉

이해관계자	관심사	요구사항	관리 방안
베트남 산업통상부	• 사업 성공 및 성과 창출 • 베트남 전자상거래 발전 기여	• 명확한 사업 목표 및 계획 공유 • 정기적인 사업 진행 상황 보고 • 베트남 정부 정책과의 연계성 강조 • 현지 의견 적극 수렴 및 반영	• 정기적인 회의 및 보고를 통한 긴밀한 소통 • 사업 성과 지표 설정 및 공유 • 베트남 정부 정책 방향에 부합하는 사업추진 • 현지 전문가 및 유관 기관과의 협력 강화
베트남 중소기업	• 온라인수출 판로 확대 • 수출 역량 강화 • 실질적인 매출 증대	• 사용하기 쉬운 플랫폼 • 다양하고 유용한 수출지원 서비스 • 실질적인 비즈니스 성과 창출	• 사용자 친화적인 플랫폼 설계 및 개발 • 온라인수출 교육 및 컨설팅 제공 • 해외 바이어 매칭 및 마케팅 지원 • 성공사례 발굴 및 홍보
국내 수출 지원 기관 (중진공 등)	• 한국 기업의 베트남 시장진출 지원 • 양국 간 경제 협력 강화	• 플랫폼을 통한 한국 제품 홍보 및 판매 지원 • 베트남 시장 정보 제공 및	• 플랫폼 내 한국 제품 전용관 운영 • 베트남 시장 정보 및 트렌드 분석 자료 제공 • 양국 기업 간 비즈니스 매칭 행사개최

		네트워킹 기회 마련	
개발사	• 성공적인 사업 수행 • 기술력 확보 및 레퍼런스 구축	• 명확한 요구사항 정의 • 합리적인 개발 기간 및 예산 확보 • 원활한 협업 환경 조성	• 상세 요구사항 명세서 (SRS) 작성 및 공유 • Agile 개발 방법론 도입을 통한 유연한 개발환경 구축 • 정기적인 회의 및 보고를 통한 협업 강화 • 기술 지원 및 교육 제공

(3) 사업 구성요소 간 유기적 연계 방안 : 각 사업 구성요소 간 유기적인 연계를 통해 시너지 효과를 창출하고, 사업 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 추진

i) 요구사항 분석 → 플랫폼 설계 및 개발: 사용자 (베트남 중소기업)의 요구사항을 분석하고, 이를 플랫폼 설계 및 개발에 반영하여 사용자 만족도를 높이고 실질적인 비즈니스 성과 창출

ii) 플랫폼 구축 → 서비스 제공: 구축된 플랫폼을 기반으로 다양한 수출지원 서비스 (정보 제공, 바이어 매칭, 무역 금융 등)를 제공하여 베트남 중소기업의 온라인수출 역량 강화

iii) 서비스 제공 → 역량 강화: 플랫폼 활용 교육, 온라인수출 컨설팅, 마케팅 지원 등 다양한 교육 프로그램을 통해 베트남 중소기업의 온라인수출 역량 강화, 플랫폼 활용도 향상

iv) 역량 강화 → 활성화: 교육받은 중소기업들이 플랫폼을 적극적으로 활용하여 실질적인 수출 성과 창출 및 이를 통한 플랫폼의 활성화를 촉진할 수 있도록 지원

v) 활성화 → 시스템 운영 및 유지보수: 플랫폼 운영 과정에서 발생하는 사용자 피드백 수렴 및 시스템을 지속적으로 개선하여 안정적인 서비스 제공과 사용자 만족도 향상 도모

(4) 사업 위험 관리 : 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 사전에 식별하고, 적절한 대응 방안을 마련하여 사업 리스크 최소화

〈사업 위험 관리〉

위험 요소	발생 가능성	영향도	대응 방안
베트남 정부 정책 변경	낮음	높음	• 베트남 정부 관계자와의 지속적인 소통 및 협력 강화 • 정책 변경 시 사업계획 수정 및 유연한 대응 • 베트남 현지 전문가 활용 및 자문
기술적 문제 발생 (시스템 오류, 보안 취약점 등)	중간	높음	• 전문기술 인력 확보 및 기술 지원체계 구축 • 정기적인 시스템 점검 및 취약점 분석 • 백업 시스템 구축 및 복구 계획 수립 • 최신 보안 기술 적용 및 보안 교육 시행
예산 초과	낮음	높음	• 상세 예산 계획 수립 및 철저한 예산 집행 관리 • 예산 변경 발생 시 사업관리위원회 보고 및 승인 • 비용 절감 방안 마련 및 실행
일정 지연	중간	중간	• 주요 마일스톤 설정 및 진행 상황 점검 • 일정 지연 발생 시 원인 분석 및 대책 마련 • 인력 추가 투입 또는 업무 조정 • 필요 시 사업 기간 연장 검토
낮은	중간	중간	• 다양한 홍보 채널을 활용한 적극적인 홍보 및 마케팅

〈사업 위험 관리〉

위험 요소	발생 가능성	영향도	대응 방안
사용자 참여율			• 사용자 친화적인 플랫폼 설계 및 기능 개선 • 지속적인 교육 및 컨설팅 제공
낮은 거래 성사율	중간	중간	• 엄격한 셀러 검증 시스템 구축 • 신뢰도 높은 바이어 발굴 및 매칭 • 거래 지원 서비스 강화 (결제, 물류, 통관 등) • 수출 성공사례 공유 및 확산

(5) 사업 진도 관리 : 사업 진행 상황을 효과적으로 관리하고, 문제 발생 시 신속하게 대응하기 위해 다음과 같은 방법 활용

i) WBS (Work Breakdown Structure): 사업 범위를 작은 작업 단위로 분할하여 체계적으로 관리하고 각 작업별 진행 상황 파악

ii) 간트 차트 (Gantt Chart): 각 작업의 시작 및 종료 시점, 소요 기간, 의존 관계 등을 시각적으로 표현하여 일정 관리를 용이하게 하고, 전체 사업 진행 상황을 한눈에 파악

iii) 정기 보고: 주간/월간 보고를 통해 사업 진행 상황, 주요 이슈, 다음 단계 계획 등을 공유하고, 문제 발생 시 신속하게 대응

iv) 변경 관리: 사업계획 변경 시 영향 분석 및 관련 이해관계자와의 협의를 통해 변경을 승인하고 관리하여 사업 목표 달성 추진

(6) 보안 관리 : 민감한 수출 정보를 다루는 플랫폼의 특성을 고려하여 다음과 같은 보안 관리 방안 준수

i) 보안 정책 수립 및 시행: 정보자산 분류, 접근 통제, 암호화, 백업 및 복구 등 보안 정책을 수립하고 시행하여 정보 유출 및 오남용 방지

ii) 보안 교육: 플랫폼 운영 담당자 및 사용자를 대상으로 정기적인 보안 교육하여 보안 의식을 고취 및 보안사고 발생 가능성 최소화

iii) 시스템 보안: 방화벽, 침입 탐지 시스템, 웹 방화벽 등 보안 시스템을 구축하고 운영하며, 최신 보안 기술을 적용하여 시스템 보안 강화

iv) 취약점 점검: 정기적인 취약점 점검 및 모의 해킹을 통해 보안 위협 요소를 사전에 발견하고 제거하여 안전한 플랫폼 환경 조성

(7) 형상 및 문서 관리 : 체계적인 형상 및 문서 관리를 통해 사업 산출물의 품질을 유지 및 효율적인 관리 지원

i) 형상관리 도구 활용: Git, SVN 등 형상관리 도구를 활용하여 소스 코드, 문서 등 변경 이력을 관리하고, 버전 관리를 통해 효율적인 협업 환경 구축

ii) 문서 관리시스템 구축: 문서 생성, 검토, 승인, 배포 등 문서 관리 프로세스를 체계화하고, 문서 접근 권한을 관리하여 정보보안 강화

iii) 백업 및 복구: 정기적인 백업을 통해 데이터 손실을 방지하고, 필요 시 신속하게 복구할 수 있도록 시스템 구축

3 일정관리

1) 프로젝트 일정관리

사업수행 / 기간 / 업무구분		2025년																											
		M+0				M+1					M+2				M+3				M+4					M+5				M+6			
단계별 수행업무		1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w	5w	1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w	5w	1w	2w	3w	4w	1w	2w	3w	4w
사업 착수	프로젝트 일정 수립																														
	수원국과 사업범위 및 추진일정 합의																														
	국내외 착수보고																														
개발	분석																														
	설계																														
	개발/테스트																														
	전개																														
	인도/종료감리																														
	안정화																														
역량 강화	초청연수																														
	초청워크샵																														
	유관기관세미나(1회)																														
	지방순회세미나(7회)																														
사업 관리	중간보고																														
	설계감리																														
	종료감리																														
	종료보고																														
운영 관리	운영센터																														
	마케팅																														
	IT센터																														
	전문가 파견																														

2) 일정계획 수립 방안

(1) 추진 절차

(2) WBS 기반 일정 설계

프로젝트 요구사항을 세부 작업 단위로 분할(WBS) 하여 단계별 산출물 및 진척 목표를 명확하게 설계

(3) 일정 변경 및 통제

i) 일정 변경 발생 시 반드시 사전 보고 및 협의 후 확정

ii) 변경 사유, 영향도, 대안 포함한 변경보고서 제출

iii) 변경 관리 내역은 매주/월간 보고에 반영

3) 일정 관리 실행 방안

(1) 보고체계

i) 주간·월간 보고서 제출

→ 공정률, 일정 준수 현황, 문제점 및 대안, 품질 상태 포함, 프로젝트 일정 흐름 내 진척도, 변경사항, 리스크 모니터링

ii) 3회 공식 보고회 운영

→ 착수, 중간, 최종보고회를 발주처와 수원국 현지에서 개최, 각 회의 결과는 산출물 제출

(2) 안정화 계획 및 운영

i) 시스템 오픈 이후 최소 1개월간 안정화 운영

ii) 매주 1회 이상 안정화 결과보고서 제출

iii) 전담 조직(5명 이상 상주) 운영으로 안정화 대응 체계 강화

4 사업관리

1) 요구사항 관리

〈요구사항 관리 계획〉

관리 항목	주요 내용
요구사항 관리	• 정기적 검토 회의 개최 • 요구사항 정의서 작성 • 명확한 검사 기준 설정 및 검증
결함 발생률 관리	• 검증된 온라인 기반 관리시스템 도입 • 결함 수와 지속시간 관리 • 결함률 10% 이상 또는 중대 결함 시 즉시 보고
결함 조치율 관리	• 우선순위에 따른 조치계획 수립 및 처리 • 불가항력적 조치 불가 사항은 수원기관 승인 요청 • 철저한 일정 관리 및 예비 인력 확보

(1) 요구사항 관리 방안

i) 요구사항 관리 프로세스의 일환으로 정기적인 검토 회의를 개최하여 요구사항의 상태와 반영 여부를 확인. 이해관계자와 협력하여 변경 요구사항을 신속히 반영

ii) 각 요구사항에 대해 명확한 정의와 우선순위를 지정하고 분석하여 요구사항 정의서를 작성

iii) 각 요구사항별로 명확한 검사 기준을 설정하고, 이 기준을 바탕으로 요구사항이 시스템에 반영되었는지 검증

(2) 결함 발생률 관리

i) 검증된 온라인 관리시스템을 도입하여 결함 또는 오류를 신속하게 처리하고 각 타임라인을 관리

ii) 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간지속 관리하고 결함률이 10% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우 즉시 보고.

(3) 결함 조치율 관리

i) 테스트 기간 동안 발견된 모든 결함 또는 오류에 대하여 조치계획을 수립하여 우선순위에 따라 처리.

ii) 수행사의 불가항력으로 인해 조치할 수 없는 사항은 수원기관에 승인 요청

iii) 결함 조치로 인한 일정 지연을 방지하기 위해 철저한 일정 관리를 수행하고 예비 일정과 인력을 확보하여 유연하게 대응

2) 위험 관리

(1) 과업 수행 중 발생할 수 있는 단계별 위험 요소 및 관련 사항들을 예측, 식별하고 이에 대한 대응 방안을 마련함으로써 단계별 위험 요소를 사전에 제거하거나 완화하여 위험으로 인한 영향을 최소화하여 본 프로젝트를 성공적으로 수행하도록 함

i) High 레벨의 위험상황은 사업의 수행에 중대한 영향을 미칠 수 있는 경우로, 발생 즉시 현 상황과 예상되는 결과를 중소기업진흥공단에 보고하고 대응책을 논의

ii) Medium 레벨의 위험상황이 발생하면 현재 상황에서 대응 가능한 선 조처하고 보고를 통해 이후 대응 방안 모색

iii) Low 레벨의 위험상황은 미리 마련된 대응 방안에 따라 조처를 하고 이후의 상황을 지켜보면서 유연성 있게 대응하며 필요 시 보고

01 위험 식별	• 주관기관과 함께 프로젝트에 부정적 영향 요소 조기 식별	위험보고서 (위험 내용)
02 위험 분석	• 식별된 위험의 영향력 분석 및 발생 가능성 평가 • 위험 관리 우선순위 판단	위험보고서 (위험 분석 결과)
03 대응 계획 수립	• 우선 순위에 의한 구체적 대응 전략 수립	위험보고서 (위험 조치 계획)
04 모니터링	• 위험 조치 현황 및 적절한 시정 조치 • 위험 관리 활동 보고	위험보고서 (위험 조치 결과)

(2) 단계별 위험 요소 및 대응 방안 정의

i) 예상되는 위험 요소들은 위험정도에 따라 적절한 대응이 가능하도록 단계별 위험 요소 대응 방안을 사전에 정의하고 위험정도를 사전에 분석하여 위험 요소에 대한 체계적인 관리를 통해 위험관리체계를 구성

〈위험 요소별 대응 방안〉

주요 활동	위험 요소	위험 정도	대응 방안
착수	• 현지 업무조율 미흡 및	H	• 사업 수행 전, 베트남 현지 네트워크를 통한 사전

〈위험 요소별 대응 방안〉

주요 활동	위험 요소	위험 정도	대응 방안
준비	행정지원 불충분		정보 수집 및 일정 조율을 위한 시간 단축
	• 대상기관/업무협조 기관 섭외 및 일정 수립	L	• 출국 전 사전 설문지 배포를 통한 이해도 제고
초청 연수	• 의사소통 문제	H	• 영어강의 수강 가능자로 초청연수 대상자 선정 • 베트남어 통역사 활용
	• 초청연수 대상자 선정 지연	M	• 국내 초청연수 일정에 대해 사전에 공유하고 교육 일정 및 대상자 협의
	• 국내 연수기관 및 공공기관의 섭외 및 연수 일정 수립	M	• 국내 연수기관(행정자치부, 관세청 등) 및 방문업체와 초청연수 실시 최소 한 달 전부터 긴밀한 협조체계 구축
	• 초청연수 프로그램 불성실 이행	L	• 베트남 정부 담당자를 통해 선정된 연수생들에게 초청연수 프로그램의 중요성 주지
서비스 기획/설계/ 개발/안정화	• 요구사항 정의 미흡	• H	• 주요 이해관계자와의 긴밀한 커뮤니케이션을 통해 요구사항 명확히 정의, 요구사항 변경 관리 프로세스 수립 및 적용
	• 프로젝트 일정 지연	• M	• 일정 관리 툴 사용 및 정기적인 일정 점검, 일정 지연 시 해결방안 모색 및 사전 대응 계획 수립
	• 시스템아키텍처 설계 오류	• H	• 경험 많은 시스템 아키텍트 참여, 설계 단계에서의 철저한 검토 및 외부전문가 검토
	• 사용자 인터페이스(UI) 설계 부족	• M	• 사용자 중심의 UI/UX 전문가 참여, 사용성 테스트를 통한 피드백 반영
	• 기술 스택 선택 오류	• M	• 최신 기술 동향 및 프로젝트 요구사항을 반영한 기술 스택 선정, 기술 전문가 자문
	• 코드 품질 저하	• M	• 코드 리뷰, 정기적인 코드 품질 점검 및 테스트, 자동화된 테스트 도구 사용
	• 기술적 문제 발생 (예: 시스템 충돌, 성능 문제)	• H	• 사전 기술 검토 및 프로토타입 개발, 문제 발생 시 긴급 대응팀 구성 및 대응 절차 마련
	• 테스트 부족	• H	• 충분한 시간과 자원을 투입한 통합 테스트, 사용자 수용 테스트(UAT) 수행
	• 버그 및 결함 발견	• M	• 버그 추적 시스템 운영 및 신속한 수정, 정기적인 패치 및 업데이트 계획 수립
	• 데이터 마이그레이션 문제	• M	• 데이터 마이그레이션 계획 수립 및 검증, 백업 및 복구 절차 마련
	• 시스템 보안 취약성	• H	• 정기적인 보안 점검 및 취약성 테스트, 보안 패치 및 업데이트 적용
현지 세미나	• 의사소통 문제	• H	• 베트남어 통역사 활용
	• 세미나 참석 대상자 선정 지연	• M	• 세미나 일정에 대해 사전에 공유하고 장소 및 일정, 대상자 협의
	• 세미나 프로그램 불성실 이행	• L	• 베트남 정부 담당자를 통해 세미나에 대한 홍보 진행
사업 추진	• 베트남 정부와의 커뮤니케이션	• H	• 기 확보된 관련부서의 의사소통 채널을 적극 활용
	• 사업 진행 지연	• H	• 베트남 정부와 사업에 대한 계획 및 일정을 지속적으로 협의
	• 현지 기업의 참여 유도	• M	• 미래모형설계 시 베트남 정부 및 수출기업들의 요구사항 반영 □

〈위험 요소별 대응 방안〉

주요 활동	위험 요소	위험 정도	대응 방안
	• 천재지변 및 질병으로 인한 지연	• M	• 천재지변 및 질병으로 인한 현지 파견 문제 발생 시 원격회의를 통한 업무 진행

3) 산출물 관리

(1) 계약일로부터 7일 이내에 세부계획, 추진일정표 등 구체적 수행계획이 담긴 착수보고서 1부를 제출함.

i) 중간결과 및 최종결과는 중소벤처기업진흥공단에 직접 보고함.

ii) 최종 성과물은 완료보고서 1부, 파일(hwp) 형태로 별도 제출(계약 당사자 간 합의에 따라 제출, 보고서의 양 조절 가능)

iii) 완료보고는 계약서, 과업지시서 등 과업 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고를 계약 종료일 전에 제출하여 승인을 득함.

iv) 완료보고서 제출 시 정산보고서를 함께 제출하며, 최종 성과물에 대하여 중소벤처기업진흥공단이 지정한 자가 중소벤처기업진흥공단 계약사무처리요령에 근거하여 검사를 실시함.

〈산출물 리스트〉

구분	단계 코드	단계	산출물 코드	산출물 내용
사업관리	B100	일반관리	B101	제안요청서
			B102	제안서
			B103	계약서
			B104	작업계획서
	B200	프로젝트 표준	B201	산출물목록
			B202	표준및절차매뉴얼
			B203	품질관리지침
			B204	개발표준정의서
			B205	개발프로세스정의서
	B300	품질관리	B301	품질보증계획서
			B302	품질보증활동내역서
			B303	과업대비표
			B304	요구사항 추적표
			B305	검수기준서
	B400	변경 관리	B401	변경관리계획서
			B402	변경요청서
			B403	변경승인서
			B404	변경수행결과서
	B500	형상관리	B501	형상관리계획서
			B502	형상관리수행서
	B600	표준화관리	B601	기술적용결과표
			B602	웹접근성 및 호환성
	B700	일정관리	B701	주간보고서
			B702	월간보고서
			B703	WBS

〈산출물 리스트〉

구분	단계 코드	단계	산출물 코드	산출물 내용
	B800	결과보고	B801	착수보고서
			B802	중간보고서
			B803	완료보고서
개발	D100	개발준비 Project Planing	D101	사업수행조직보고서
			D102	방법론 테일러링 결과서
			D103	개발준비 계획서(개발표준, 개발환경 등)
	D200	분석 Analysis	D201	인터뷰 계획서
			D202	요구사항정의서
			D203	요구사항 추적표
			D204	현행업무프로세스 정의서 (업무흐름도 포함)
			D205	목표업무프로세스 정의서 (업무흐름도 포함)
			D206	분석단계점검 결과서
	D300	설계 Design	D301	아키텍처 설계서
			D302	사용자인터페이스 설계서
			D303	인터페이스 설계서
			D304	사용자인터페이스 웹 구성도
			D305	표준데이터정의서
			D306	데이터베이스 설계서
			D307	단위테스트 계획서
			D308	통합테스트 계획서
			D309	시스템테스트계획서
			D310	사용자테스트계획서
			D311	설계단계점검 결과서
	D400	구현 Constriction	D401	프로그램 소스
			D402	단위테스트 결과서
			D403	웹접근성 및 호환성 결과서
			D404	소스품질 검사 보고서
			D405	보안약점 진단 결과서
			D406	구현단계 점검 결과서
			D407	통합테스트 결과서
			D408	시스템테스트 결과서
			D409	사용자테스트 결과서
	D500	전개 Implement	D501	전개 계획서(체크리스트)
			D503	전개 결과서
	D600	인도 TakeOver	D601	인수인계 계획서
			D602	운영자 및 기반운영 매뉴얼
			D603	사용자매뉴얼
			D604	산출물 현횡화 결과서
			D605	사용자교육보고서
센터 운영	M100	운영센터	M101	월 운영 보고서

〈산출물 리스트〉

구분	단계 코드	단계	산출물 코드	산출물 내용
	M200	IT 센터	M201	월 운영 보고서
역량강화	K100	세미나	K101	세미나 계획서
			K102	세미나 결과서
	K200	초청연수	K201	초청연수 계획서
			K202	초청연수 결과서
	K300	워크숍	K301	워크숍 계획서
			K302	워크숍 결과서
전문가 파견	T100	파견	T101	전문가 파견 계획서
			T102	전문가 파견 결과서

(2) 산출물 품질관리 방안

i) 단계별 보고서 검수 시행

→ 단계별 계획서 및 보고서 작성 시 기관 검토 진행 및 수정 요청사항이 있을 시, 해당 내용 반영 후 수정본 제출

ii) 최종보고서 최종안 제출 후 품질심사위원회의 품질심사 수검

→ 심사 및 적격 여부 판정 기준 및 방법은 기관 사업평가지침 및 매뉴얼에 따름

iii) 월 1회 정례회의 진행

→ 동 사업의 주관기관인 중소벤처기업진흥공단과 월 1회 정례회의를 개최하여 사업 진행 상황을 점검함

→ 전월 업무수행 실적, 당월 업무수행 계획, 주요 수집자료 및 초기 분석 결과 등을 공유하고, 사업추진 방향을 점검함

iv) 자문위원회 자체 점검

→ 산출물 평가 관련하여 전문적인 자문을 제공할 수 있는 자문위원을 구성하여 자체 점검을 수행토록 함

5 보안관리

1) 보안관리 개요

(1) 온라인 수출플랫폼을 통한 민감 정보(기업 정보, 거래 정보, 사용자 데이터)를 취급하게 되는 만큼 프로젝트 수행과정에서 취득 가능한 정보의 유출방지 및 안전하고 지속 가능한 플랫폼 운영을 위한 보안 운영체계 구축

(2) 제안사는 사업을 수행함에 있어 정보보호 정책 수립, 접근 권한 관리, 보안 교육, 기술적 보안, 출입 통제, 재해복구 체계를 수립하여 운영

2) 일반적 보안 관리

(1) 보안 관리 계획 수립

i) 인적 보안 관리: 사업참여 인력에 대한 철저한 신원 확인 및 보안 교육 시행

ii) 문서 보안 관리: 문서 분류체계, 접근 권한, 보관 및 폐기 절차 수립

iii) 장비 보안 관리: 개발 장비 및 서버에 대한 물리적/논리적 접근 통제 적용

(2) 보안관리 책임자 임명

i) 프로젝트 관련 모든 문서와 자료의 접수 및 반납 관리

ii) 작업자 보안상태 정기 점검 및 보안 취약점 식별/조치

iii) 비밀 취급 서약서 징구 및 주기적 보안 교육 시행
iv) 발주처 및 수원기관의 승인 없이 프로젝트 관련 정보의 외부 유출방지

(3) 접근 통제 및 정보보호 관리

i) 최소 권한 원칙에 따른 접근 권한 부여
ii) 접근 이력 모니터링 및 정기적 검토
iii) 퇴근 시 계정 잠금 및 중요 정보 보관 철저

3) 관리적 보안 관리

(1) 정보보안 정책

실행 항목	설명
정보보호 관리체계 수립	ISMS 기준을 준용하여 정보보호 관리체계 구성. 정보보호 조직, 역할, 책임을 정의하고, 정기적인 관리체계를 문서화
보안 정책 문서화 및 배포	접근 제어, 암호화, 네트워크 보안, 물리적 보안 등 주요 항목에 대해 세부 정책 수립 및 사내 인트라넷/메일을 통해 배포
보안 정책 준수 모니터링	시스템 로그, 감사 로그, 관리자 행동 로그를 기반으로 정책 위반 여부를 점검. 위반 시 경고 및 권한 회수 등 단계별 조치 진행

(2) 접근 권한 관리

실행 항목	설명
역할 기반 접근제어(RBAC)	개발자, 관리자, 운영자 등 사용자 역할에 따라 시스템 접근 권한을 최소화하여 할당. 각 역할에 필요한 자원만 접근 허용
정기 권한 검토 및 회수 프로세스 운영	매 분기 단위로 전체 권한 현황 검토 후 미사용 계정은 회수. 퇴직자, 휴직자 계정은 비활성화되도록 관리

(3) 교육

실행 항목	설명
개발자 대상 교육	시큐어코딩 원칙을 교육. 실습 중심으로 SQL Injection, XSS, CSRF 등의 방지 방법 지도
사업참여 인력 공통	보안사고 사례(랜섬웨어, 내부자 유출 등) 공유

4) 물리적 보안 관리

(1) 작업 환경 보안

i) 작업장소 보안: 작업장소에는 물리적 접근 통제를 위한 출입 통제 시스템을 설치하고, 출입 이력을 기록·관리하며, 작업공간 내 CCTV 감시 체계를 구축하여 24시간 모니터링을 실시
ii) 개발환경 보안: 시스템 개발 및 구축 기능을 테스트하기 위한 별도의 개발환경을 구성

(2) 출입/문서 보안

구분	통제항목	대응 방안
출입보안	출입 통제	• 사무실/장비실 출입보안 방안 • 방문자 관리 절차 • 출입기록 유지 및 검토
문서보관	데이터보안 및 정보자산 분류	• 시건장치 보유 보관함 비치 • 문서 보안등급별 보관 • 보관 현황 정기 점검
문서폐기	데이터 처리 및 파기	• 안전한 폐기방법 적용 • 폐기 이력 관리 • 폐기 확인 절차 수립

(3) 산출물 관리

구분	통제항목	대응 방안

파일 관리	데이터보안 및 정보자산 분류	• 시건장치 보유 보관함 비치 • 문서 보안등급별 보관 • 보관 현황 정기 점검
보안등급 관리	데이터 처리 및 파기	• 안전한 폐기방법 적용 • 폐기 이력 관리 • 폐기 확인 절차 수립

(4) 개발 보안 취약점 점검 및 조치 절차

i) 주요 취약점 별 점검 및 조치 방안

취약점 유형	점검방법	조치 방안
인젝션 취약점	• SQL 인젝션 테스트 • 명령어 인젝션 테스트	• 매개변수화된 쿼리 사용 • 입력값 검증
크로스사이트스크립팅	• DOM 기반 XSS 테스트	• 입력값 필터링
미감정보 노출	• 암호화 적용 확인 • 전송구간 보안 점검 • 에러 메시지 점검	• 민감정보 암호화 (AES256) • HTTPS, TLS 적용 • 에러 처리 개선

ii) 개발 취약점 조치 절차

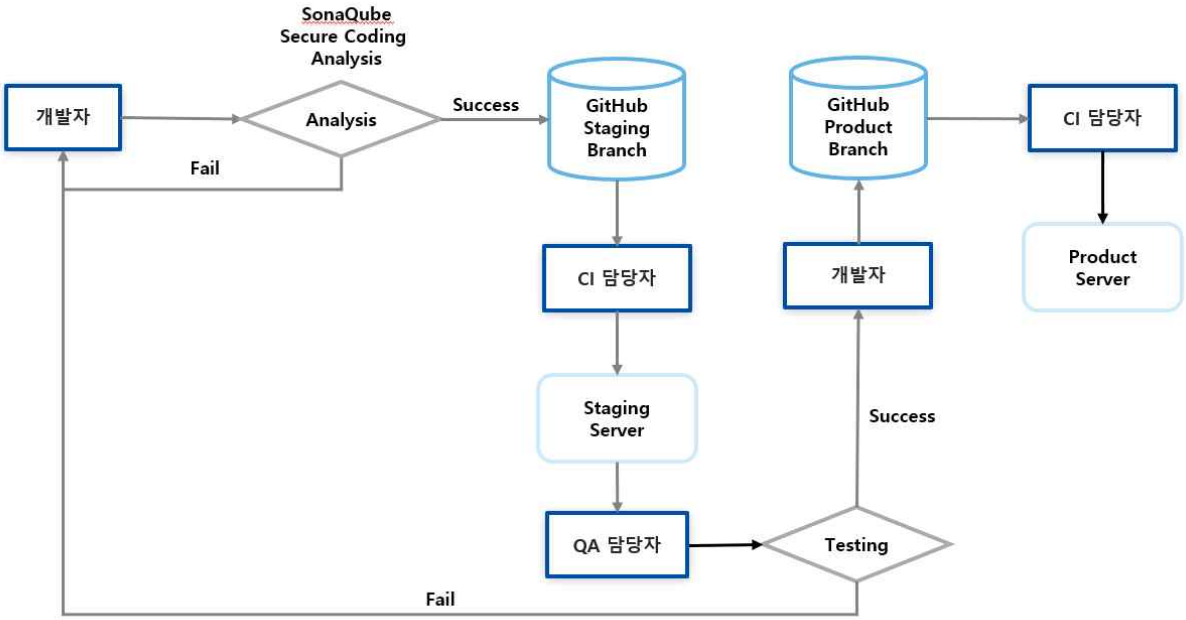

(5) 보안 조직 구성

역할	주요 책임	인원 구성
보안관리 책임자	• 보안 총괄 관리 • 정책/지침 수립 • 보안 승인 권한	• PM 겸임
개발 보안 담당자	• 시큐어코딩 적용 • 소스 보안 검토 • 보안 기능 구현	• 개발 리더 1명 • 품질 담당 1명
물리/관리 보안 담당자	• 문서/매체 보안 • 인적 보안 관리	• 관리 담당 1명 • 사무 지원 1명

	• 물리적 보안 통제	

(6) 보안 활동 일정

i) 종합적인 보안 관리 계획을 수립하고, 프로젝트 전반에 걸친 위험 요소를 식별하여 평가

ii) 직무별 맞춤형 교육 콘텐츠를 개발하고, 교육 효과성을 주기적으로 평가

iii) 보안 정책이나 환경 변화 시 특별 교육을 수시로 하여 최신 보안 동향에 대응

iv) 인력, 문서, 장비에 대한 기본적인 보안 점검은 주 1회 실시하여 일상적인 보안 관리를 강화

v) 보안 감사는 프로젝트 종료 전에 실시, 보안 정책 및 절차의 준수 여부를 종합적으로 점검하고, 개선사항을 도출

6 품질관리

1) 품질관리 개요

(1) 품질관리 목표

i) 베트남 온라인 수출플랫폼의 안정성과 신뢰성 확보를 통한 이용자 만족도 극대화

ii) 지속 가능한 서비스 운영을 위한 체계적인 품질관리 체계 구축

iii) 국내기업과 베트남 현지기업 간 원활한 비즈니스 연결을 위한 높은 품질의 서비스 제공

(2) 품질관리 전략

i) 상호 연계되어 순환적으로 운영됨으로써 지속적인 품질 개선 보장

(3) 품질관리 조직

역할	주요 책임	인원 구성
품질관리 책임자	• 프로젝트 전체 품질 활동 감독	• PM 겸임
품질보증 담당	• 품질 표준 및 프로세스 수립 • 품질보증 활동 수행	• 품질 담당 1명

역할	주요 책임	인원 구성
물리/관리 보안 담당자	• 테스트 계획 수립 및 실행 • 결함 보고 및 수행 관리	• 테스트 담당 1명

2) 시스템 신뢰성

(1) 구축 시스템의 신뢰성 확보

i) 제안서, 과업수행계획서, 과업내용서 및 사용자 요구사항 분석/설계서에서 제공하기로 한 모든 요구사항을 충실히 구현하여 베트남 온라인 수출플랫폼의 신뢰성을 확보

(2) 결함 관리체계

i) 시범 운영기간 동안 발견된 결함은 결함 관리 도구(JIRA)를 활용하여 체계적으로 기록하고 관리

ii) 결함 우선순위에 따른 대응 시간을 명확히 하여 신속한 해결을 보장

〈우선순위별 대응 시간〉

우선순위	대응 시간
심각(Critical) 결함	4시간 이내 대응 및 24시간 이내 해결
높음(High) 결함	8시간 이내 대응 및 48시간 이내 해결
중간(Medium) 결함	24시간 이내 대응 및 72시간 이내 해결
낮음(Low) 결함	48시간 이내 대응 및 1주일 이내 해결

(3) 비상대책 수립

i) 결함의 지속시간이 장시간 길어지는 경우를 대비한 비상대책을 사전에 수립: 단계별 에스컬레이션 프로세스 구축, 핫픽스(Hot-fix) 배포 체계 구축, 긴급 복구 계획(Disaster Recovery Plan) 마련

ii) 발생한 모든 결함은 시스템 오픈 이전에 철저히 조치하여 안정적인 서비스를 제공

3) 사용자인터페이스 제공

(1) 직관적 인터페이스 설계

i) 자주 찾는 컨텐츠를 사용 빈도 및 중요도에 따라 우선 배치하여 정보 접근성을 향상

(2) 기능 이해도 향상

i) 모든 기능에 대한 상세설명을 사용자 매뉴얼에 포함여 제공

ii) 핵심 기능에 대한 단계별 가이드(Step-by-step Guide)를 제공

(3) 인터페이스 이해도 향상

i) 인터페이스 요소를 직관적이고 일관성 있게 설계하여 초보 사용자도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 설계

ii) 아이콘, 버튼, 레이블 등의 UI 요소를 문화적 맥락에 맞게 설계

(4) 사용자 중심 설계

i) 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾을 수 있는 검색 및 네비게이션 체계를 구축

ii) 컨텐츠의 모양과 배치를 사용자 경험(UX) 원칙에 맞게 구성

4) 변경 관리

(1) 변경 관리 절차

단계	주요 활동	세부내용
준비/계획	기준 수립	• 요구사항 정의 및 베이스라인 설정 • 변경 요청에 대한 평가 기준 및 승인 체계 수립

단계	주요 활동	세부내용
		• 변경 범주별 처리 절차 정의
	인프라 구축	• 요구사항 및 변경 관리 도구 (JIRA) 구축 • 변경 관리 문서 템플릿 및 양식 정의 • 변경 이력 및 추적 시스템 설정
개발	스프린트 내 변경 처리	• 스프린트 계획 회의에서 변경 요청 검토 • 스프린트 백로그 변경사항 반영 • 일일 스크럼 미팅을 통한 변경 진행 상황 모니터링
	스프린트 간 변경 처리	• 제품 백로그 회의에서 변경 요청 분석 • 변경 영향도 평가 및 후속 스프린트 계획 조정 • 우선순위 높은 변경사항의 조기 스프린트 반영
	변경 검증 및 피드백	• 스프린트 리뷰 시 이해관계자에게 변경사항 시연 • 사용자 피드백 수집 및 추가 변경 요청 식별 • 스프린트 회고를 통한 변경 관리 프로세스 개선
이행/안정화	변경 통합 및 검증	• 전체 시스템 관점에서 변경사항 통합 검증 • 통합/회귀 테스트를 통한 변경 안정성 확인 • 변경사항 문서화 및 최종 베이스라인 업데이트
	변경 승인 및 이행 관리	• 변경 이행 결과보고 및 공식 승인 획득 • 사용자 문서 및 교육자료 업데이트 • 최종 변경사항 이행

4) 시스템 하자 및 유지보수

(1) 하자보수 조직 구성

역할	주요 책임	인원 구성
하자보수 총괄	• 하자 보수 업무의 총괄 관리	• 하자보수 PM
기술 지원	• 하자 보수 기술 지원	• 개발 1명
품질관리	• 하자 보수 검수 및 테스트 지원	• 품질 담당 1명

(2) 하자보수 지원 시간

〈하자보수 지원 시간〉

구분	대응 시간
기본 지원	근무시간 (평일 9시 ~ 18시)
비상 지원	수원기관의 요구가 있을 경우 근무시간 및 야간시간/휴일에도 지원

(3) 하자보수 절차 및 체계

장애 접수 › 장애 분석 › 해결책 수립 › 조치 이행 › 결과 보고 › 사후 관리

나. 보고 및 검토 계획

1 보고/검토 체계 구성

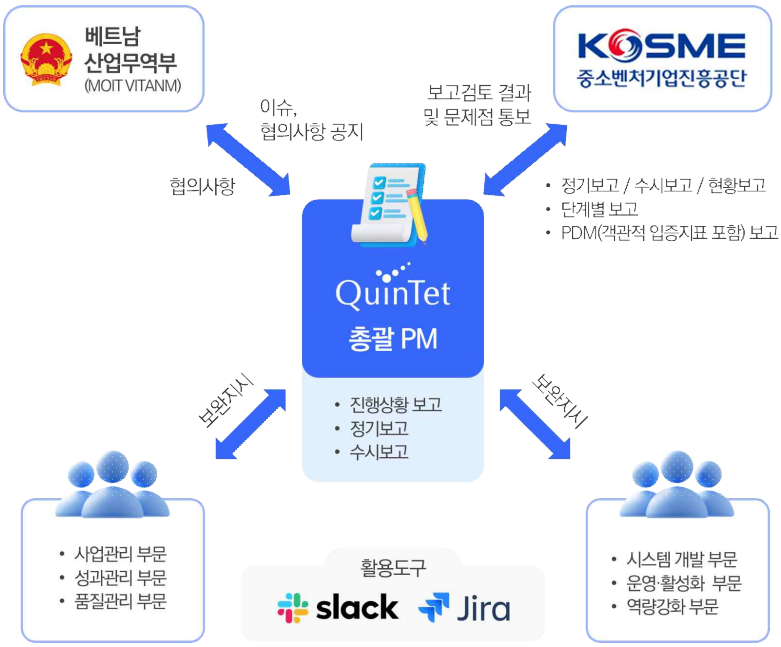

(1) 요구사항에 대한 반영과 품질을 점검하기 위하여 모든 업무단계에서 이루어지는 각종 보고 및 회의에 대한 절차를 명시하는 의사 소통관리를 통해 품질관리를 도모

(2) 사업을 성공적으로 수행하기 위하여 업무보고, 검토회의 등을 통해 유용한 정보를 적시에 교류하고, 수행과정에서 발생하는 각종 의사결정사항 및 문제점을 조기에 파악하여 신속히 대처할 수 있도록 구성

구분	내용
이해관계자 식별	·보고/검토 조직 및 역할 도출 ·조직도 ·책임역할 구성도
보고 및 검토활동 수행/모니터링	·보고/검토 활동 진행 및 지속적 모니터링 ·실적보고서 (주간/월간) ·검토보고서
보고 및 검토계획 수립	·정기보고/수시보고 검토계획 수립 ·프로젝트 계획서 (보고/검토계획)
보고 및 검토결과 정리	·보고/검토 결과에 따른 후속조치 ·시정조치결과, 고객승인 실행항목, 위험보고서 ·변경사항에 대한 이력관리

2 정기 보고

1) 주간, 월간 등의 사전에 정해진 일정에 따라 주기적으로 작성하여 일정에 따른 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 제출기한 내에 제출

구분		목적	보고내용	보고간격
정기 보고	착수보고	·프로젝트의 목표, 범위, 일정 등을 이해관계자들과 공유	·프로젝트 개요 및 추진 범위 ·프로젝트 추진 조직 및 일정 ·주요 사업추진 내용	·프로젝트 시작시 한번
	주간보고	·주간 업무진척 상황 공유 및 통제	·주간 주요 활동실적 및 계획 ·특이사항 및 국기원과의 협의사항 ·주간 위험/문제/장애 등 현황	·매주 작성 ·PM이 검토 확인 후 매주 보고
	월간보고	·월간 업무진척 상황 공유 및 통제	·당월 업무 추진/개선현황 ·익월 계획 현황 ·투입인력/시스템/장애현황 ·업무 추진 총괄 의견 ·특이 및 파트 별 주요 이슈	·매월 마지막 주 월간 현황을 작성, PM은 이를 취합하여 전체 보고서 작성 ·매월 마지막 주 PM이 보고 ※일정은 주관기관과 상의 후 최종 결정

3 수시보고

(1) 예기치 않은 문제, 긴급 상황, 특정 요청 등의 이슈 또는 상황이 발생했을 때 필요에 따라 작성하고 제출하여 이슈에 대한 신속 대응 체계 마련

구분	목적	보고내용	보고간격
비정기 보고 (일일 및 수시)	·긴급 발생한 문제에 대한 주관사 이해와 해결을 위해 진행	·주요 문제점 및 해결 대안 ·주관사대한 협조 요구사항 ·주관사요구에 대한 답변	·수행팀원은 PM에게 구두 및 서면으로 수시보고 ·PM은 고객의 요청에 따라 구두 및 서면으로 수시보고

가. 협업방안

1 장비업체 협업 개요

1) 장비(서버, 네트워크 등) 분리발주 구조로 플랫폼 성능 요건, 보안, 품질 전 과정에서 장비업체의 기술 지원과 협력이 필요

(1) 대응 전략

i) 사전 협업체계 수립: 공동 기술회의체 구성 및 역할 분장표 작성

ii) 설치 연계 일정 관리: 플랫폼 개발 일정과 장비 납품·설치 일정 간 조율 필요 시 사전 가상환경 또는 클라우드 환경으로 개발 선행

iii) 성능 시험 공동 대응: 업체와 협력하여 성능시험 전 환경 점검 및 리소스 기준 사전 확인 CPU, Memory, Disk I/O 등 측정 항목별 기준 공유 및 점검

iv) 보안/네트워크 연계 검토: 방화벽, DMZ, 백업 서버, 접속 정책 등 보안·망 구성요소를 공동 설계 장비 구성도 및 시스템 연계도 사전 검증

v) 운영 중 장애 대응 체계 마련: 서버 장애, 스토리지 이슈 발생 시 긴급 대응 체계 공동운영

vi) 문서 및 리포트 협력 제출: 구축 완료 후 장비 사양서, 성능측정 보고서, 보안검수 대응자료 등 협조 요청 가능, 정기회의 및 이행 점검 체크리스트 공유

감사합니다.

KOSME
중소벤처기업진흥공단
